



Informe mensual Avance de Obra

Enero 2023



CDG[®]
Desarrollos




Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

Enero 2023

Avances de Obra.

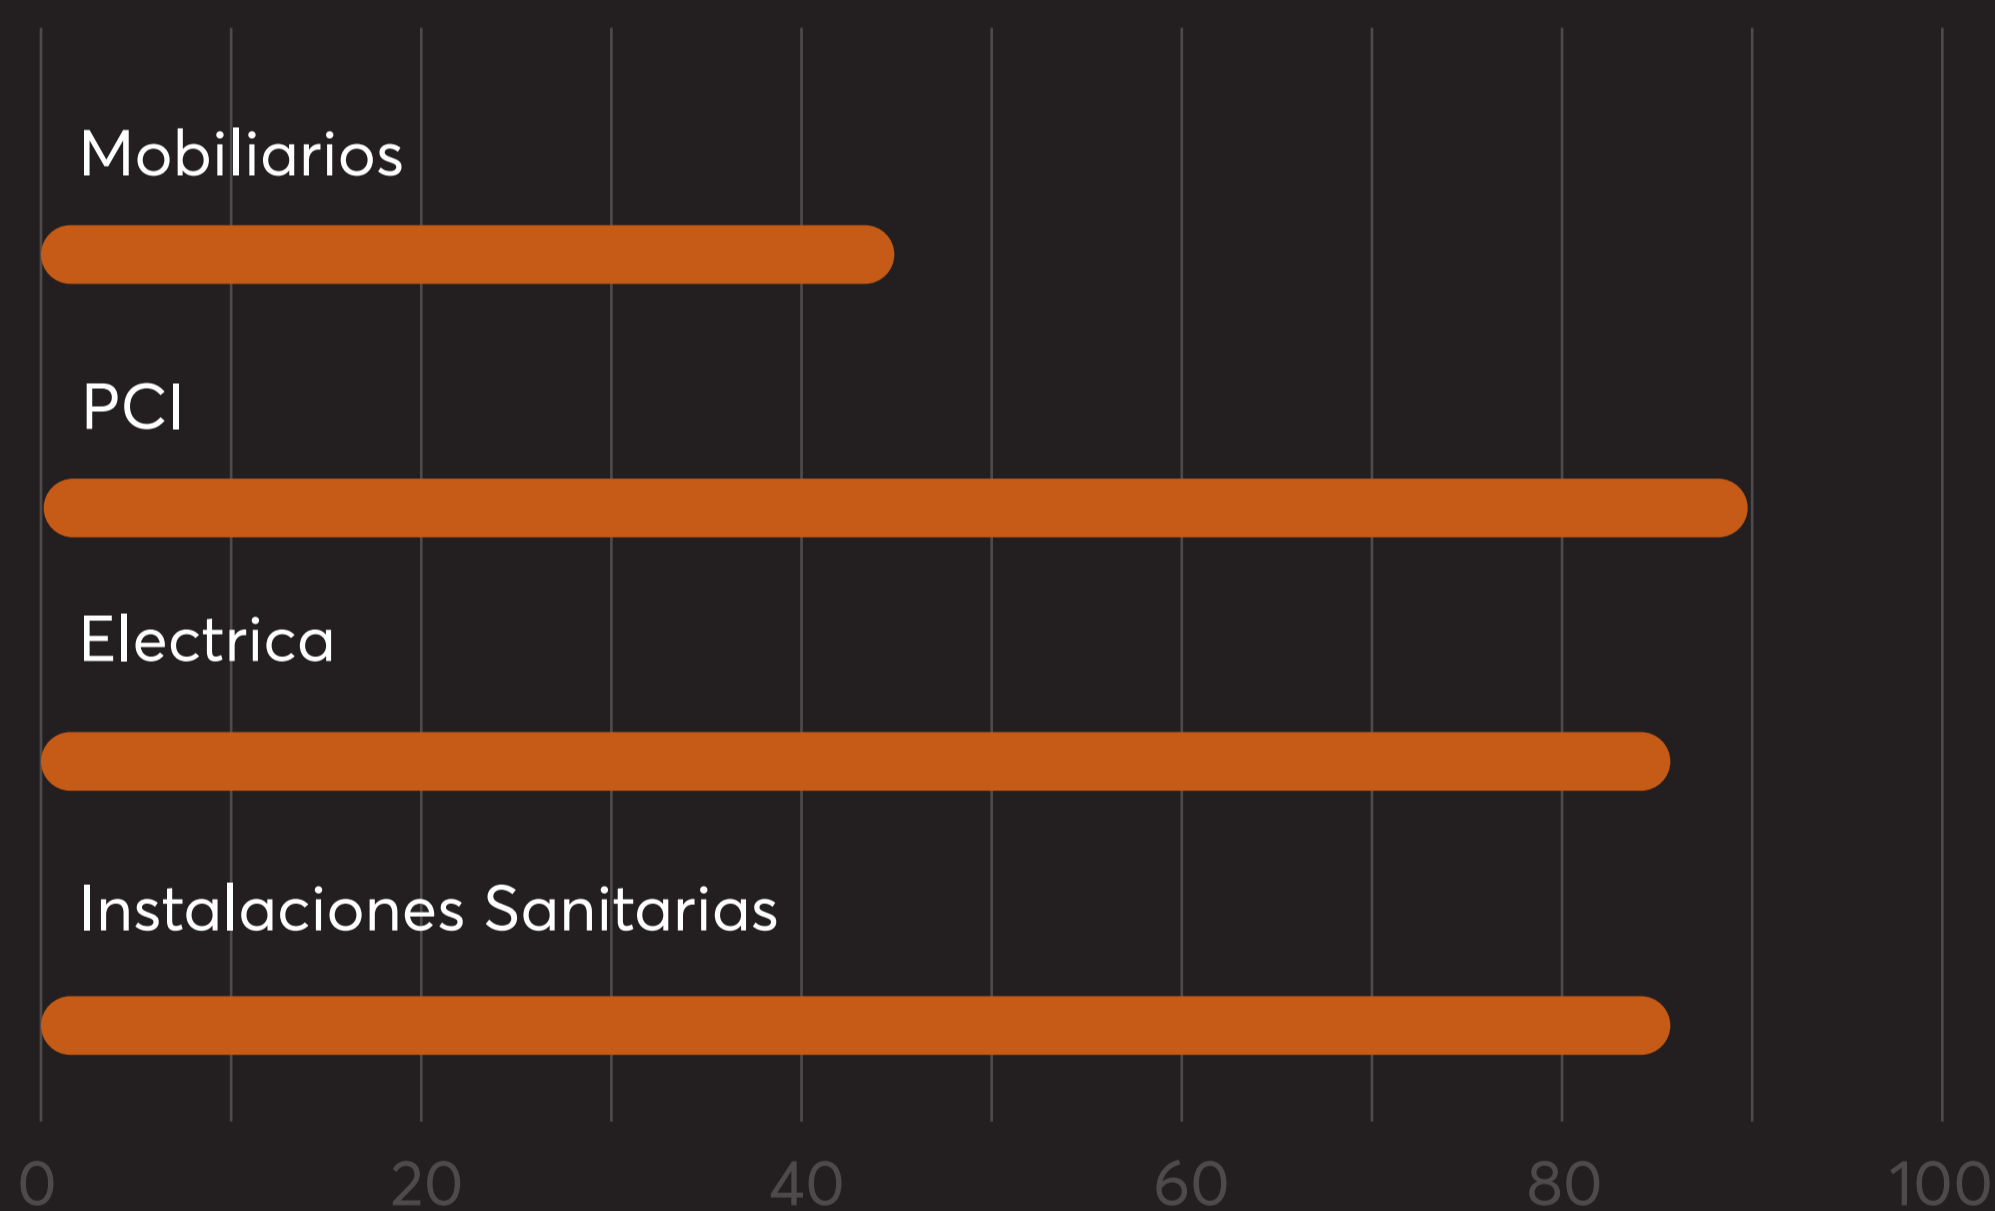

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Enero 2023 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Enero 2023

Trabajos Realizados

Aberturas

Ventanas se encuentran colocadas terminadas hasta el nivel 5 y en proceso de trabajo en el nivel 5/6 en un 70%
Puertas internas hasta el nivel 3 al 100% , nivel 4 en 75%

Albañileria

Trabajos de colocacion de piso nivel 5 y mochetas en espera para colocacion de puertas , nivel 6/7
contrapiso terminado y revoque.

Próximos Trabajos

Mobiliario

El nivel 4 en 80% terminado muebles cocina completo con mesadas y griferias y placares , nivel 2 con un 95% y el nivel 3 con un 95%.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Enero 2023




Finales de Diciembre

En SS se empezó el trabajos de carpeta y trabajos de bauleras.
Avance de trabajos de fachada principal en un 88%.
Fachadas laterales pintura en 80% lindero izquierdo.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Enero 2023

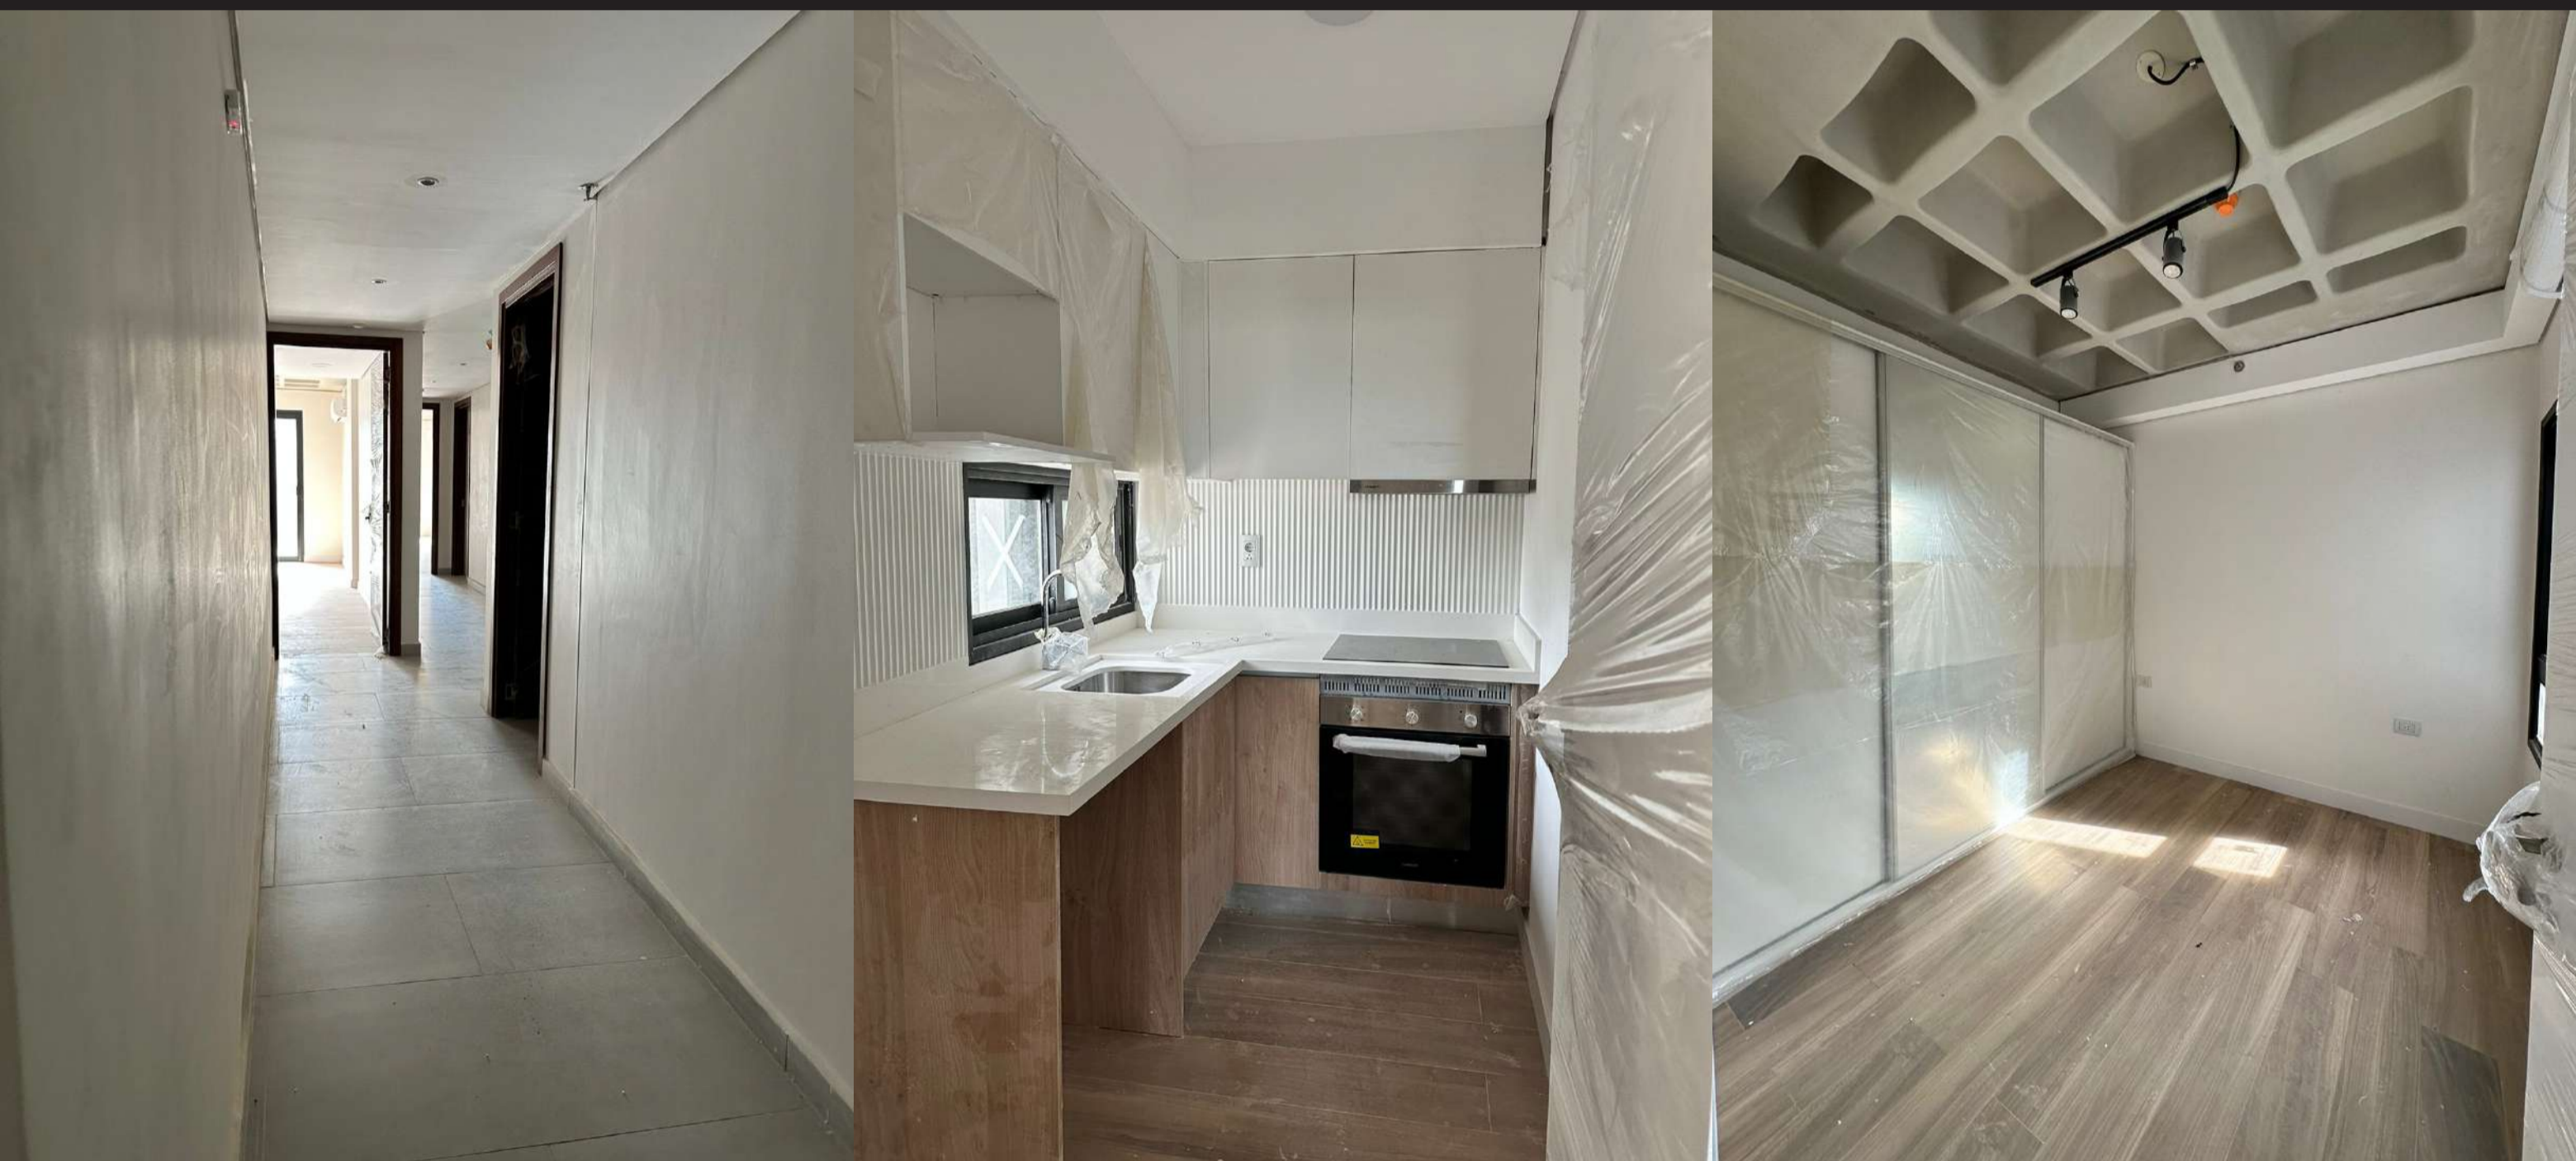

Comienzo de Enero

Nivel 1 en un 95% se montaron muebles de cocina y placares.
Nivel 2/3 en un 90% aberturas colocadas y con montaje de muebles de cocina y placares

Avance de Obra We® Villa Morra.

Enero 2023



Mediados de Enero

Nivel 4 en un 30% de terminaciones finales
Nivel 5 en un 90% (instalaciones y revoque avanzado)
Nivel 6/7 en un 80% (instalaciones avanzado)
Nivel 8 80% (instalaciones y revoque avanzado) azotea en trabajos de instalacion de piscina.



CDG[®]
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

GÓMEZ
ABENTE
CONSTRUCCIONES
