



Informe mensual Avance de Obra

Febrero 2023



CDG[®]
Desarrollos




Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Febrero 2023

Avances de Obra.

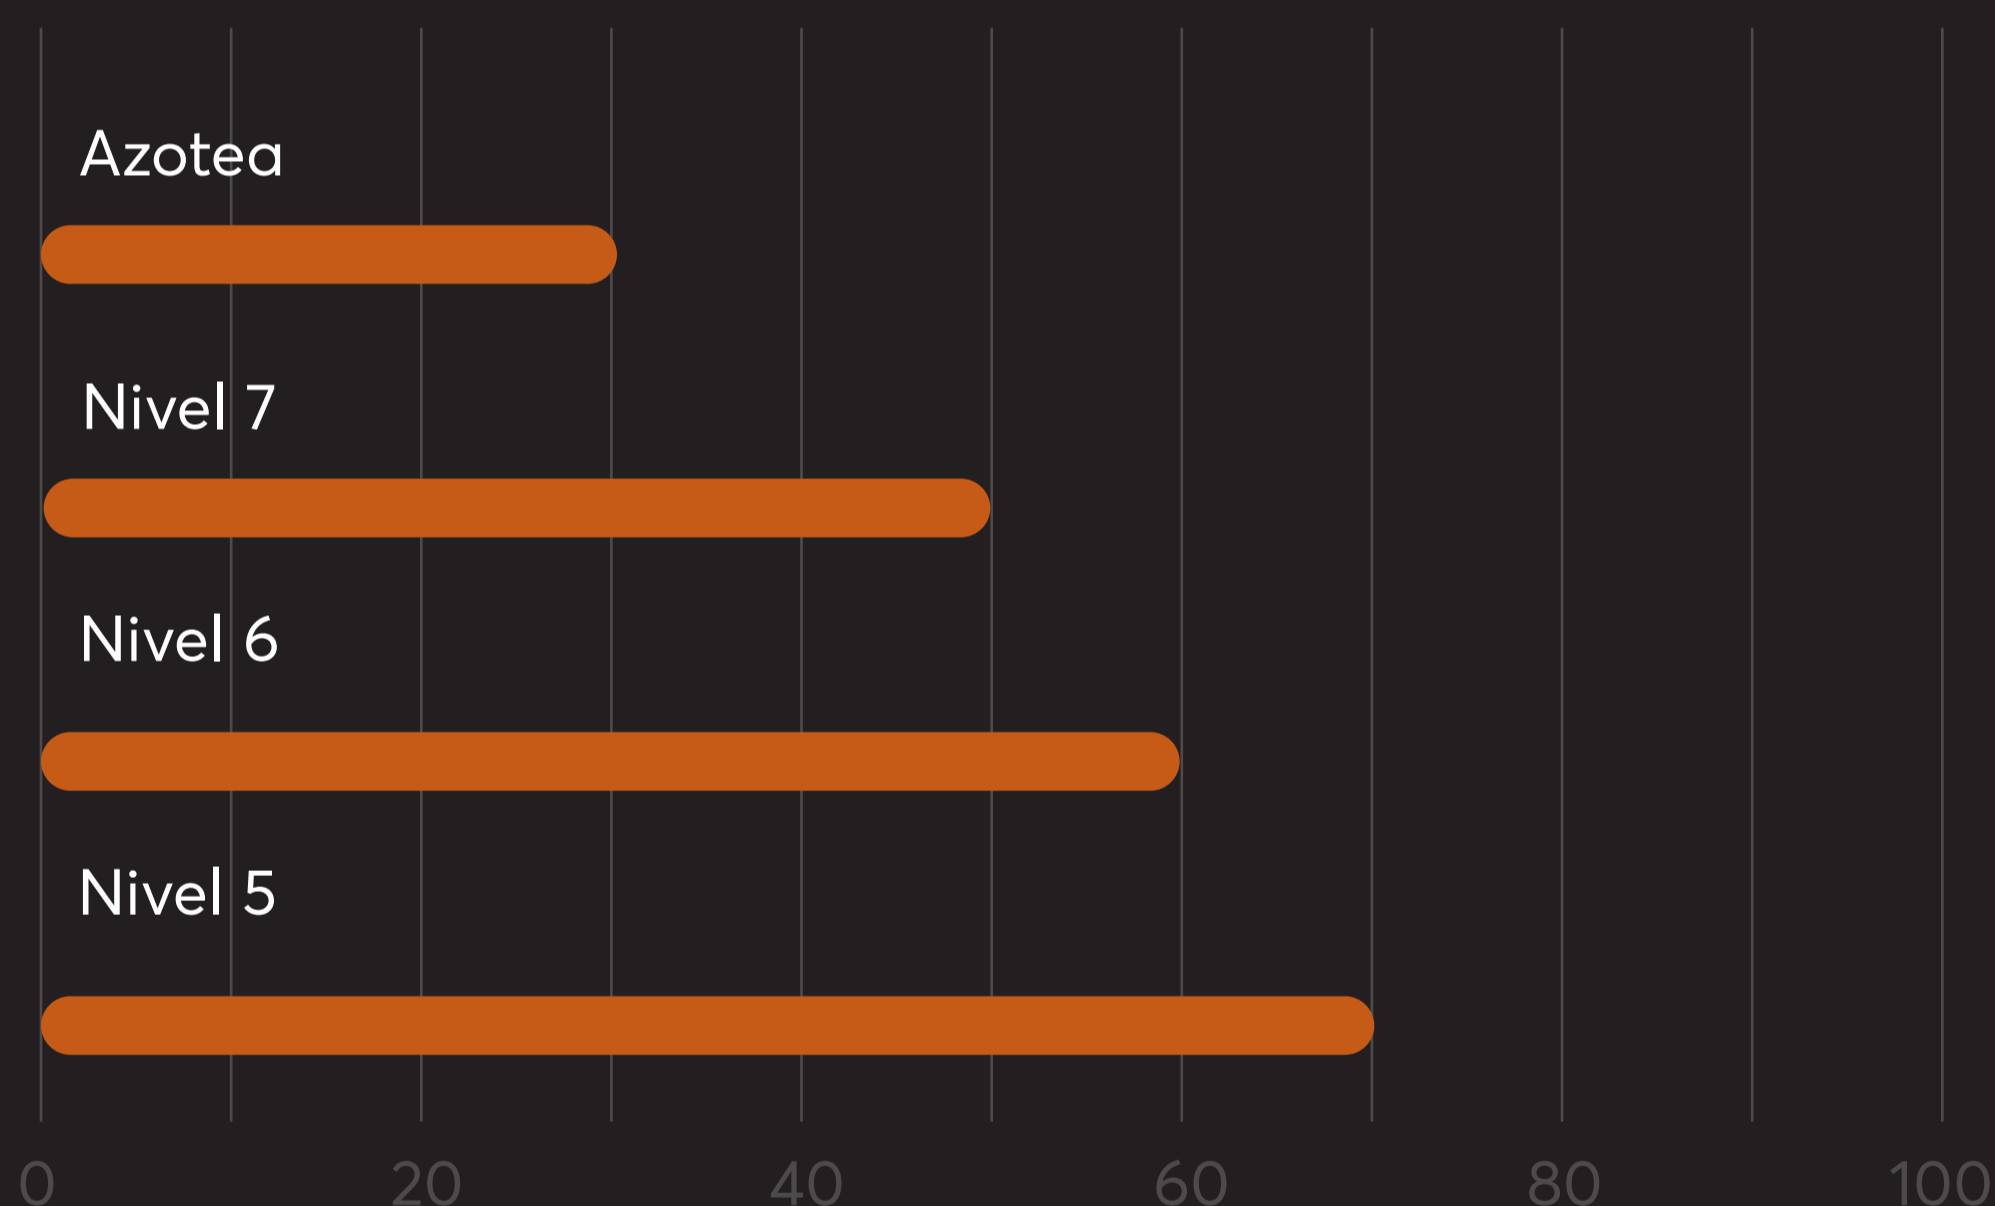

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Febrero 2023 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Febrero 2023

Trabajos Realizados

Aberturas

Ventanas se encuentran colocadas terminadas hasta el nivel 6 y nivel 7 en 50%.

Puertas internas hasta el nivel 5 90% y nivel 6 10%

Albañileria

Trabajos de exterior en proceso vereda y prueba de aislacion de piscina , instalacion de Puesto de distribucion electrica para prueba final de Instalaciones electricas y Agua corriente.

Próximos Trabajos

Mobiliario

El nivel 5 culminados muebles cocina completo con mesadas y griferias y placares , nivel 6 en proceso en un 70%

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Febrero 2023



Finales de Enero

En SS se termino la carpeta de piso y las bauleras este mes se instala la herreria de cierre.

Avance de trabajos de fachada principal en un 90%.

Trabajos de vereda y colocacion de cordon de vereda en proceso.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Febrero 2023



**Comienzo
de Febrero**

Nivel 1 en un 100% en espera de PD para pruebas finales .
Nivel 2/3 en un 100% en espera de PD para pruebas finales.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Febrero 2023



Mediados de Febrero

Nivel 4 en un 95% de terminaciones finales
Nivel 5 en un 70% de terminaciones finales
Nivel 6 en un 60% de terminaciones finales
Nivel 7 en un 50% de terminaciones finales
Nivel 8 90% (instalaciones) azotea en trabajos de aislacion de piscina y prueba final.



CDG[®]
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

