




# Informe mensual Avance de Obra




CDG<sup>®</sup>  
Desarrollos

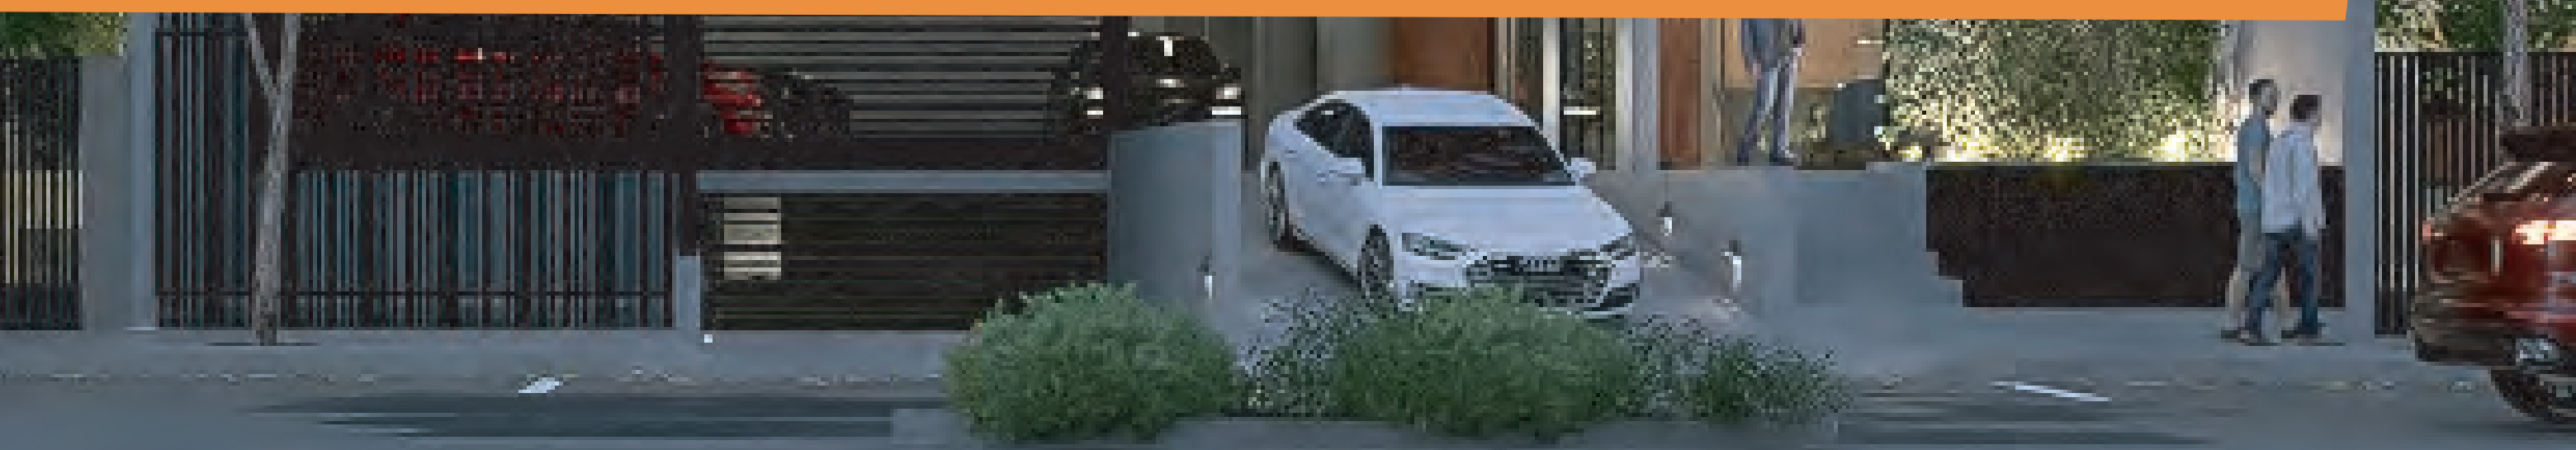

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Recoleta.

Marzo 2024

## Avances de Obra.

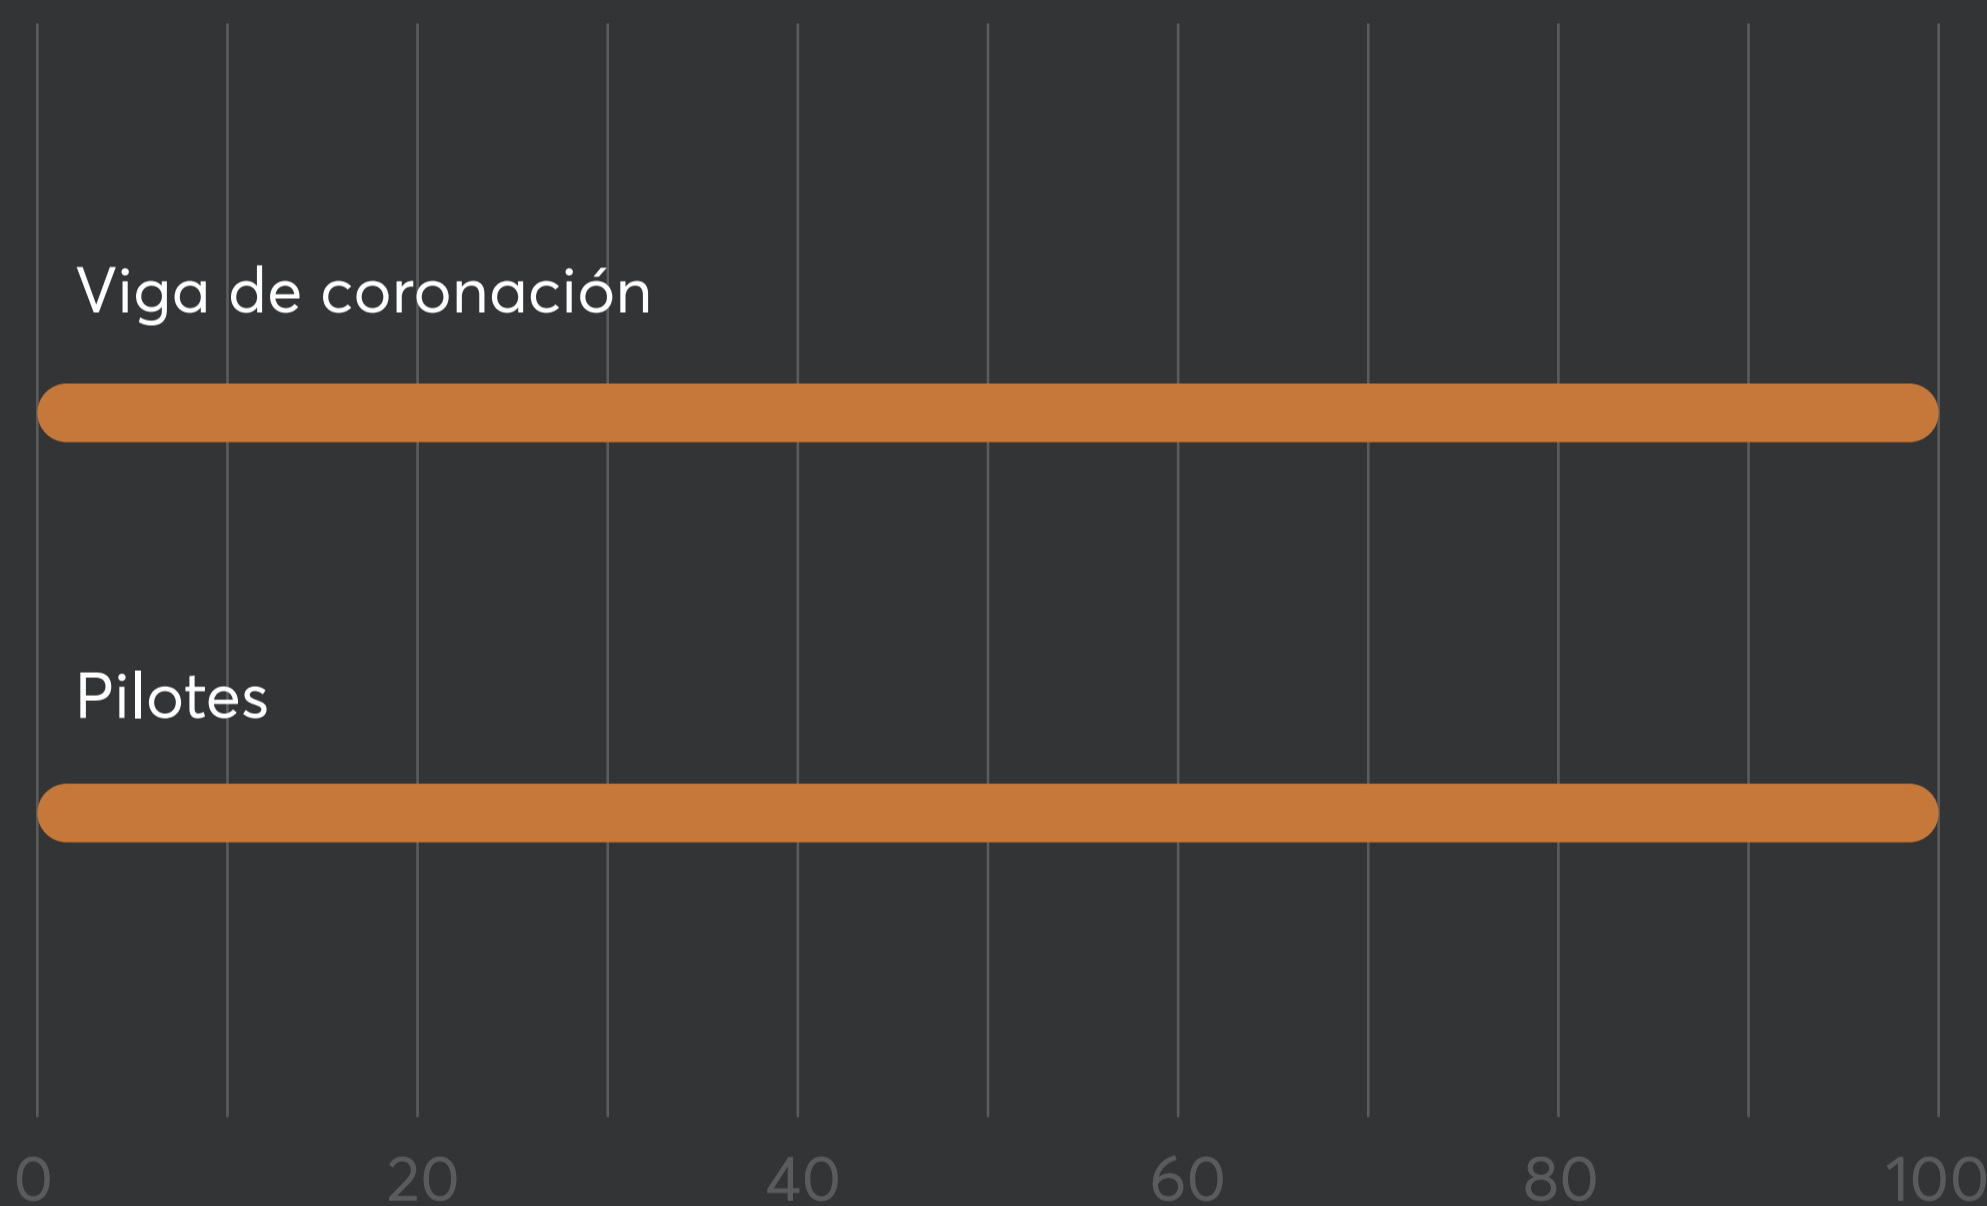

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Marzo 2024 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera entre Alberto Souza y Dr. Eduardo Lopez Moreira de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

# Avance de Obra

## We<sup>®</sup> Recoleta.

Marzo 2024

### Trabajos Realizados

---

Limpieza

Estos meses se trabajo en la limpieza y destronque de algunas vegetaciones dentro del terreno.

---

Contención

Terminacion al 100%, ejecutandose con normalidad el muro de pilotes .

### Próximos Trabajos


---

Fundaciones

Trabajos de movimiento de suelo para la ejecucion de las zapatas.

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Recoleta.

Marzo 2024

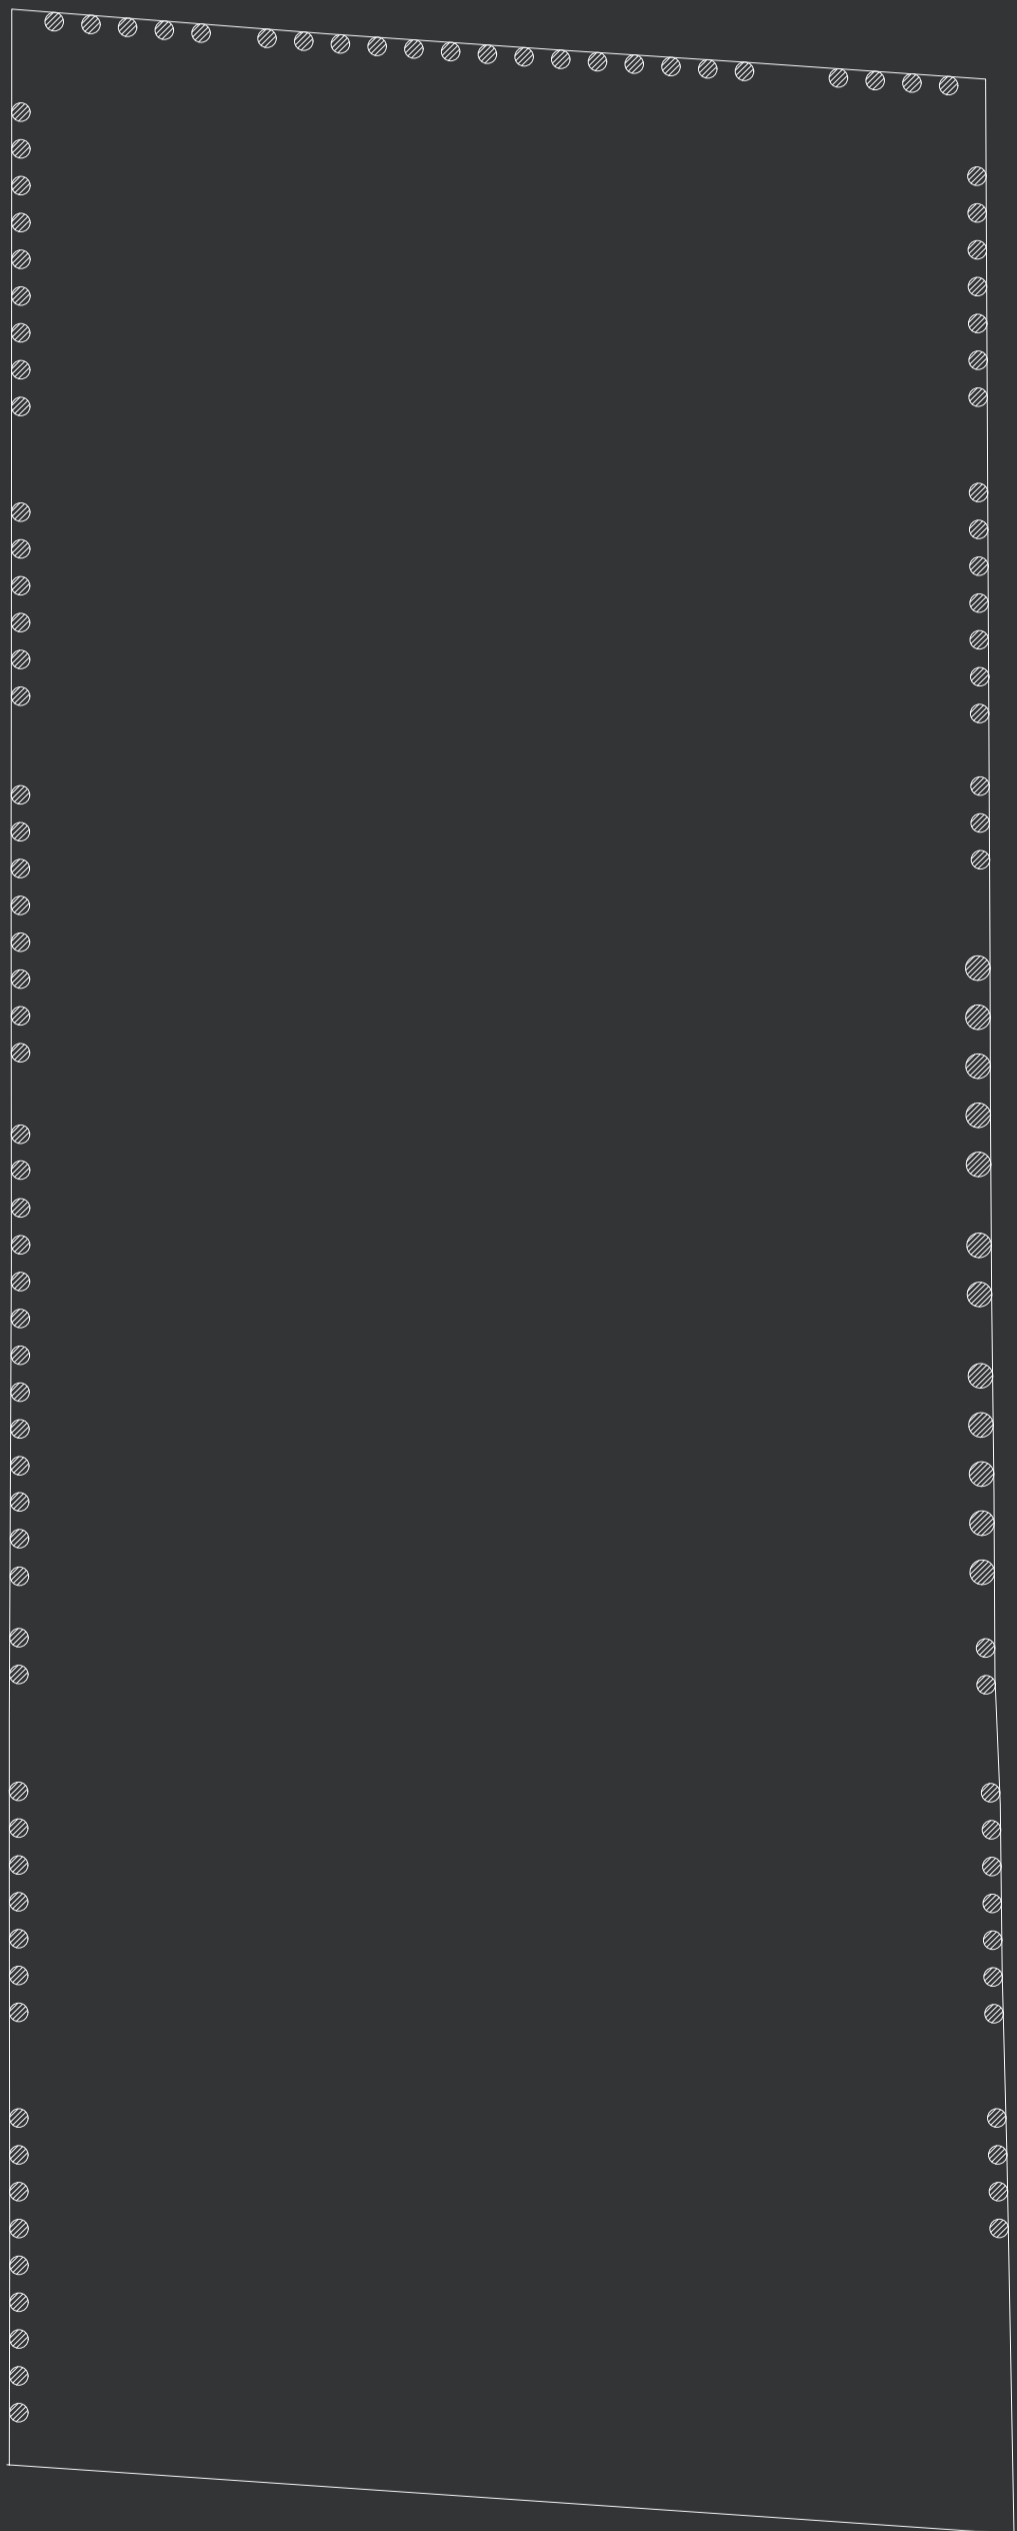

## Trabajos Realizados

Planta de pilotes  
100% en ejecución y vigas de coronacion.

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Recoleta.

Marzo 2024



## Primeras Semanas

Preparación de terreno, obradores, materiales y proceso de amaduras para pilotes. Montaje para palada inicial de obra.

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Recoleta.

Marzo 2024



## Primeras Semanas

Proceso de perforación del suelo colocación de armaduras y cargado de los pilotes y vigas de coronación para contener suelo para excavación de medio sub suelo.



CDG<sup>®</sup>  
Desarrollos

Contacto —

**(+595) 985 670707**

Aliados

-



ESCRIBANÍA  
TROCHE

GÓMEZ  
ABENTE  
CONSTRUCCIONES
