




Informe mensual Avance de Obra

-
Agosto 2024




CDG[®]
Desarrollos

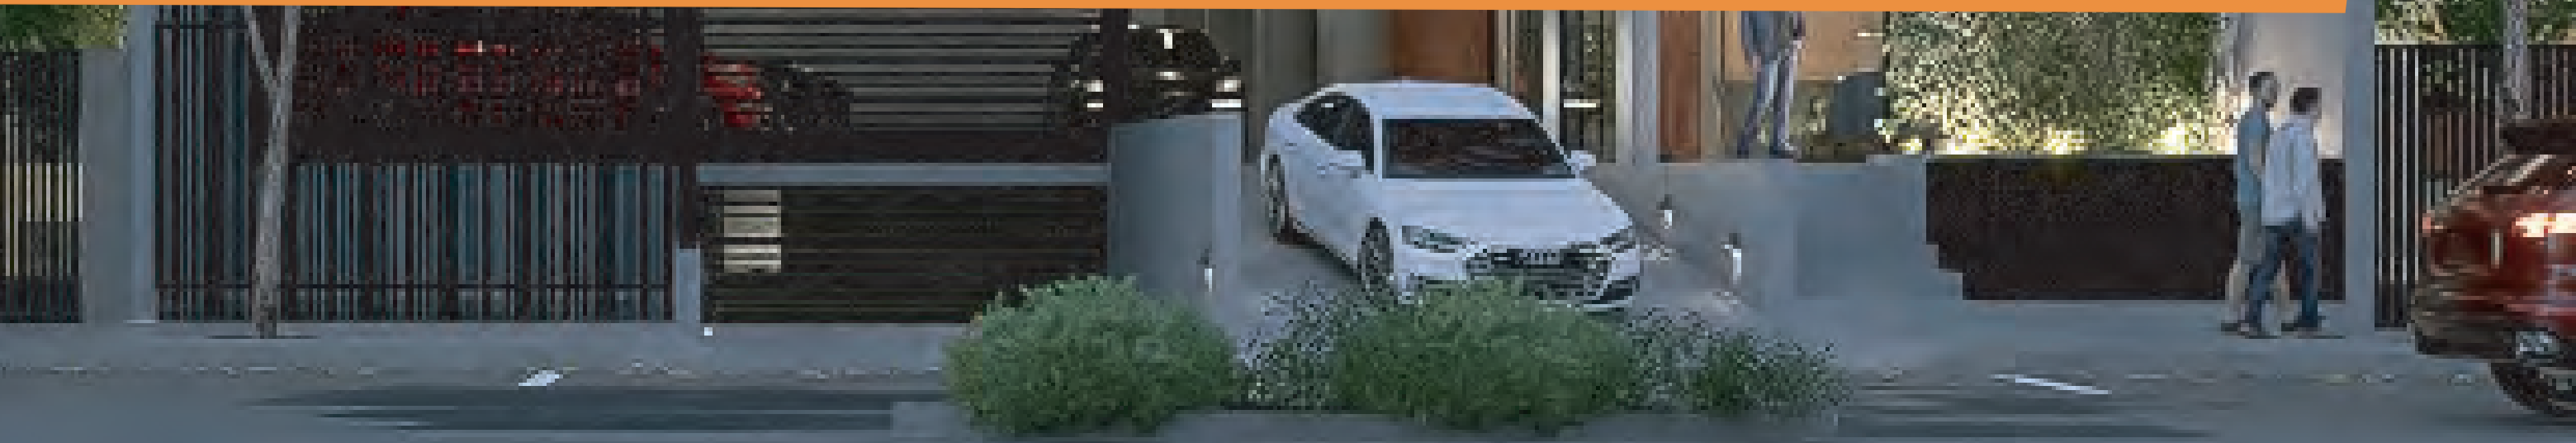

Avance de Obra We[®] Recoleta.

-
Agosto 2024

Avances de Obra.

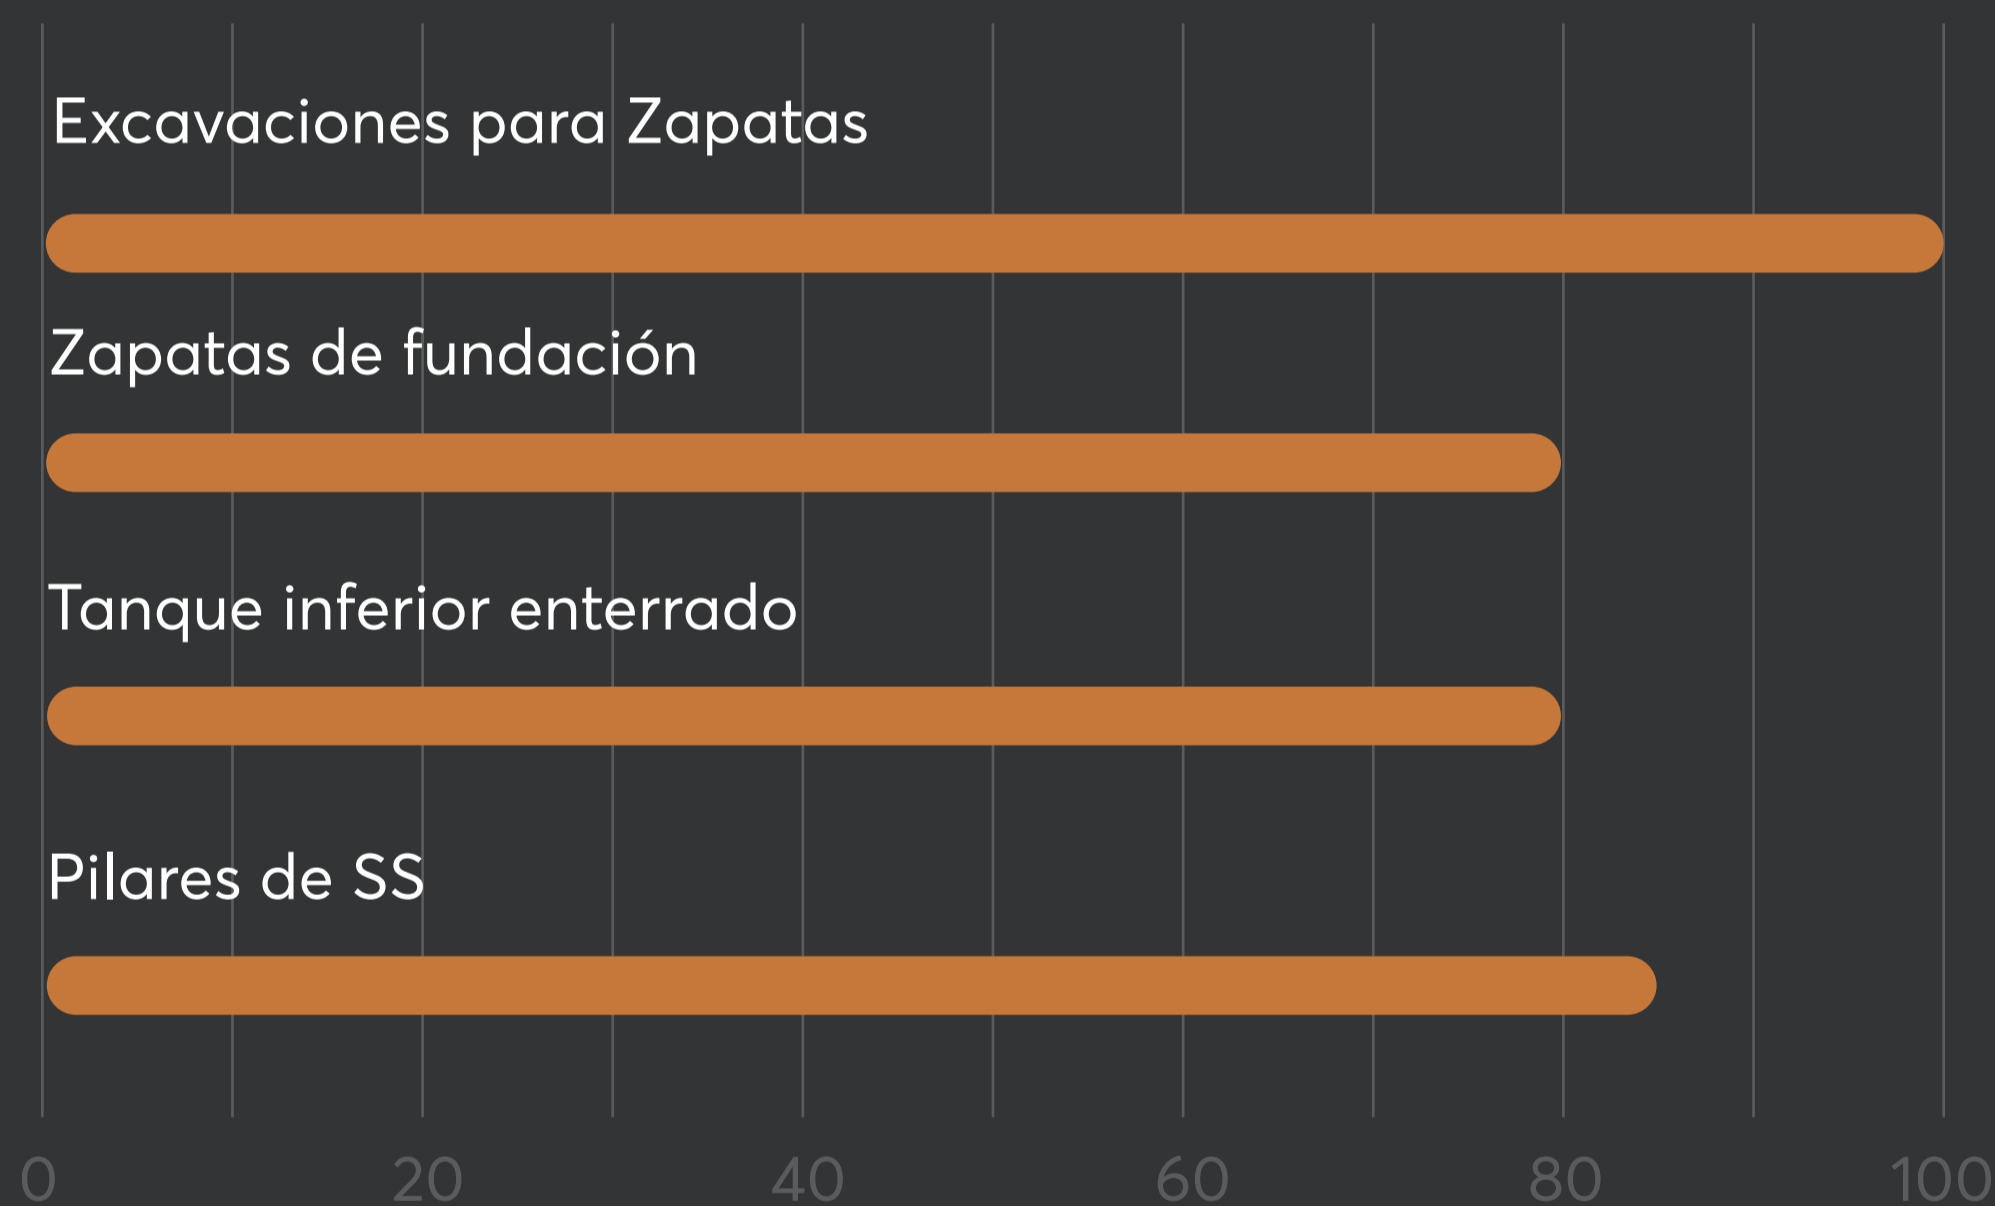

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Agosto 2024 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera entre Alberto Souza y Dr. Eduardo Lopez Moreira de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Recoleta.

-
Agosto 2024

Trabajos Realizados

Pilares

Los pilares de SS estan en un 85% de avance.

Excavaciones

Las excavaciones ya se encuentran terminadas y las zapatas en un 80% terminadas , el resto a espera de cargado.

Próximos Trabajos

Hormigon

Cargado de losa subsuelo y planta baja .

Avance de Obra We[®] Recoleta.

-
Agosto 2024



Primeras Semanas

Las excavaciones de zapatas terminadas , en espera de cargado de las zapatas frente zona recepción.

Tanque inferior enterrado en SS terminado en hormigon.

Avance de Obra We[®] Recoleta.

-
Agosto 2024



Últimas Semanas

Se tuvieron muchos días de lluvias pero se tuvo bastante avance , pilares de ss en altura en un 85% cargados.



CDG[®]
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

GÓMEZ
ABENTE
CONSTRUCCIONES
