




# Informe mensual Avance de Obra

Octubre 2024




CDG<sup>®</sup>  
Desarrollos

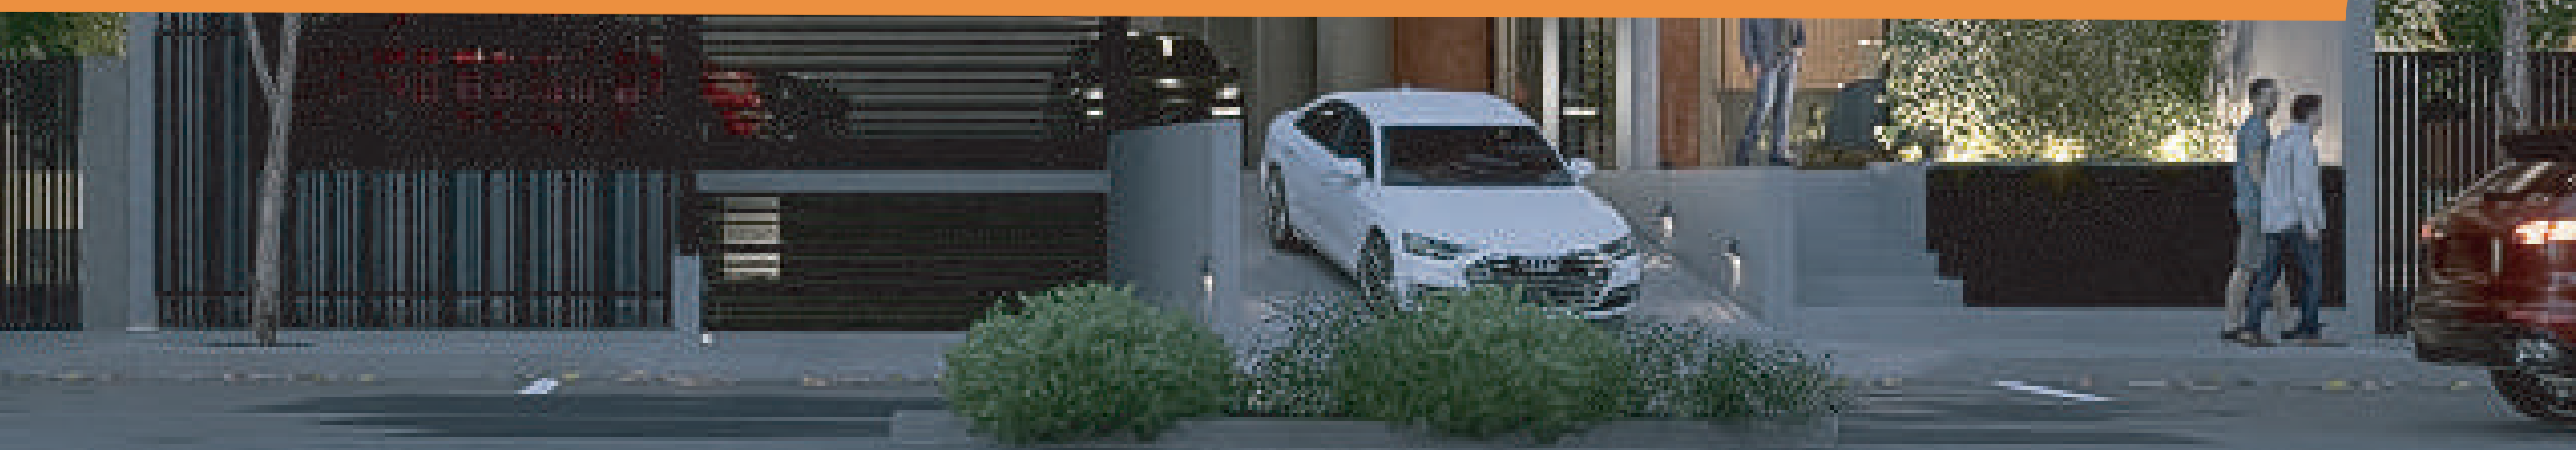

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Recoleta.

-  
Octubre 2024

## Avances de Obra.

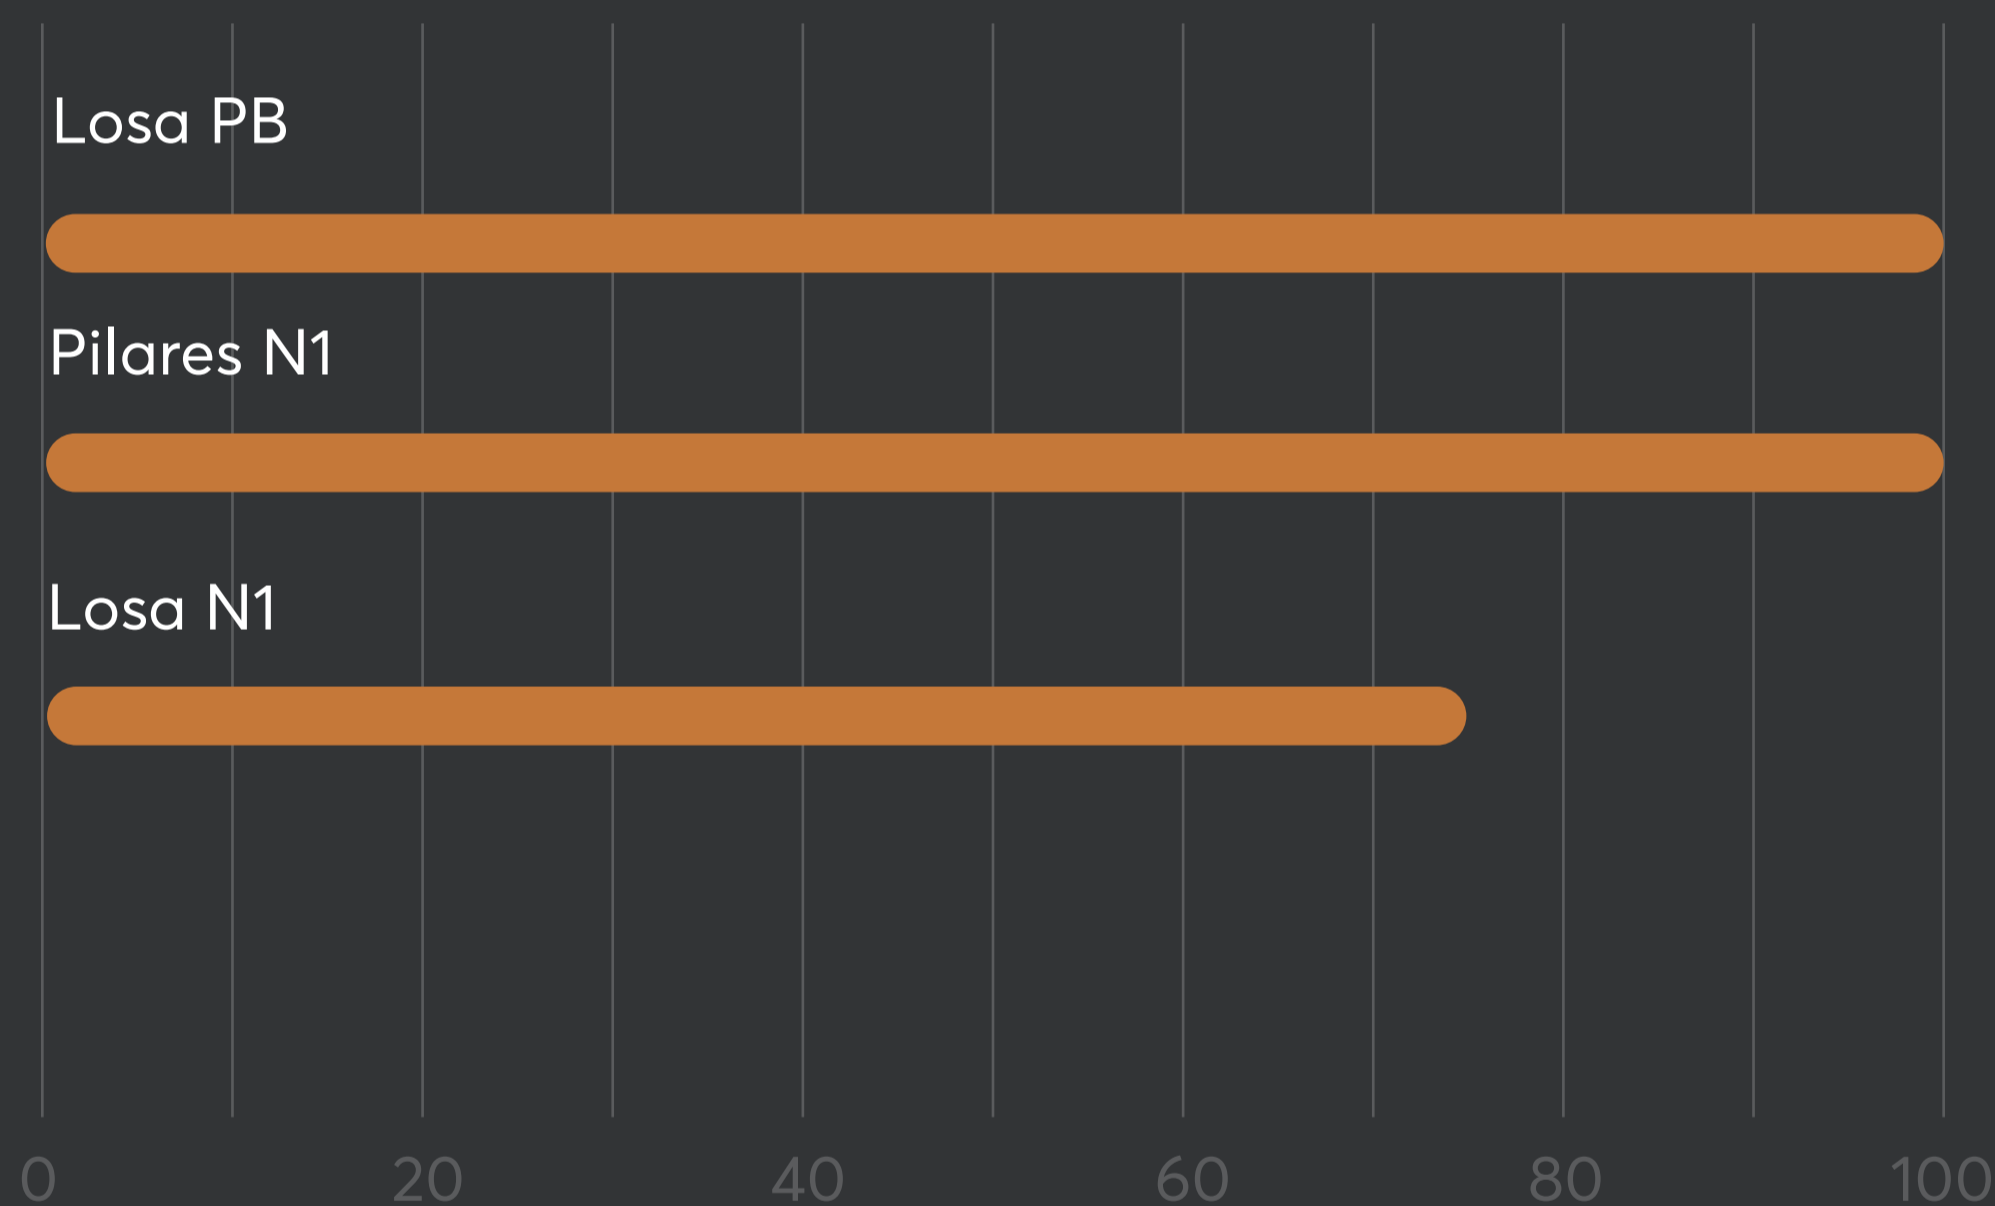

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Octubre 2024 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera entre Alberto Souza y Dr. Eduardo Lopez Moreira de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

# Avance de Obra

## We<sup>®</sup> Recoleta.

Octubre 2024

### Trabajos Realizados

Pilares

Los pilares de nivel 1 estan terminados y encofrado con armaduras 75% de avance.

Circulacion

Cargado de hormigon de la caja de ascensor en Nivel 1 y escalera de SS y planta baja cargadas.

### Próximos Trabajos

Hormigon

Armaduras de losa con encogrado para la losa del Nivel 1 .

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Recoleta.

Octubre 2024



## Primeras Semanas

Se termino el cargado de la losa de planta.  
Se procedio al encofrado y cargado de los pilares del nivel 1.

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Recoleta.

Octubre 2024



## Últimas Semanas

Se empezó el encofrado con armado de varillas de la losa del nivel 1.  
Se terminó el cargado de la losa de Planta baja a Nivel 1.  
Y el cargado de caja de ascensor de nivel 1.



CDG<sup>®</sup>  
Desarrollos

Contacto —

**(+595) 985 670707**

Aliados

-



ESCRIBANÍA  
TROCHE

GÓMEZ  
ABENTE  
CONSTRUCCIONES
