



Informe mensual Avance de Obra

Septiembre 2022



CDG[®]
Desarrollos




Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

Septiembre 2022

Avances de Obra.

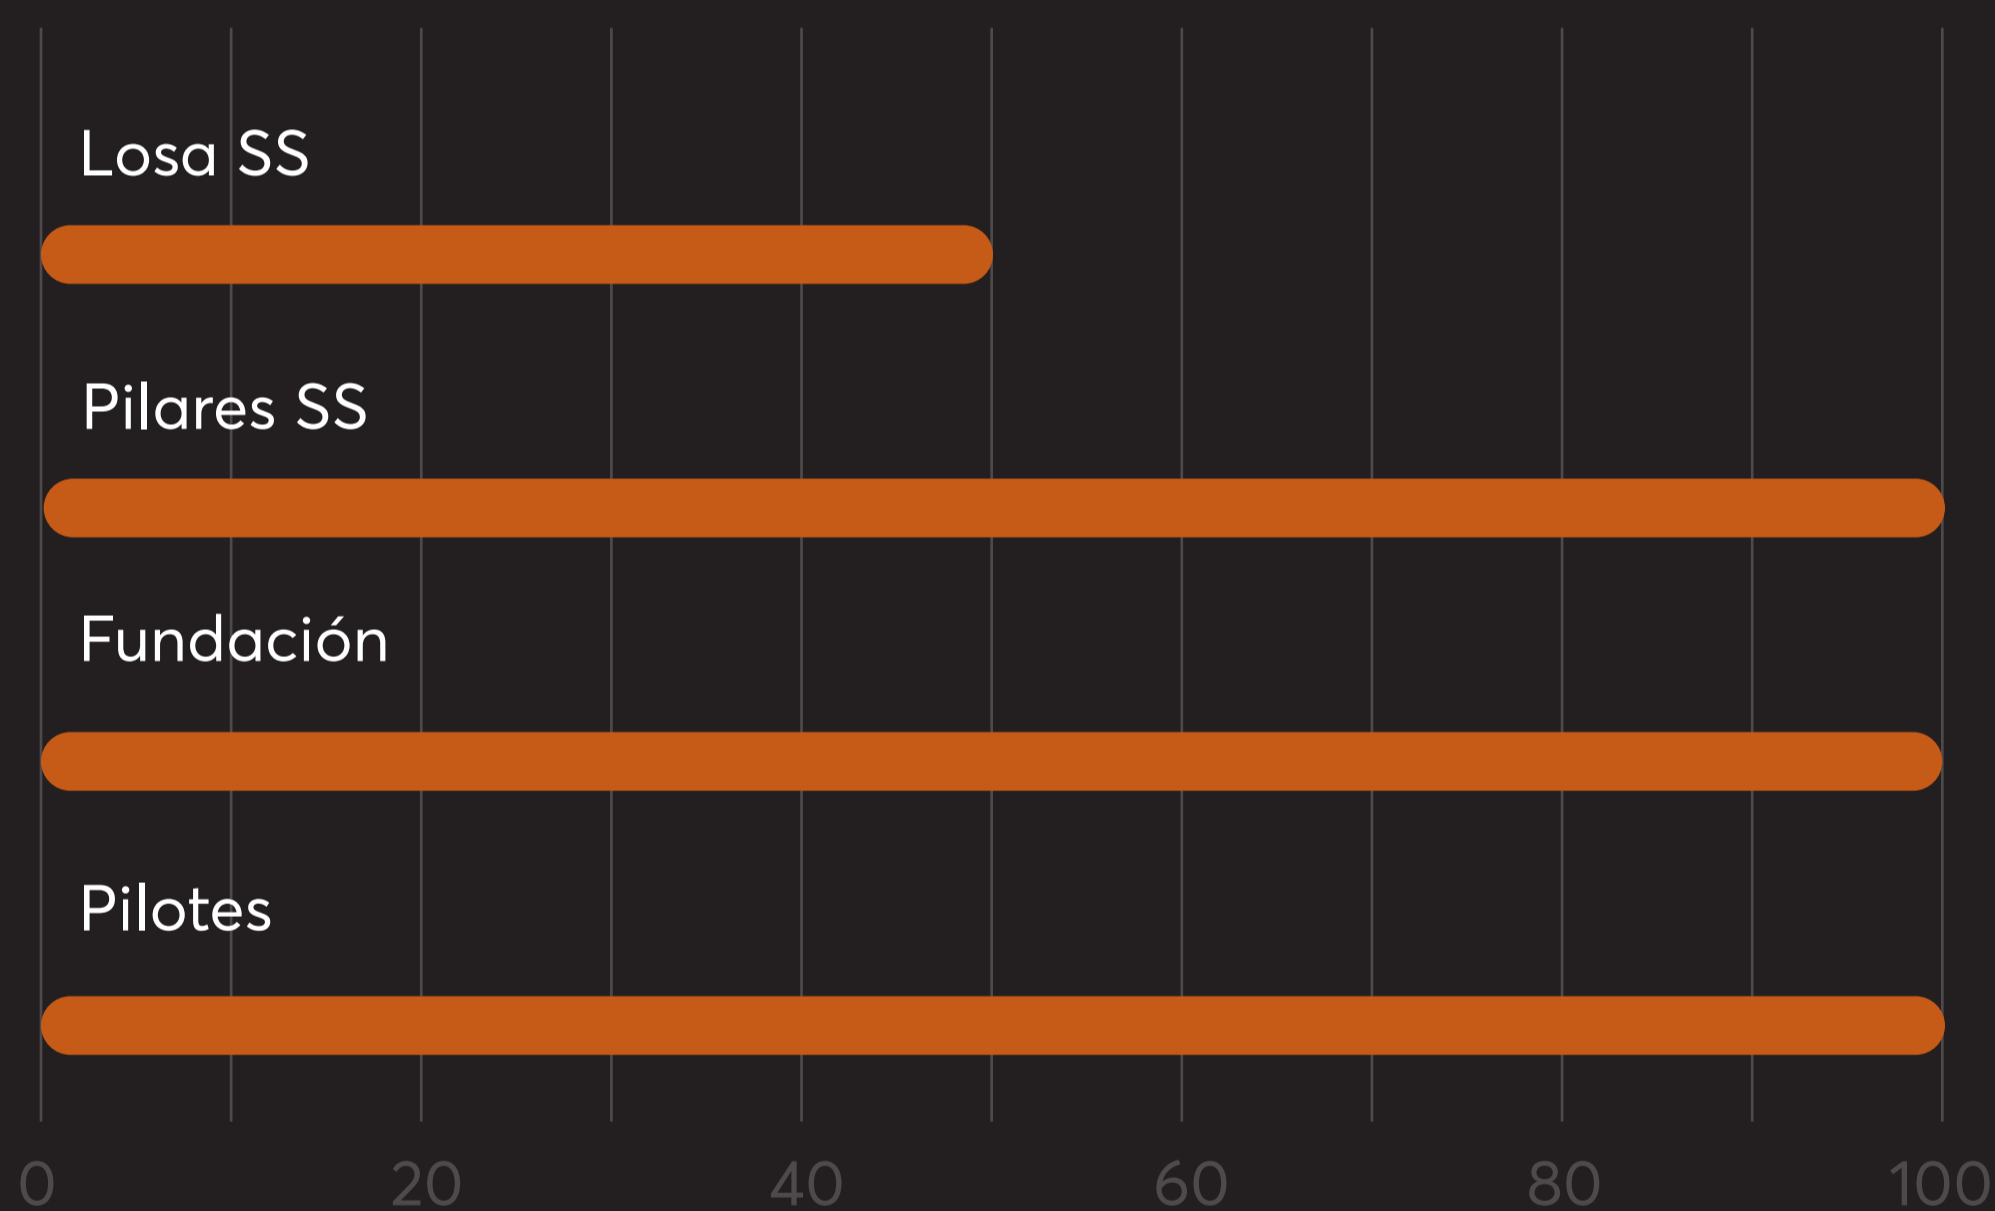

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Septiembre 2022 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Septiembre 2022

Trabajos Realizados

Movimiento
de Suelo y
Fundaciones

Se da por terminado lo pendiente de la terminación de trabajos de nivelaciones en ss.
Trabajos 100% finalizados zapatas , fustes y vigas.

Estructura H° A°

Pilares de SS terminados 100% , encofrado de la primera losa casetonada de SS.

Próximos Trabajos

Estructura H° A°

Se continuará con los encofrados correspondientes de pilares y losa del nivel de planta baja y los niveles superiores.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Septiembre 2022



Primeras Semanas

Armado , encofrado y cargado de los pilares faltantes de nivel de Sub-suelo.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Septiembre 2022



Primeras Semanas

Proceso de excavación para tanque inferior ubicado en SS , proceso de armado de varillas con encofrado y posterior cargado. Llegada de los moldes para el encofrado de los casetones de losa SS.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Septiembre 2022



Primeras Semanas

Proceso de cargado para contrapiso ,
apuntalamiento para econfrado de losa y
vigas.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Septiembre 2022



**Primeras
Semanas**

Colocación de encofrado con moldes de casetonado en un 75% ejecutado.



CDG®
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados



Estudio Contable

PCG

ESCRIBANÍA
TROCHE

Escribanos

Troche



Estudio Legal & Impositivo

Kemper

**GÓMEZ
ABENTE**
CONSTRUCCIONES

Constructora

Gomez Abente
