



Informe mensual Avance de Obra

Octubre 2022



CDG[®]
Desarrollos




Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

Octubre 2022

Avances de Obra.

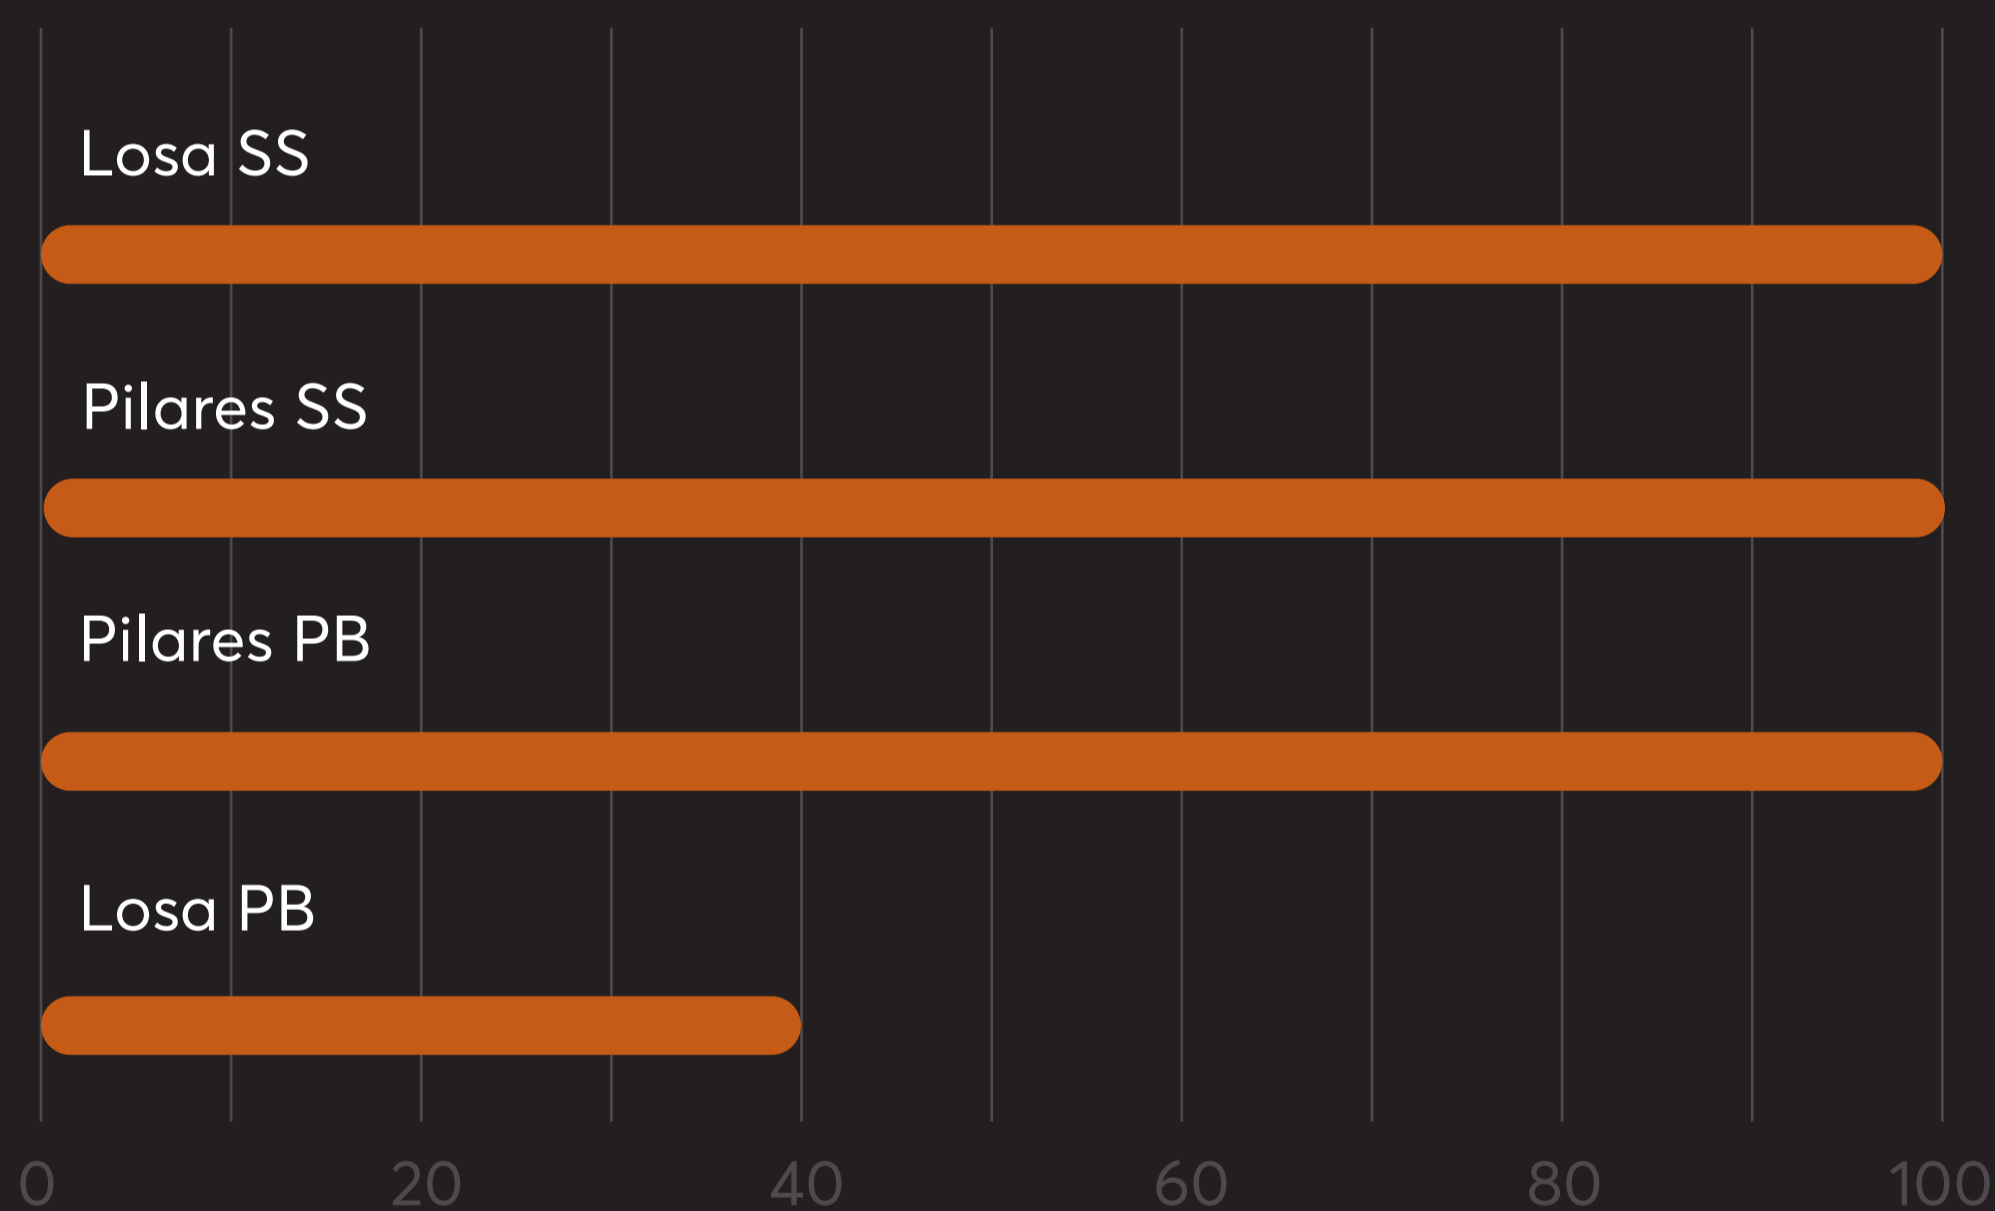

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Octubre 2022 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Octubre 2022

Trabajos Realizados

Instalaciones

Una vez comenzado el trabajo de estructura de losa se empieza a trabajar en electroductos y paso para las instalaciones sanitarias y pluviales a la par.

Estructura H° A°

Pilares de PB terminados 100% , encofrado de la losa de PB en un 50%.

Próximos Trabajos

Estructura H° A°

Se continuará con los encofrados correspondientes de pilares y losa del nivel 1 los niveles superiores. Se espera el cargamento de la segunda losa el 25 de octubre.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Octubre 2022



Finales de Septiembre

Armado , encofrado y cargado de los pilares del nivel de Planta Baja.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Octubre 2022



Comienzo de octubre

Cargado de los primeros pilares de Pb , para empezar el encofrado de vigas de la losa de planta baja , cargado de caja de ascensor.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

–
Octubre 2022



**Mediados
de octubre**

100% terminado pilares de Planta Baja ,
proceso de encofrado de losa de Planta Baja
en un 45%.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Octubre 2022



Mediados de octubre

Colocación de encofrado con moldes de casetonado en un 50% ejecutado en losa de Planta Baja.



CDG[®]
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

