



Informe mensual Avance de Obra

Noviembre 2022



CDG[®]
Desarrollos




Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Noviembre 2022

Avances de Obra.

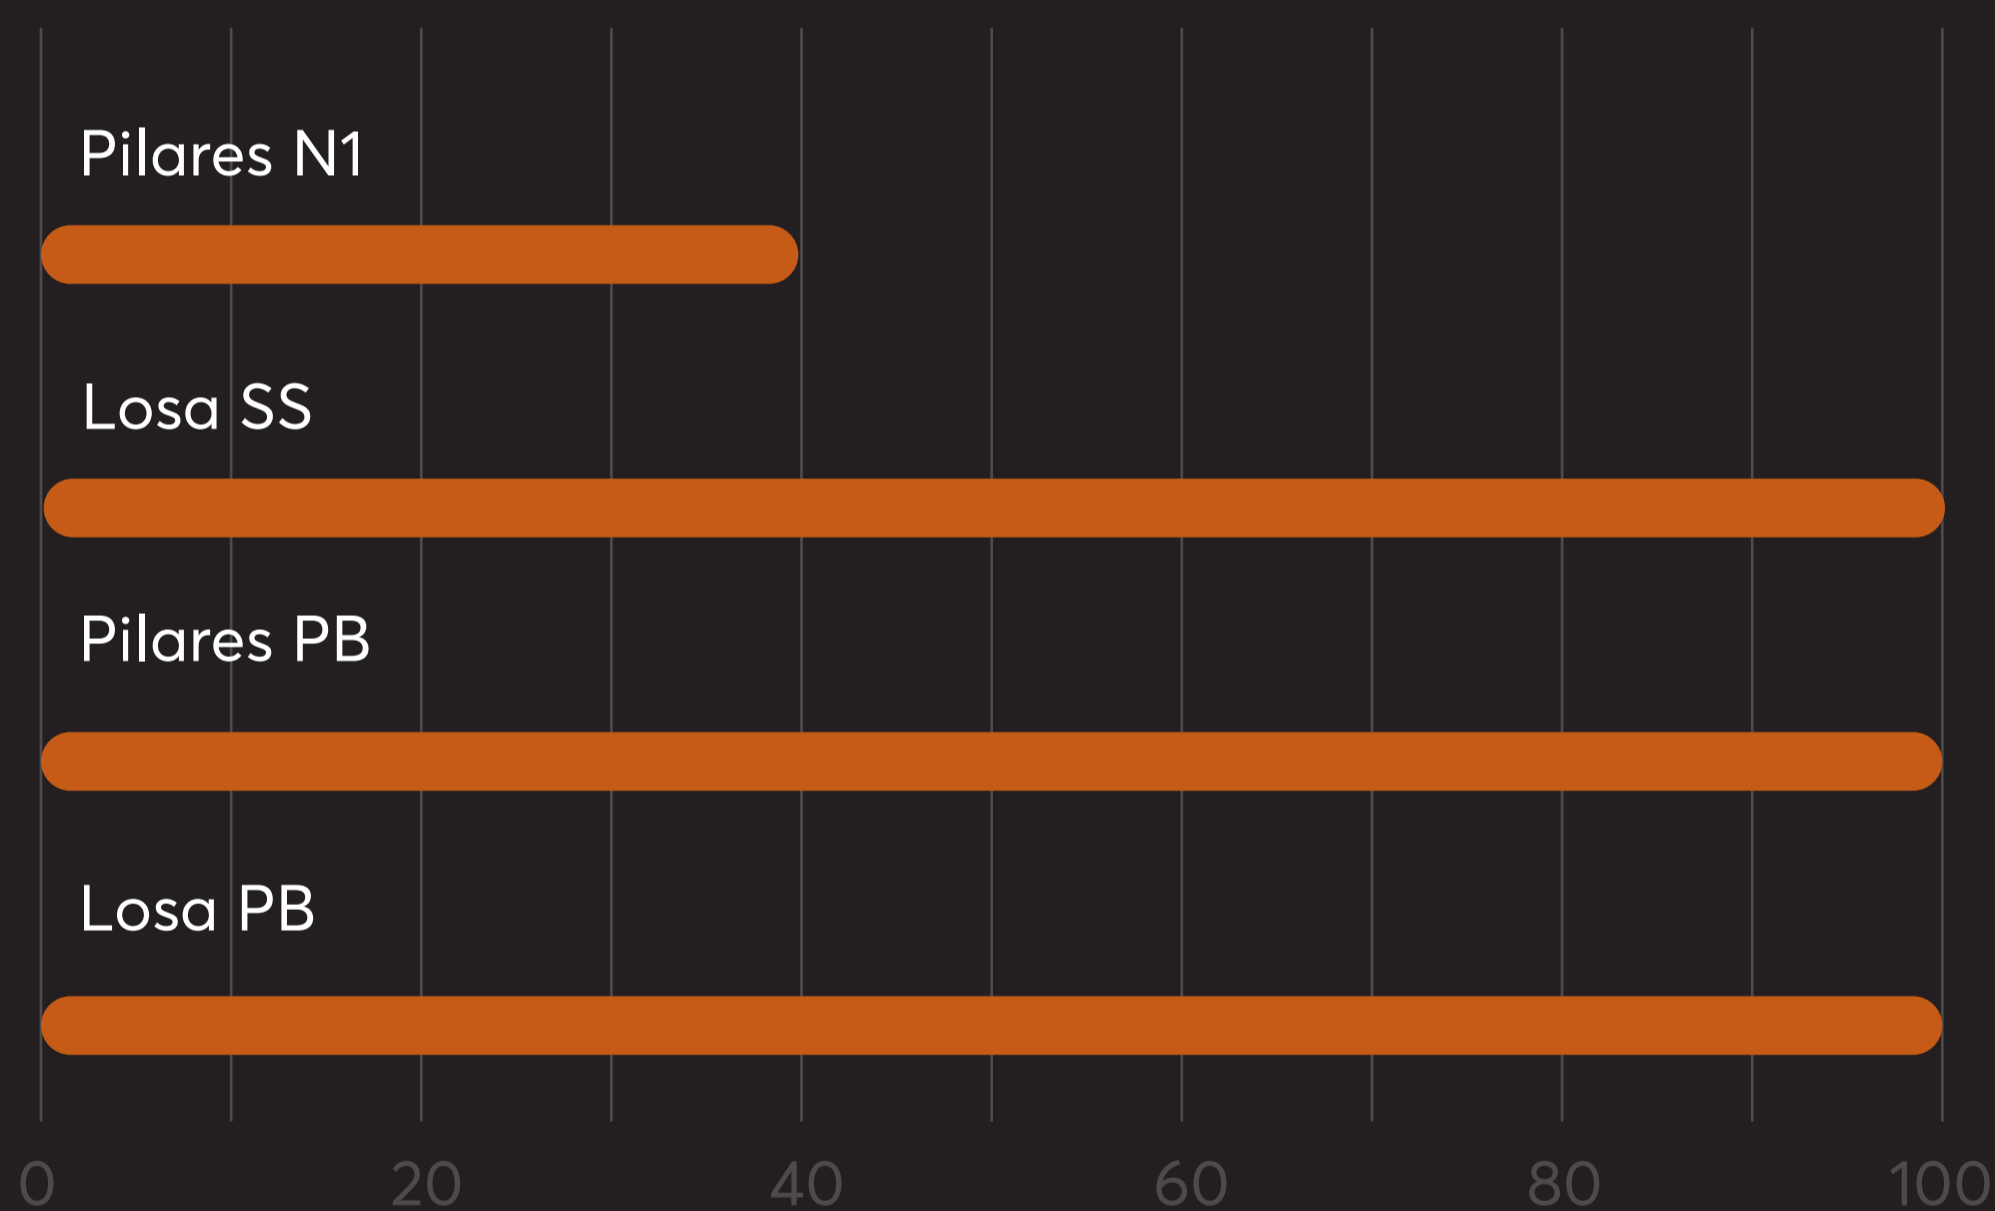

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Noviembre 2022 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Noviembre 2022

Trabajos Realizados

Instalaciones

Una vez comenzado el trabajo de estructura de losa se empieza a trabajar en electroductos y paso para las instalaciones sanitarias y pluviales a la par.

Estructura H° A°

Losa y Pilares de Pb terminados , se empezó a realizar el cargado de los pilares del Nivel 1 en un 40%.

Próximos Trabajos

Estructura H° A°

Se continuará con los encofrados correspondientes de pilares duración de trabajo una semana y luego se procede a comenzar el encofrado de la losa de N1.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Noviembre 2022



**Finales
de Octubre**

Armado , encofrado y cargado de la Losa del nivel de Planta Baja.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

–
Noviembre 2022



Comienzo de Noviembre

Cargado de escalera de SS , se continuan con los trabajos de encofrados y colocación de pasantes para las instalaciones.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

–
Noviembre 2022



Mediados de Noviembre

Cargado de escalera del nivel de PB , se continúan con los trabajos de encofradosos y colocación de pasantes para las instalaciones.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

–
Noviembre 2022



Mediados de Noviembre

Cargado de la Losa del nivel de Planta baja 100% terminado. Se inician los trabajos de encofrados de los pilares del Nivel 1 con el cargado de 16 Pilares.



CDG®
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

GÓMEZ
ABENTE
CONSTRUCCIONES
