


Enero 2023



Enero 2023

Avances de Obra.

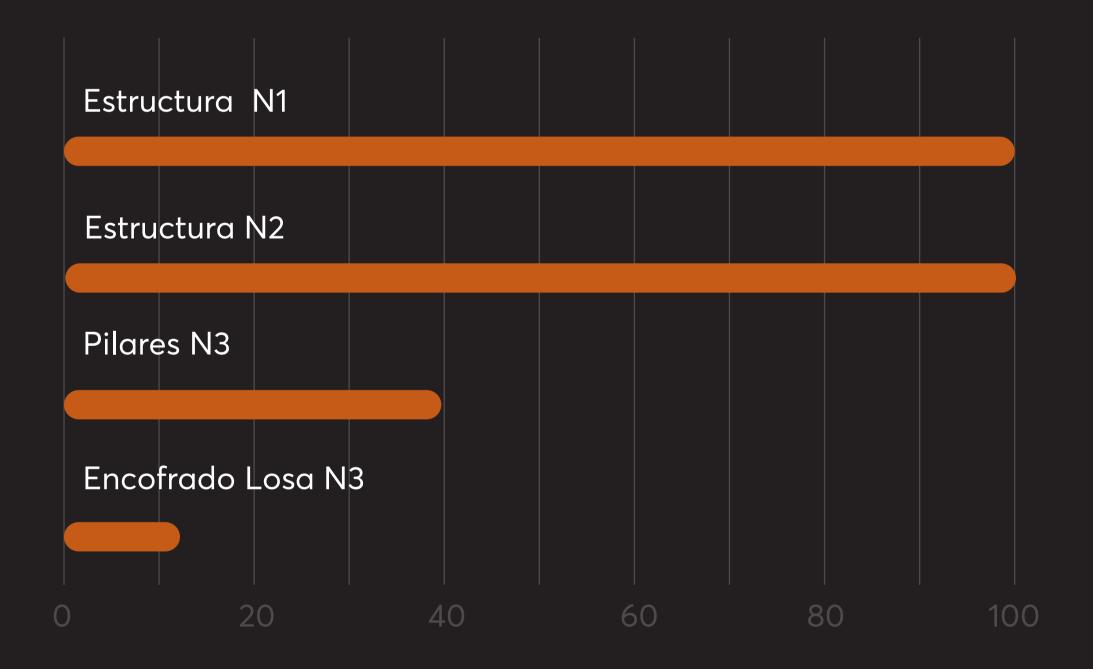

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Enero 2023 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

_

Enero 2023

Trabajos Realizados

Instalaciones	Una vez comenzado el trabajo de estructura de losa se empieza a trabajar en electroductos y paso para las instalaciones sanitarias y pluviales a la par.
Albañileria	Se comenzaron los trabajos de mamposteria en muros linderos en planta baja.

Próximos Trabajos

Estructura H° A°

Se continuará con los encofrados correspondientes de pilares duración de trabajo una semana y luego se procede a comenzar el encofrado de la losa de N3.

Enero 2023



Finales de Diciembre

Armado , encofrado y cargado de la Losa del nivel 2.

Enero 2023



Comienzo de Enero

Cargado de escalera/ caja de escalera y losa para nivel 2.

Enero 2023







Mediados de Enero

Ya se da por iniciado trabajos de encofrados para pilares del NIVEL 3. Se colocan todos los metodos de proteccion para construcciones linderas. Se empiezan los trabajos de mamposteria.



Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados









