



Informe mensual Avance de Obra

Febrero 2023



CDG[®]
Desarrollos




Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Febrero 2023

Avances de Obra.

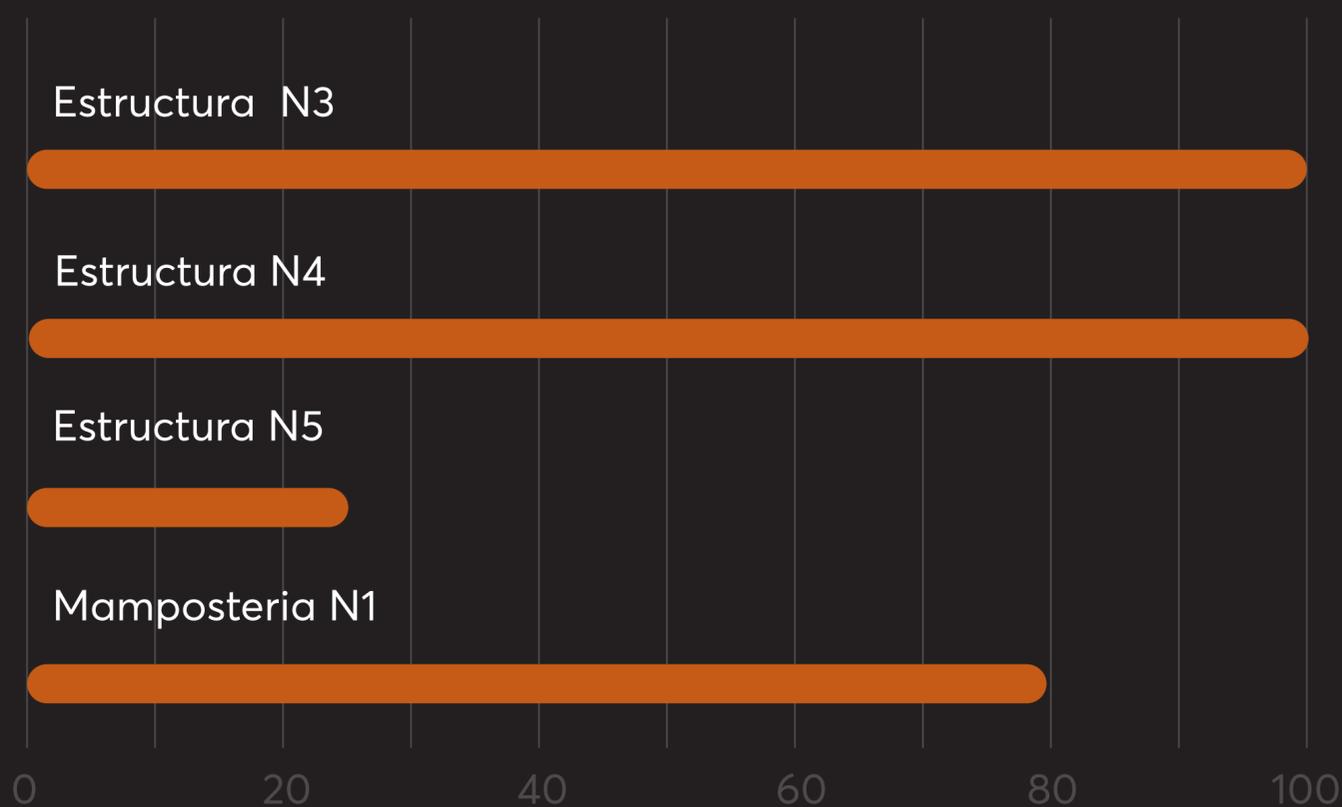

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Febrero 2023 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Febrero 2023

Trabajos Realizados

Instalaciones

Una vez comenzado el trabajo de estructura de losa se empieza a trabajar en electroductos y paso para las instalaciones sanitarias y pluviales a la par.

Albañilería

Se comenzaron los trabajos de mampostería en muros de subsuelo y en el nivel 1.

Próximos Trabajos

Estructura H° A°

Pilares completos y se procede a comenzar el encofrado de la losa de N5.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Febrero 2023



**Finales
de Enero**

Armado , encofrado y cargado de la Losa del nivel 4.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Febrero 2023



Comienzo de Febrero

Instalaciones pluviales en Subsuelo y trabajos de albañilería de muros linderos en planta baja y en subsuelo.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Febrero 2023



Mediados de Febrero

Ya se da por iniciado trabajos de encofrados de la losa N5. Se empezaron los trabajos de mampostería en el nivel 1 de las unidades de departamentos con su respectivo revoque.



CDG®
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

GÓMEZ
ABENTE
CONSTRUCCIONES
