



Informe mensual Avance de Obra

Abril 2023



CDG[®]
Desarrollos




Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Abril 2023

Avances de Obra.

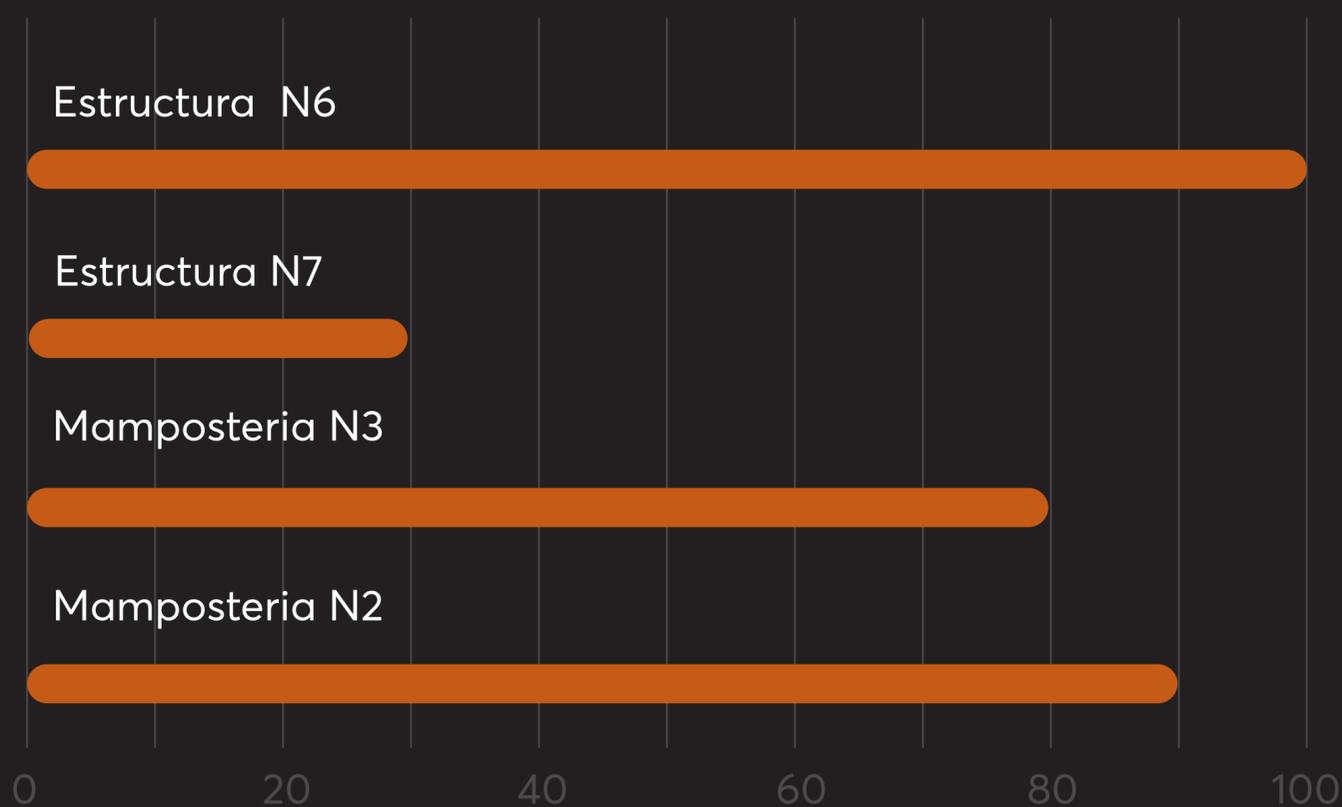

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Abril 2023 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Abril 2023

Trabajos Realizados

Instalaciones

Una vez comenzado el trabajo de estructura de losa se empieza a trabajar en electroductos y paso para las instalaciones sanitarias y pluviales a la par.

Albañilería

Se comenzaron los trabajos de mampostería en muros en nivel 4.

Próximos Trabajos

Estructura H° A°

Se procede a empezar el encofrado de fondo de vigas y losa del nivel 7.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Abril 2023




Finales de Marzo

Se están terminando las instalaciones sanitarias del nivel 1, las cajas de escaleras ya se están cerrando con mampostería y en proceso de revoque.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Abril 2023

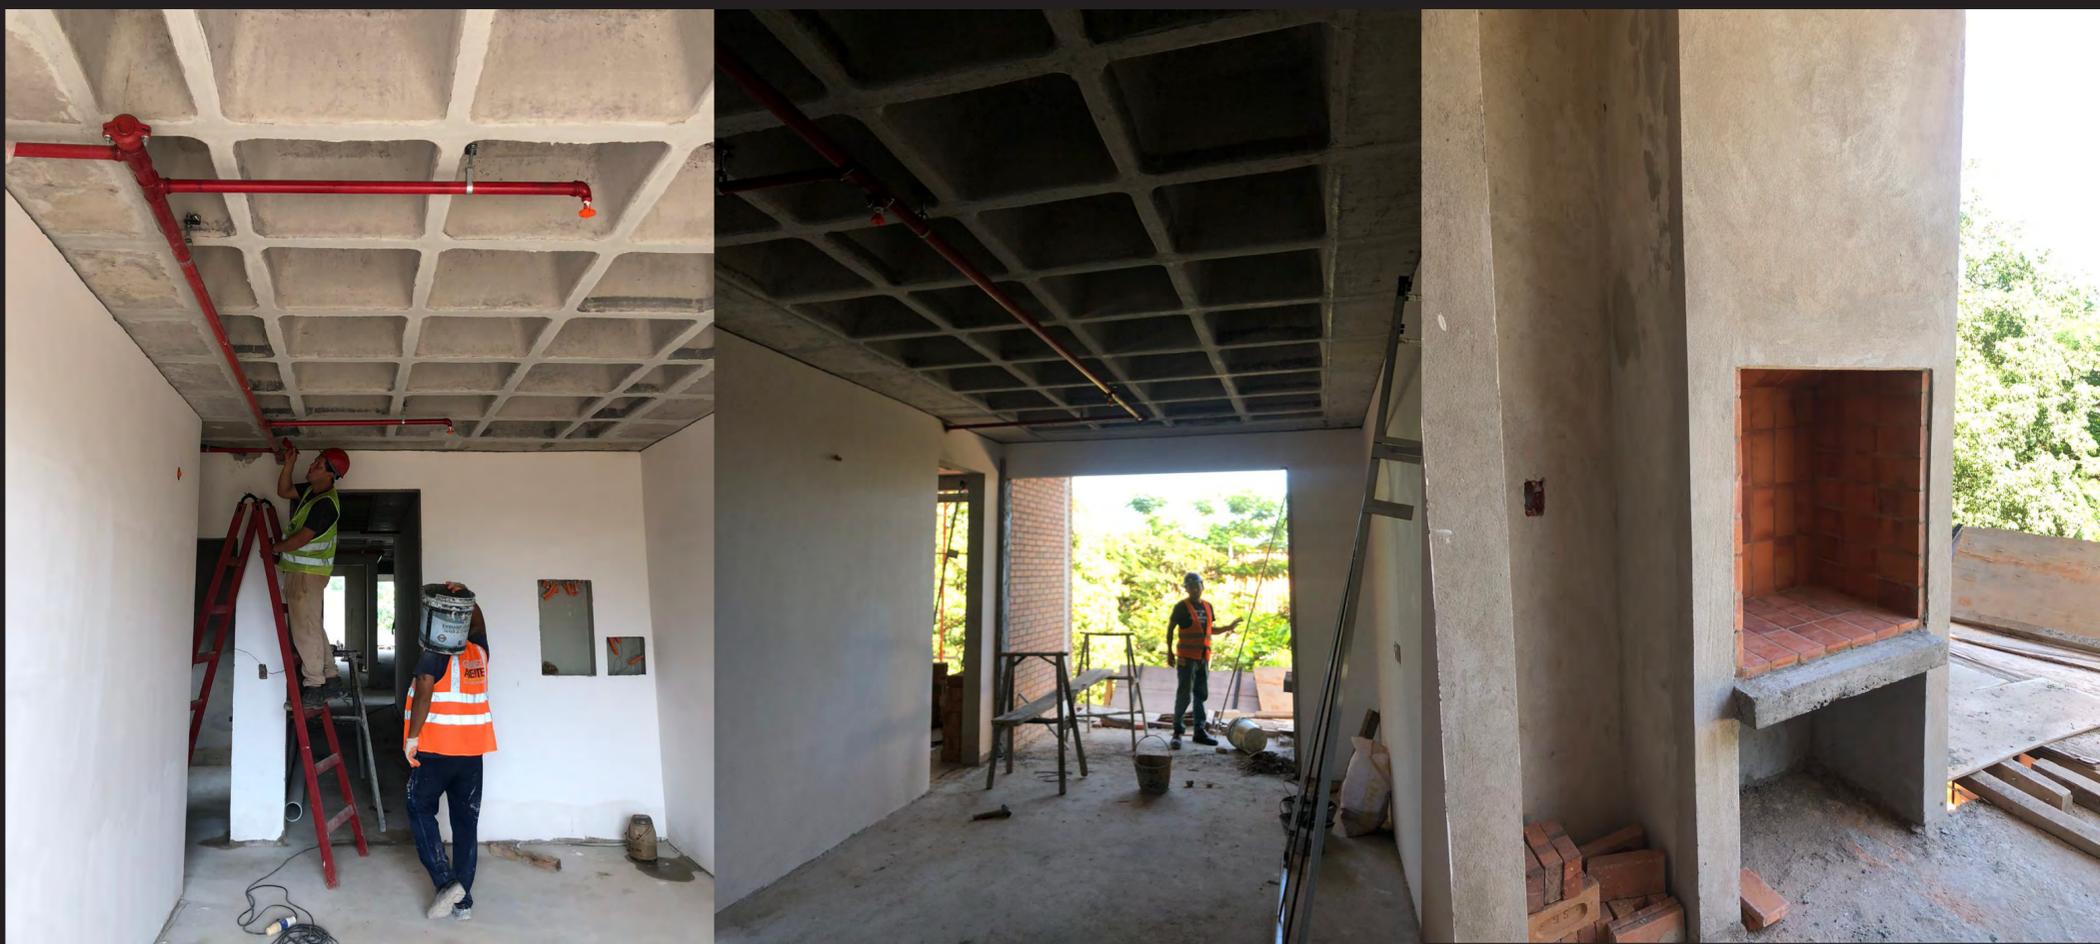

Comienzo de Abril

N1 paredes revocadas , con enduido , se comenzaton las instalaciones de PCI y cableado de electricidad, terminaciones en general, parillas estan en un 80%.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Abril 2023



**Mediados
de Abril**

Nivel 2 se encuentra en revoque , nivel 3 terminando mamposteria y el nivel 4 se comenzo la colocacion de ladrilos en linderos.



CDG[®]
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

