



Informe mensual Avance de Obra

Junio 2023



CDG[®]
Desarrollos




Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

Junio 2023

Avances de Obra.

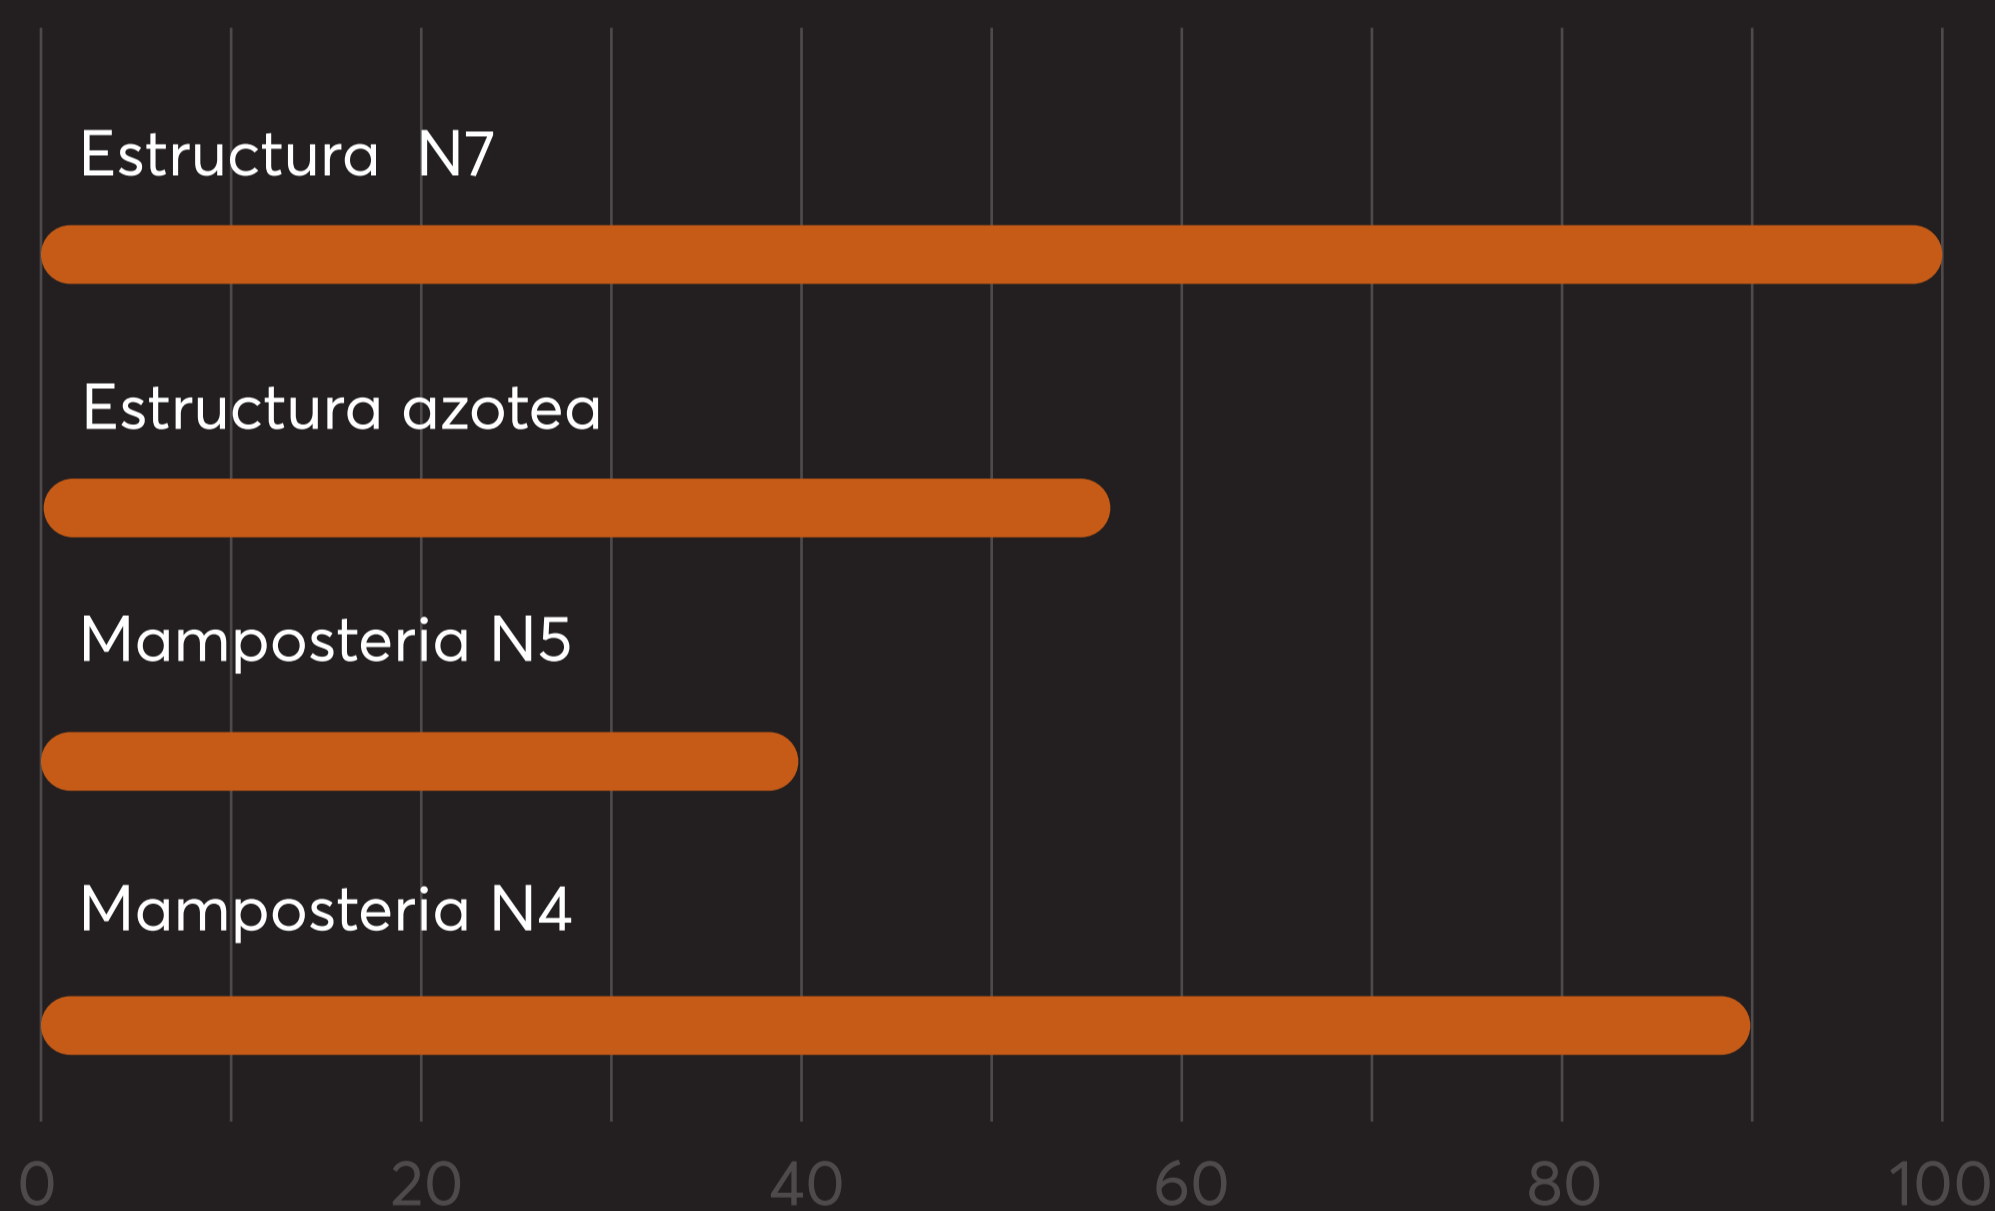

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Junio 2023 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Junio 2023

Trabajos Realizados

Instalaciones

Una vez comenzado el trabajo de estructura de losa se empieza a trabajar en electroductos y paso para las instalaciones sanitarias y pluviales a la par.

Albañilería

Se comenzaron los trabajos de mampostería en muros en nivel 4 y 5.

Próximos Trabajos

Estructura H° A°

Se procede a empezar el encofrado de fondo de vigas y losa del nivel de techo de azotea.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Junio 2023



Finales de Mayo

Trabajos de Linderos en 75% acompañado de revoques exteriores.
Avance de trabajos en escaleras con barandas y perfil de guardacantos.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Junio 2023



Comienzo de Junio

Avance en terminacion en nivel 1 , colocacion de pisos , zócalos , puertas , perfilerias , iluminacion y muebles.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Junio 2023



Mediados de Junio

Nivel 2 y nivel 3 se encuentra en revoque , nivel 2 con mas avances de instalaciones sanitarias, nivel 4 y nivel 5 avance en altura de mamposteria en un 50%.
Techo de terraza 100% y proceso para cargado de piscina .



CDG[®]
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

GÓMEZ
ABENTE
CONSTRUCCIONES
