



Informe mensual Avance de Obra

Julio 2023



CDG[®]
Desarrollos




Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

Julio 2023

Avances de Obra.

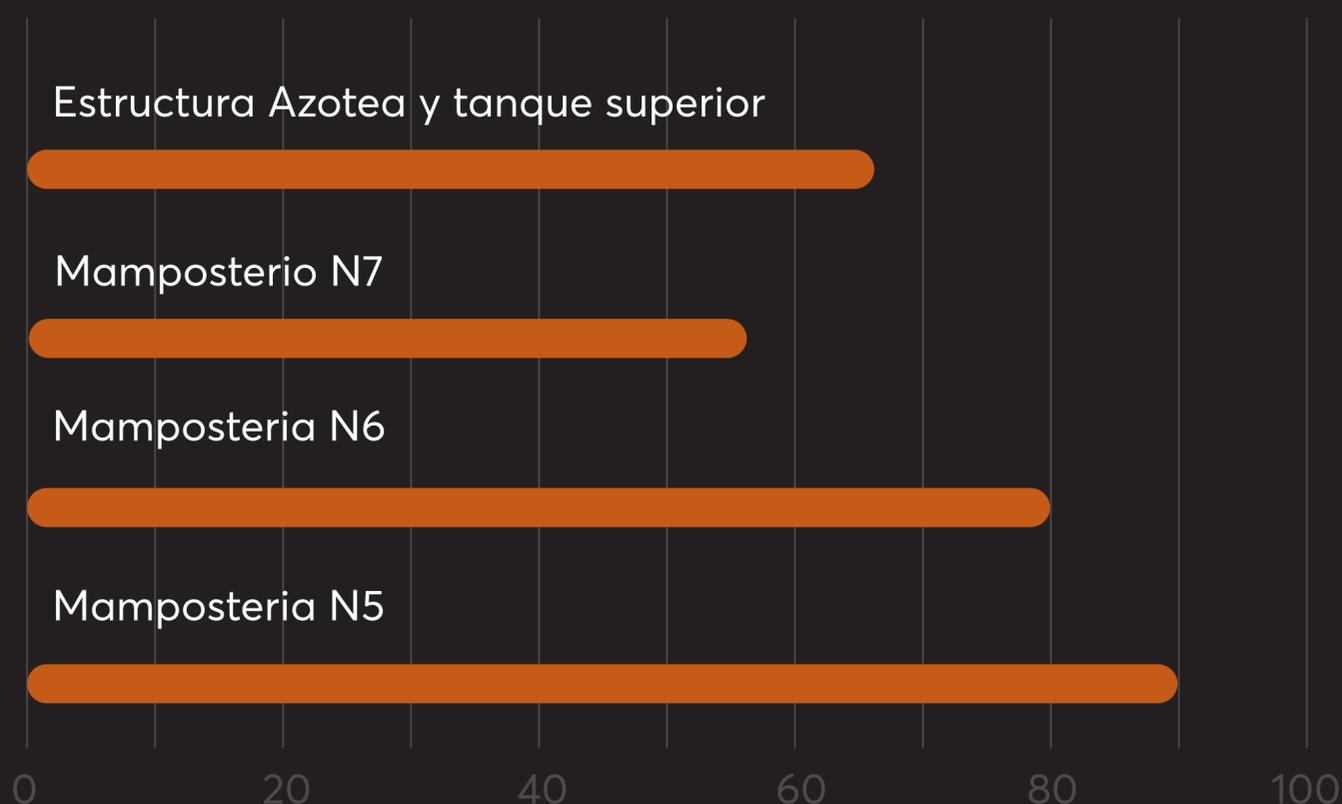

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Julio 2023 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Julio 2023

Trabajos Realizados

Instalaciones

Una vez comenzado el trabajo de estructura de losa se empieza a trabajar en electroductos y paso para las instalaciones sanitarias y pluviales a la par. Hasta el momento van hasta el nivel 4.

Albañilería

Se comenzaron los trabajos de mampostería en muros en nivel 6 y 7.

Próximos Trabajos

Estructura H° A°

Se procede a empezar el encofrado de deck de piscina y de tanque superior para dar finalidad a los trabajos de hormigón.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Julio 2023




Finales de Junio

Trabajos de Linderos en 85% acompañado de revoques exteriores.
Avance de trabajos de fachada principal con los muros vistos y muros de mampostería hueca con revoque.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Julio 2023

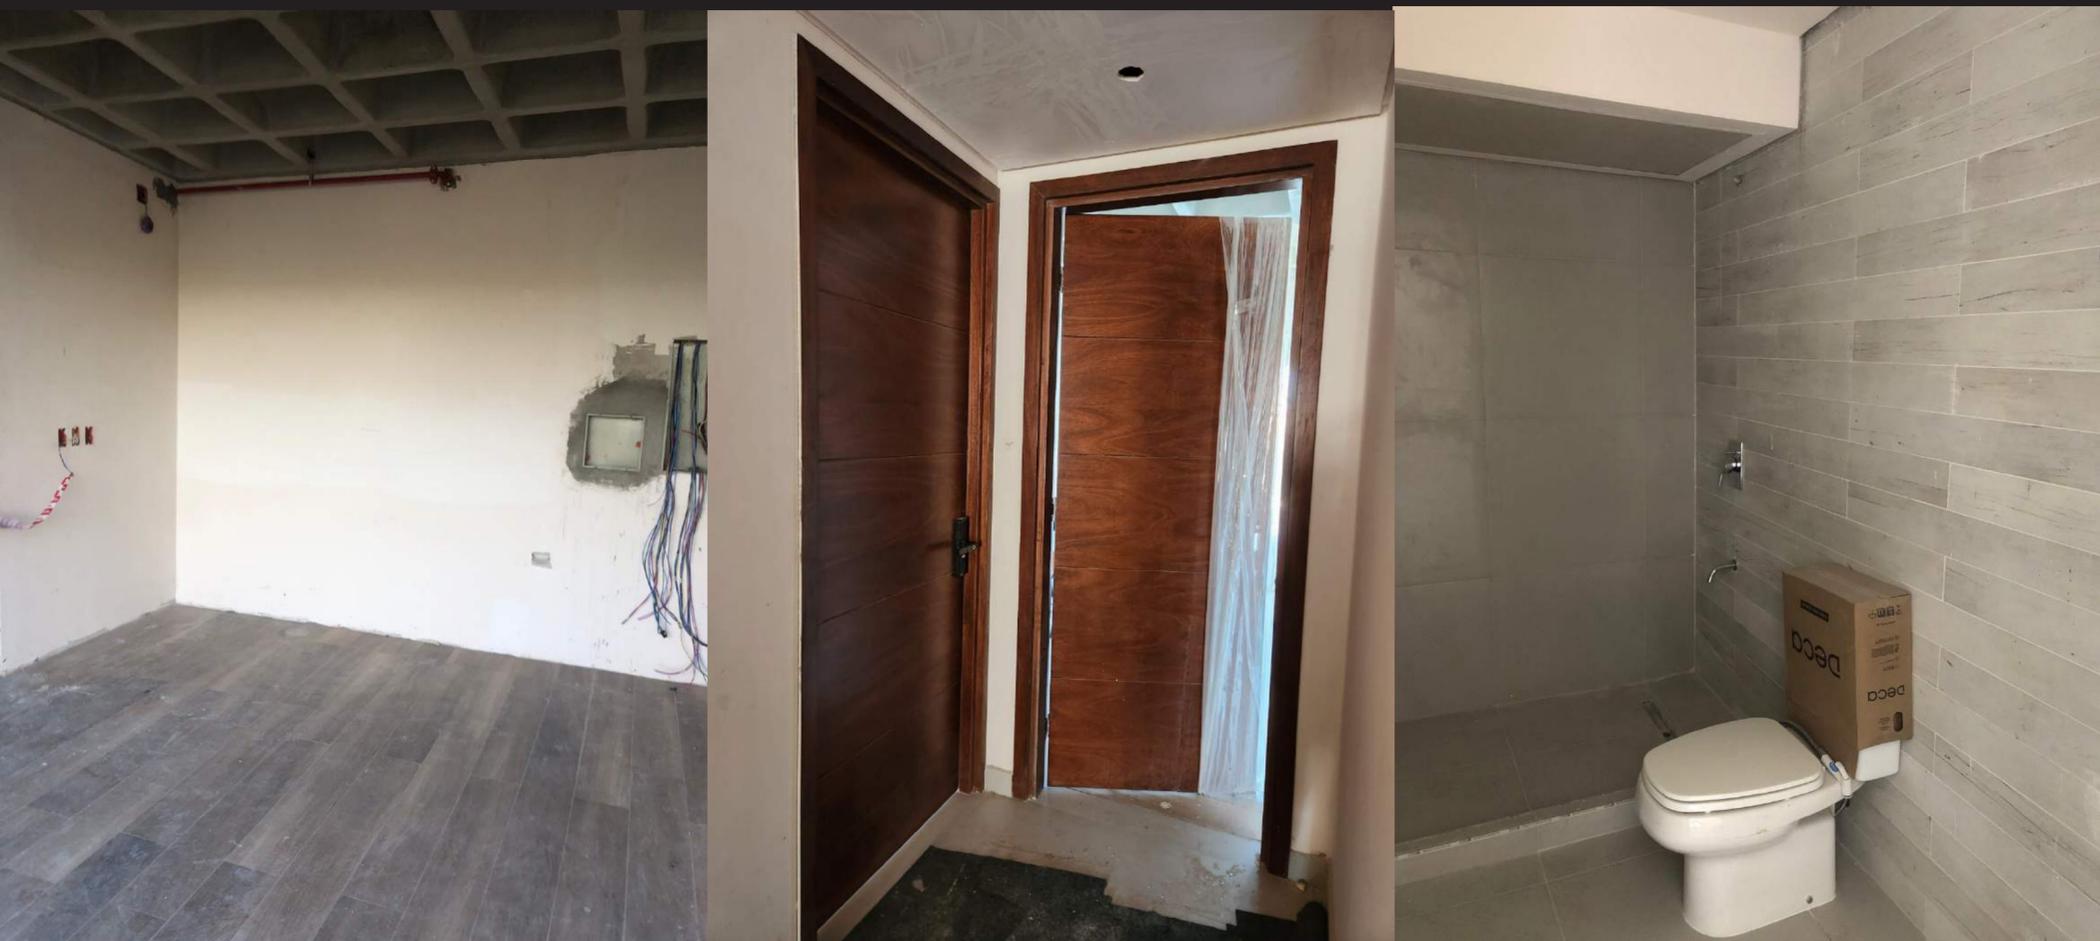

Comienzo de Julio

Avance en terminacion en nivel 1 ,Pci terminado , pisos colocados y revestidos de baños en su totalidad y paredes con enduido y pintura.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Julio 2023



Mediados de Julio

Nivel 2 terminacion enduido y nivel 3 se encuentra en revoque , nivel 4 y nivel 5 avance en revoque en espera de cargado de contrapiso, nivel 6 y 7 en trabajos de mamposteria.



CDG®
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

