



Informe mensual Avance de Obra

Agosto 2023




CDG[®]
Desarrollos



Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Agosto 2023

Avances de Obra.

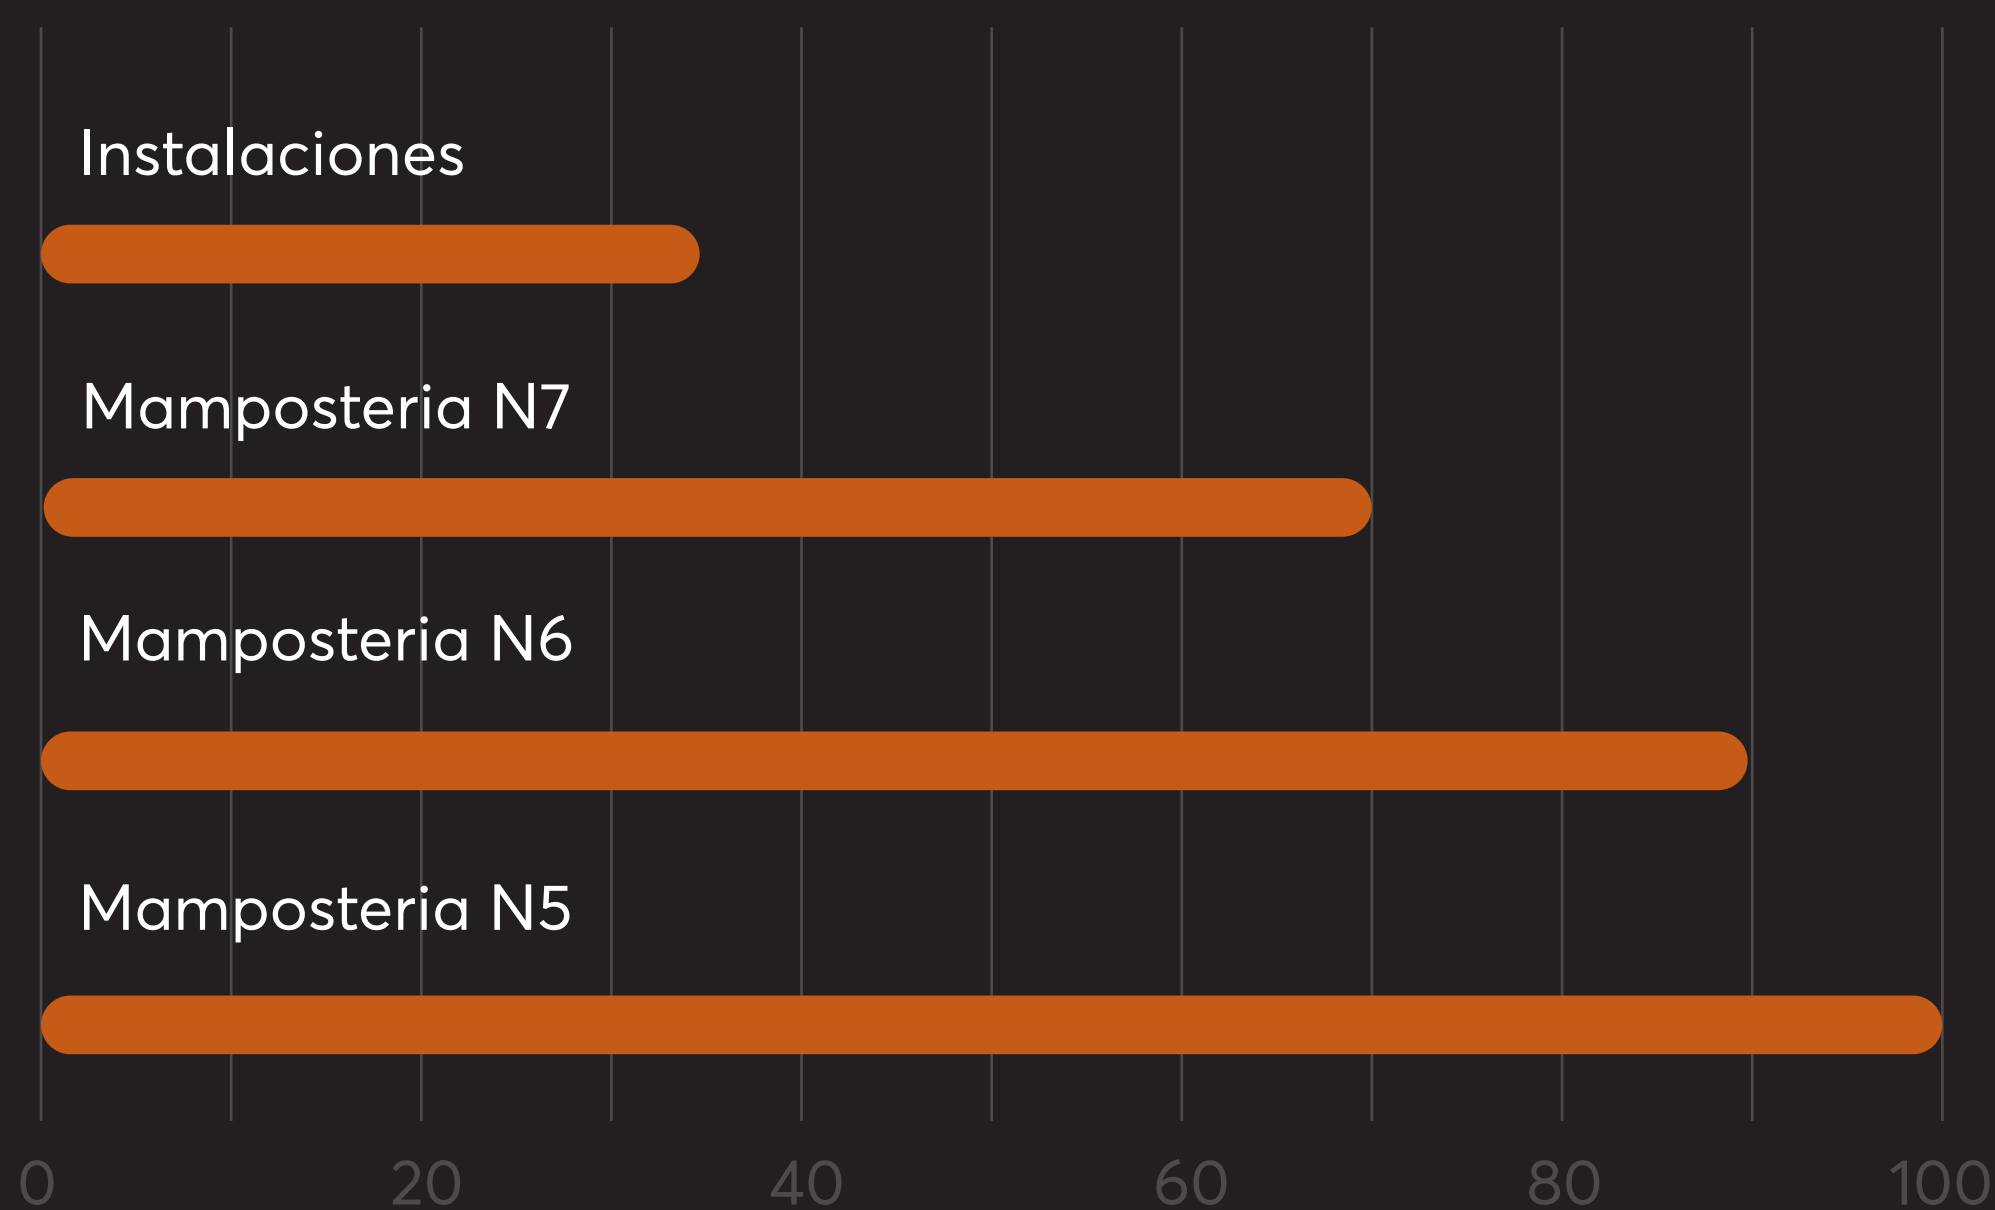

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Agosto 2023 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Agosto 2023

Trabajos Realizados

Instalaciones

Una vez comenzado el trabajo de estructura de losa se empieza a trabajar en electroductos y paso para las instalaciones sanitarias y pluviales a la par. Hasta el momento van hasta el nivel 5.

Albañilería

Se comenzaron los trabajos de mampostería en muros en nivel 6 y 7.

Próximos Trabajos

Instalaciones

Se procede a empezar los trabajos de presutiazción de escalera contra incendios y el montaje de ascensor.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Agosto 2023



Finales de Julio

Trabajos de Linderos en 90% acompañado de revoques exteriores.
Avance de trabajos de fachada principal en un 50%.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Agosto 2023



Comienzo de Agosto

Nivel 1 terminado en un 80% en espera de muebles de cocina y placares de dormitorios. Rubros terminados Cielorraso , luces , puertas , pinturas , aluminio ,accesorios y revestidos de baños.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Agosto 2023



Mediados de Agosto

Nivel 2 terminacion enduido y nivel 3 se encuentra en revoque , nivel 4 , nivel 5 y nivel 6 avance en revoque en espera de cargado de contrapiso, nivel 7 en trabajos de mamposteria.

Pci en un 70% los trabajos en todos los niveles , mientras que en el nivel 7 se empieza el trabajo de PCI.



CDG[®]
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

GÓMEZ
ABENTE
CONSTRUCCIONES
