



# Informe mensual Avance de Obra

Septiembre 2023



CDG<sup>®</sup>  
Desarrollos






# Avance de Obra We<sup>®</sup> Villa Morra.

Septiembre 2023

## Avances de Obra.

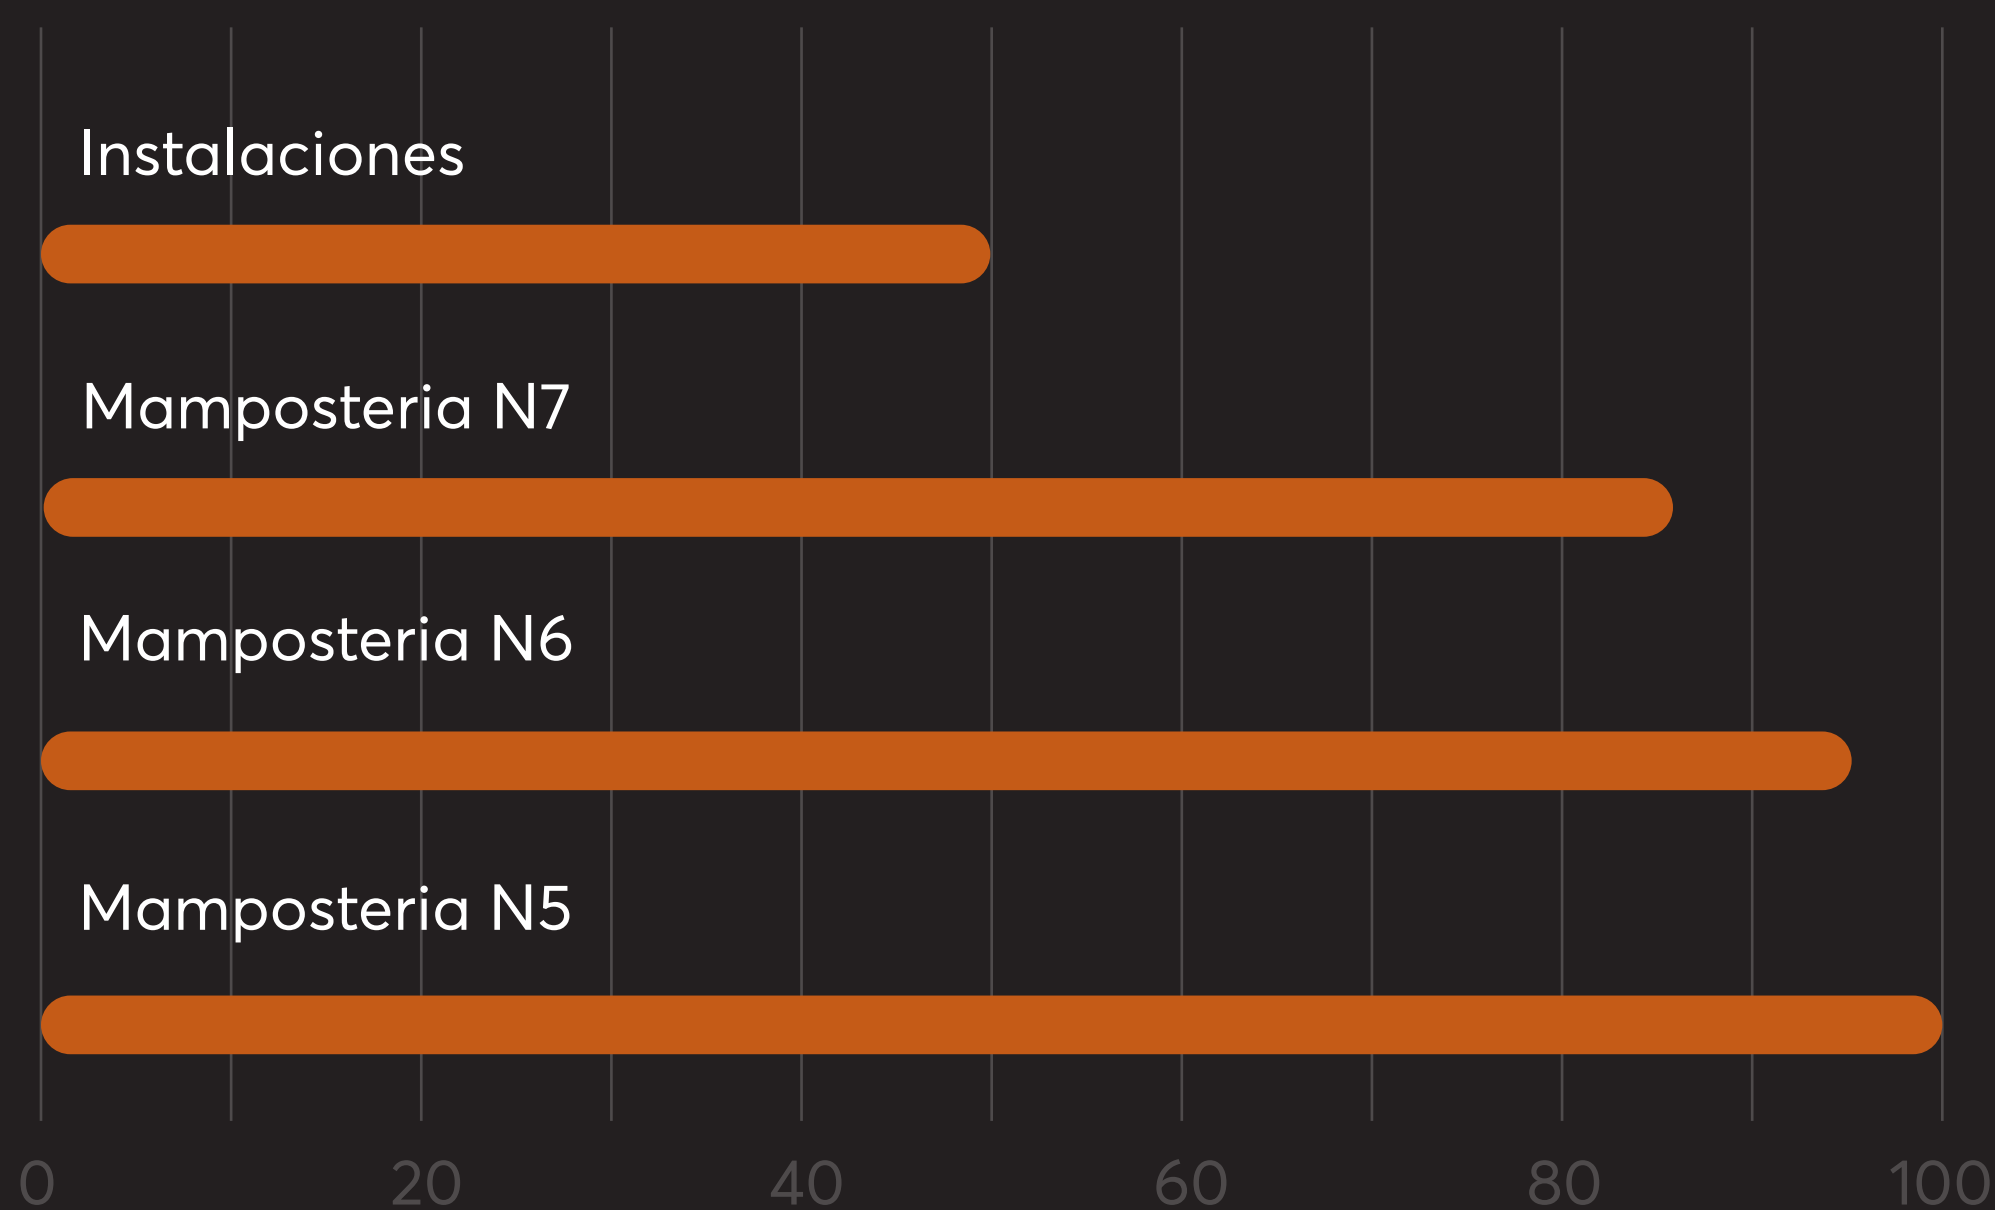

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Septiembre 2023 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

# Avance de Obra

## We<sup>®</sup> Villa Morra.

-  
Septiembre 2023

### Trabajos Realizados

---

#### Instalaciones

Una vez comenzado el trabajo de estructura de losa se empieza a trabajar en electroductos y paso para las instalaciones sanitarias y pluviales a la par. Hasta el momento van hasta el nivel 5.

---

#### Albañilería

Se comenzaron los trabajos en recepción de Muros de perfiles vidrios y cielorraso.

---

### Próximos Trabajos

---


#### Instalaciones

Se procede a empezar los trabajos de presurización de escalera contra incendios y el montaje de ascensor.



# Avance de Obra We<sup>®</sup> Villa Morra.

Septiembre 2023

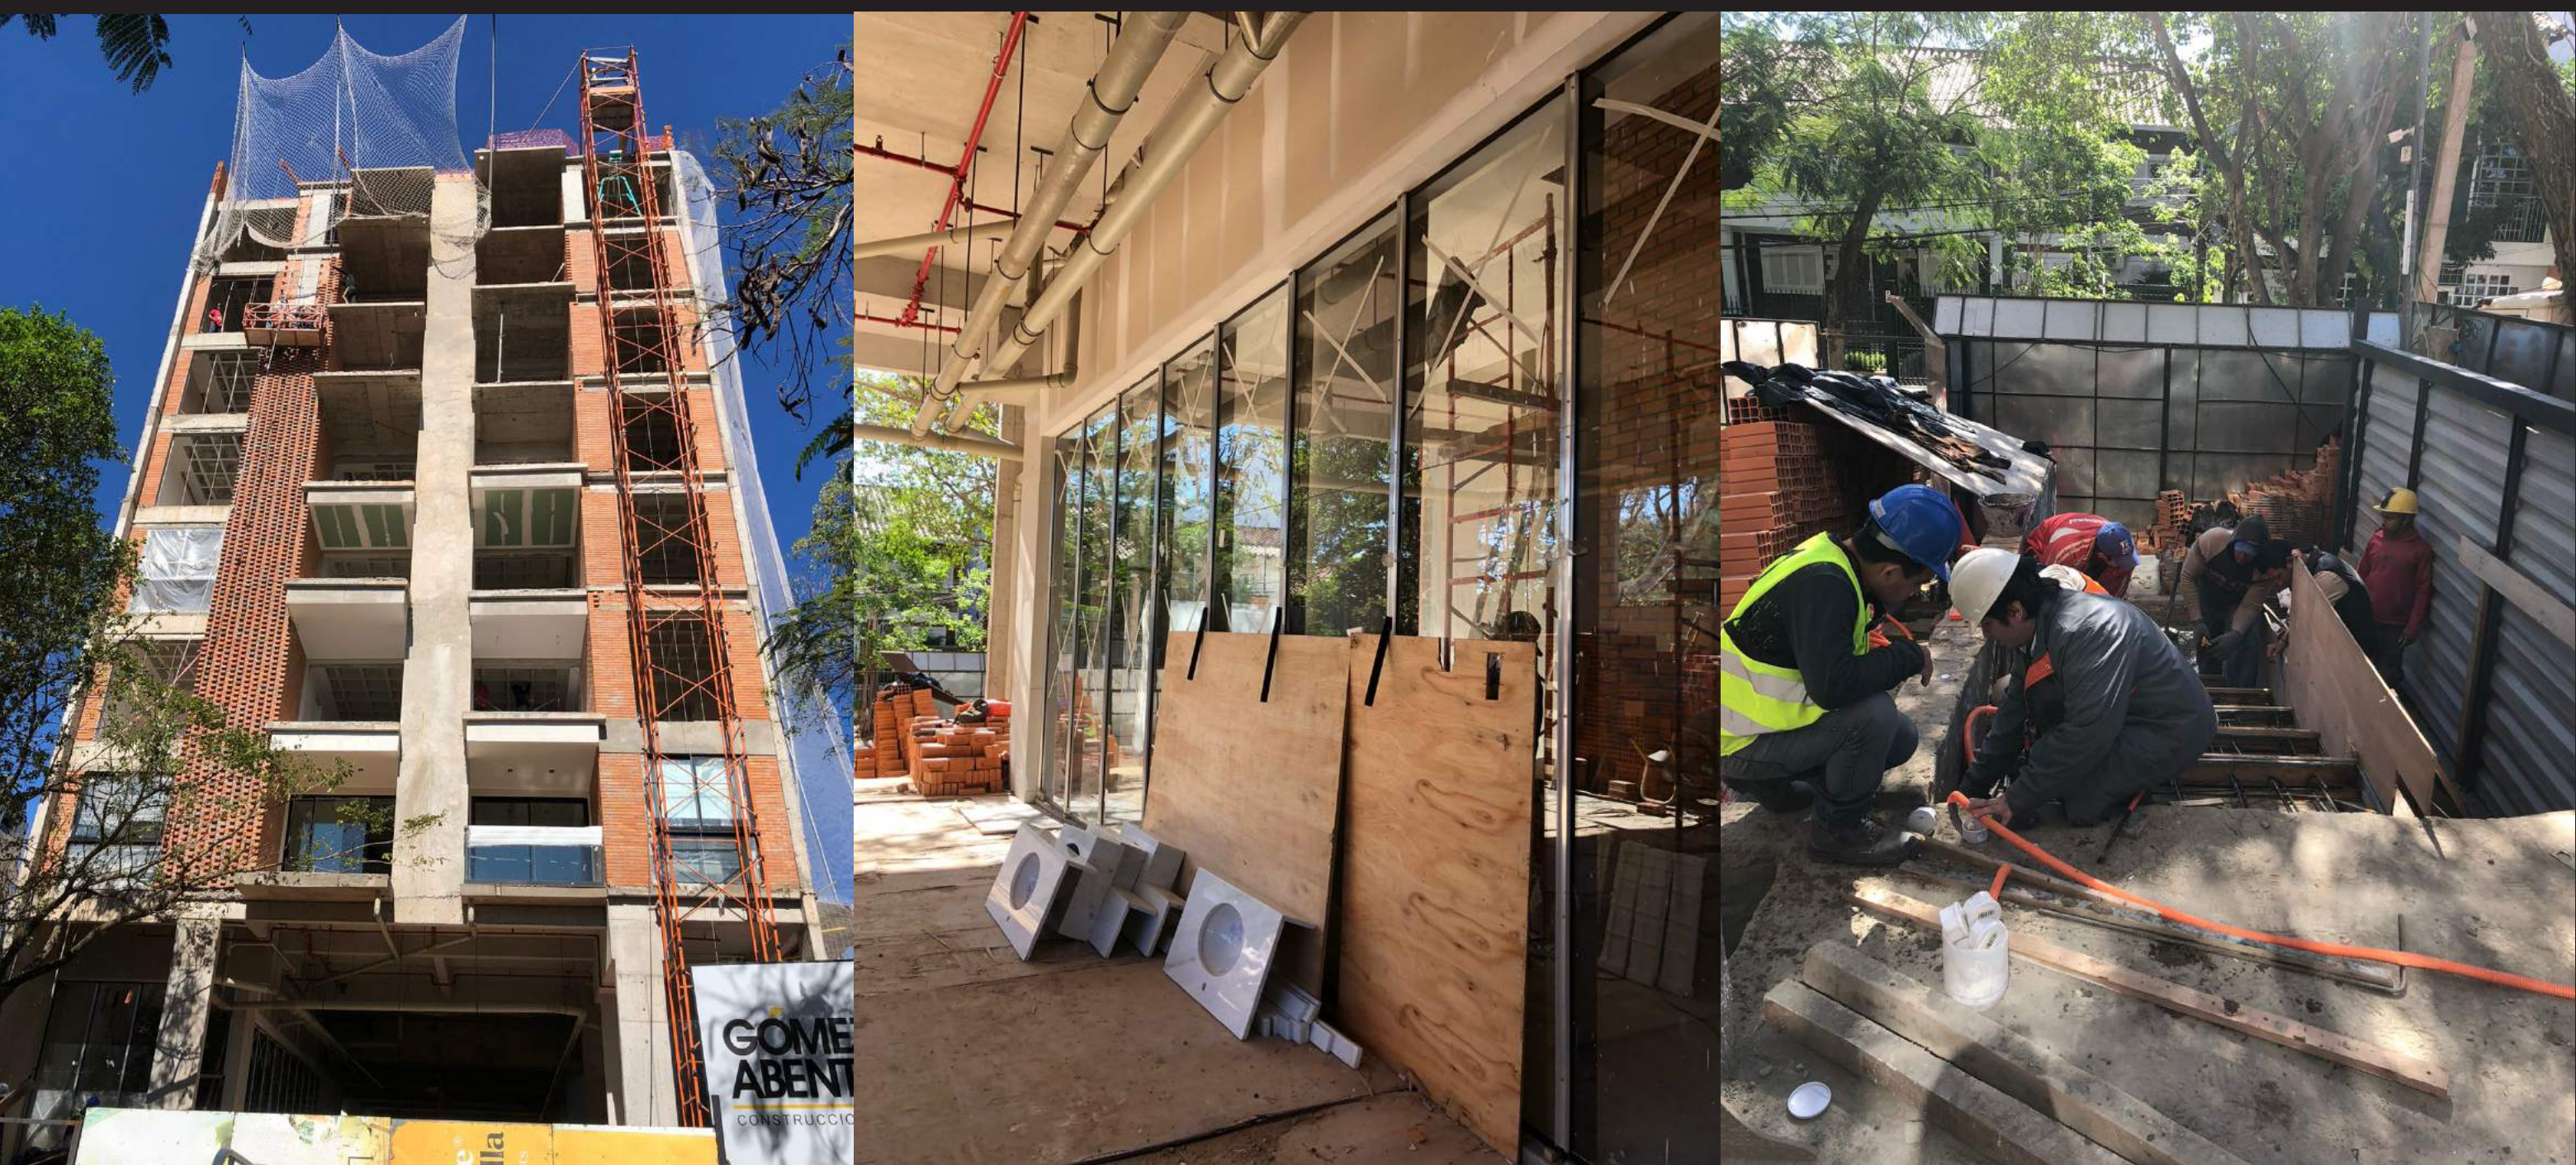

## Finales de Agosto

Trabajos en acceso principal peatonal y palier de recepción.  
Avance de trabajos de fachada principal en un 55%.



# Avance de Obra We<sup>®</sup> Villa Morra.

Septiembre 2023




## Comienzo de Septiembre

Depto modelo montado en el nivel 1.  
Pci cañerías de rociadores terminados hasta  
el nivel 7; Contrapiso y revoques con  
acompañamiento de las instalaciones hasta  
el nivel 6.



# Avance de Obra We<sup>®</sup> Villa Morra.

Septiembre 2023

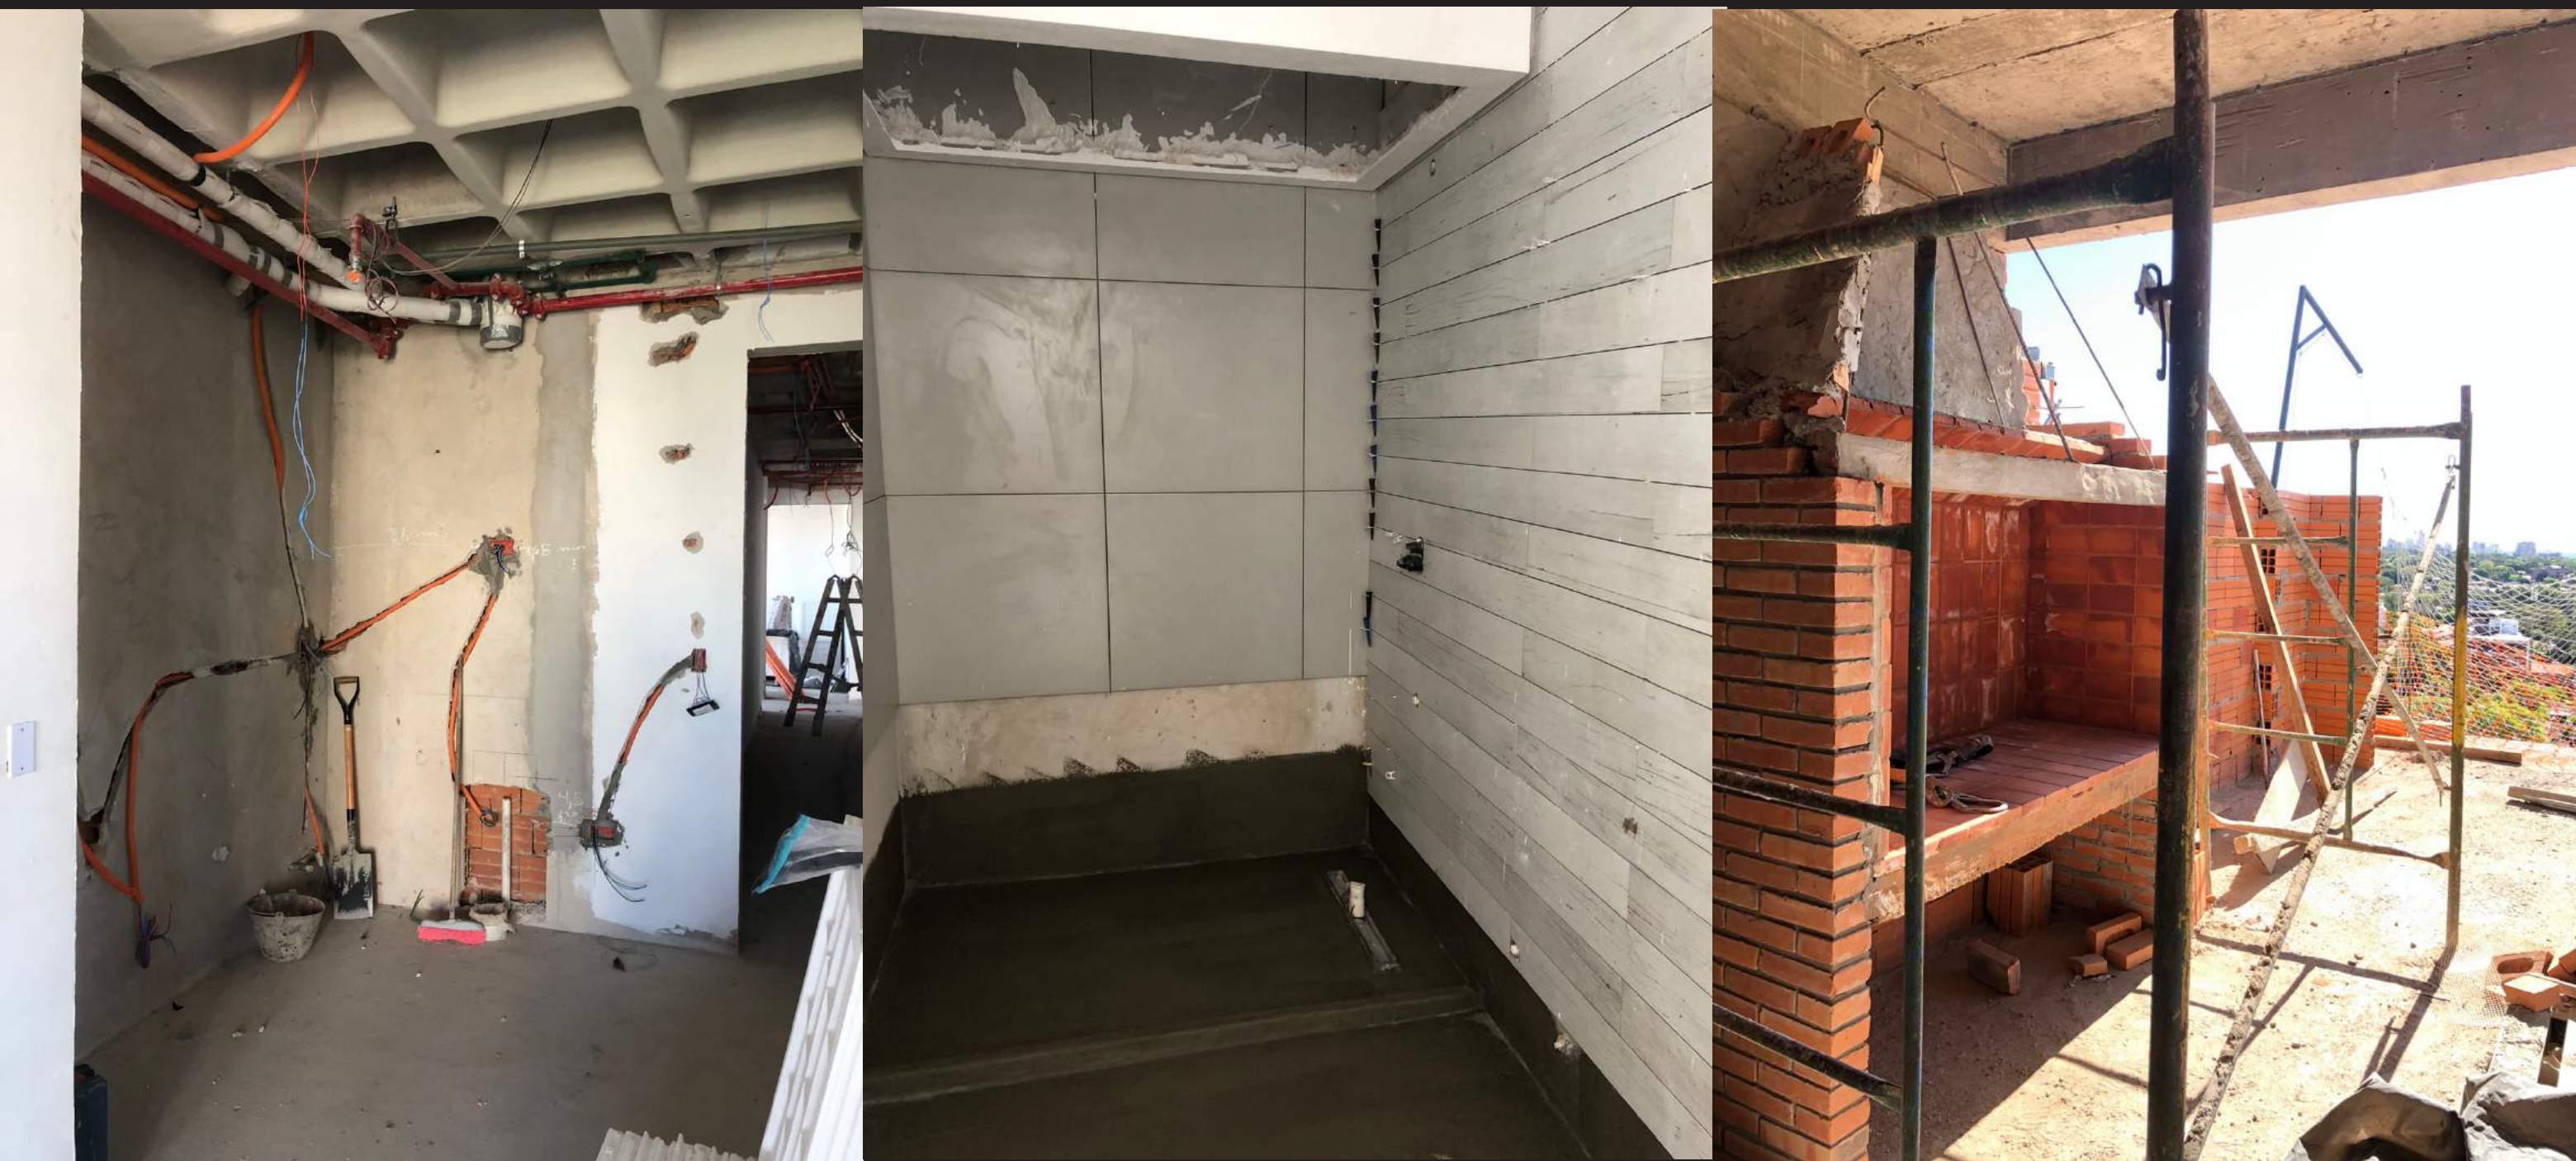

---

**Mediados  
de Septiembre**

Trabajos de terminacion como azulejados de  
baños y accesorios hasta el nivel 3,  
instalaciones hasta el nivel 6,





CDG<sup>®</sup>  
Desarrollos

Contacto —

**(+595) 985 670707**

Aliados

-



ESCRIBANÍA  
TROCHE

