



Informe mensual Avance de Obra

Octubre 2023




CDG[®]
Desarrollos



Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Octubre 2023

Avances de Obra.

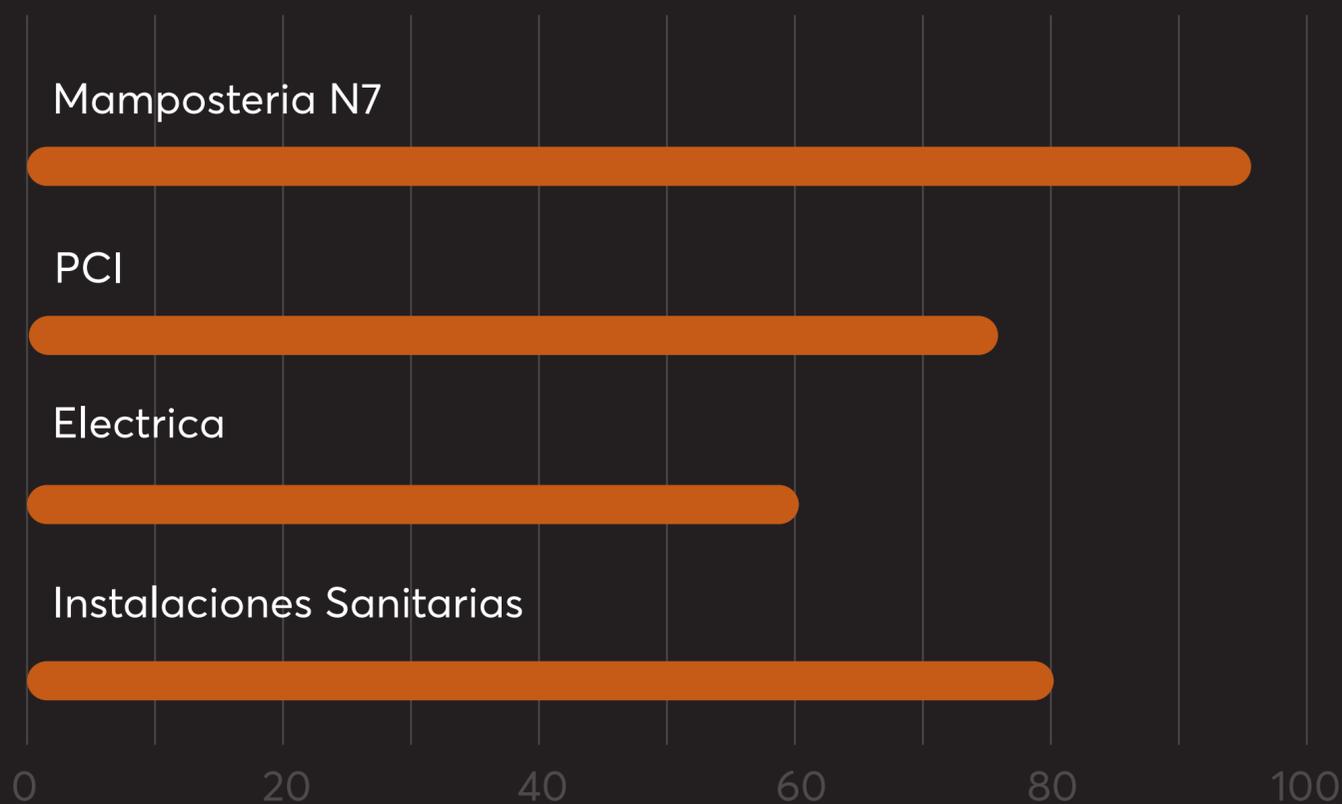

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Octubre 2023 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Octubre 2023

Trabajos Realizados

Instalaciones

Una vez comenzado el trabajo de estructura de losa se empieza a trabajar en electroductos y paso para las instalaciones sanitarias y pluviales a la par. Hasta el momento van hasta el nivel 6.

Albañilería

Se comenzaron los trabajos exteriores como rampas de accesos , escalera de acceso con los planterones.

Próximos Trabajos

Instalaciones

Se procede a empezar los trabajos de presurización de escalera contra incendios y el montaje de ascensor.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Octubre 2023




Finales de Septiembre

Trabajos en acceso principal peatonal y palier de recepción en un 90%.
Avance de trabajos de fachada principal en un 60%.
Fachadas laterales en un 95% terminados de revoques

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Octubre 2023

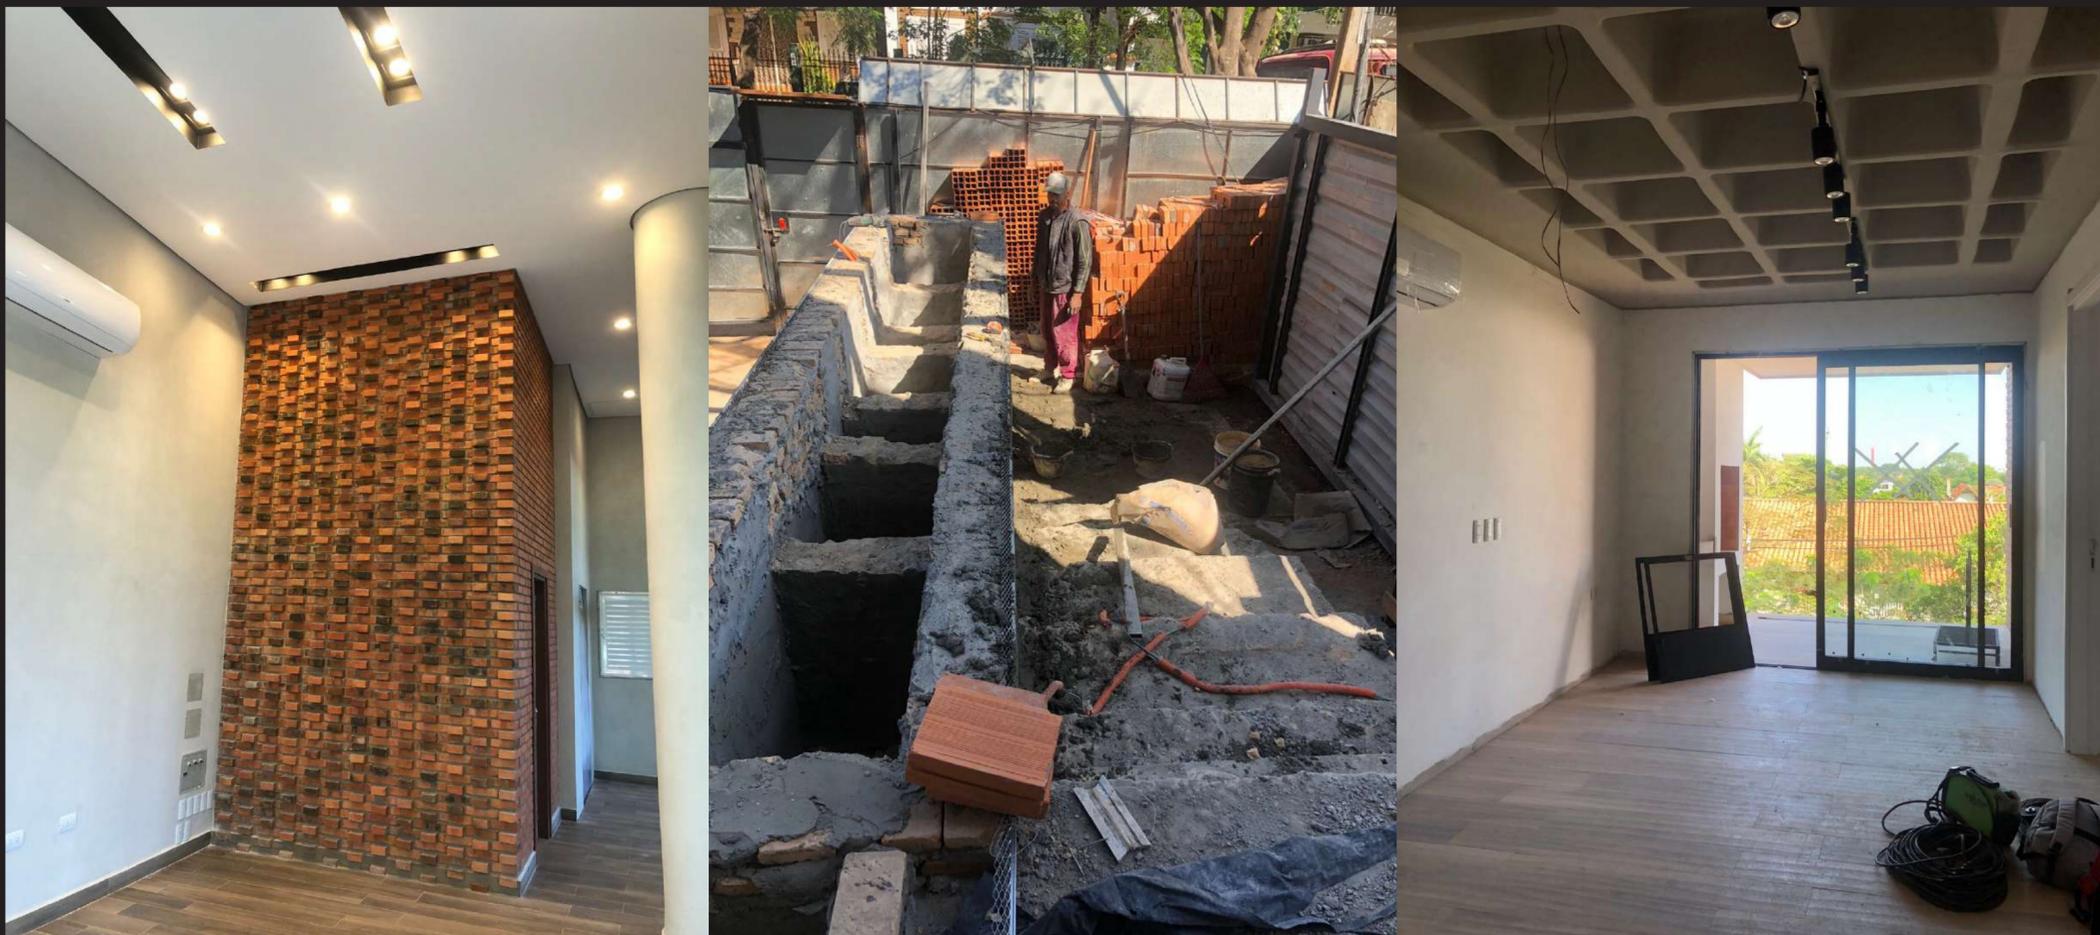

Comienzo de Octubre

Nivel 1 en un 85% este mes se comienza a montar muebles de cocina como placares.
Nivel 2/3 en un 65% (pisos y baños con ceramica y accesorios , colocacion de luces , aberturas avanzado)

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Octubre 2023



Mediados de Octubre

Nivel 4/5 en un 55% (instalaciones y revoque avanzado)

Nivel 6/7 en un 50% (instalaciones avanzado)

Nivel 8 azotea en 45% (mamposteria en altura terminando revoque)



CDG[®]
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

GÓMEZ
ABENTE
CONSTRUCCIONES
