



Informe mensual Avance de Obra

Diciembre 2023



CDG[®]
Desarrollos




Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Diciembre 2023

Avances de Obra.

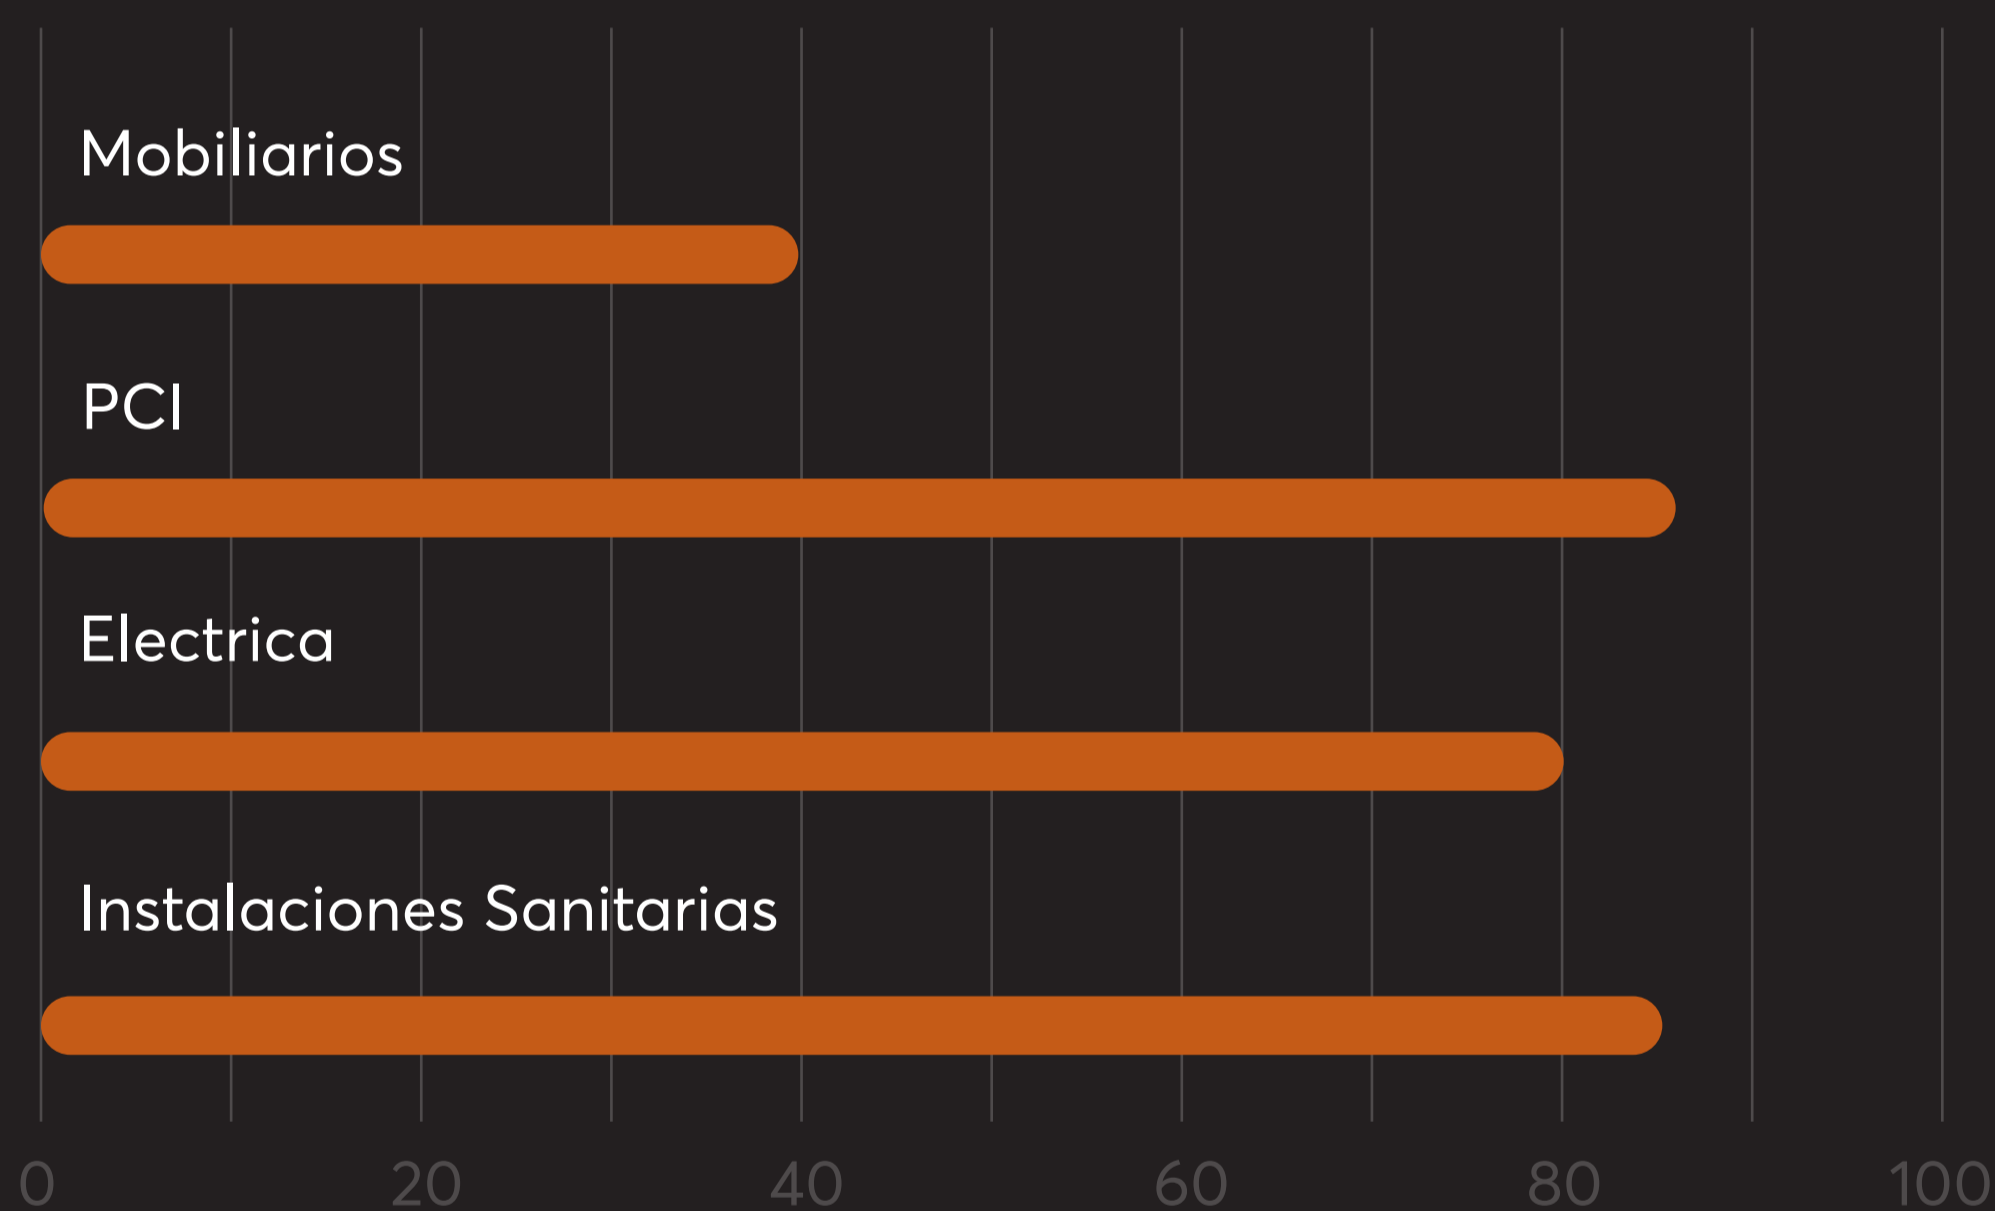

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Diciembre 2023 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Diciembre 2023

Trabajos Realizados

Aberturas

Ventanas se encuentran colocadas terminadas hasta el nivel 5 y en proceso de trabajo en el nivel 5/6 en un 55%
Puertas internas hasta el nivel 3 al 100% , nivel 4 en 75%

Albañileria

Se terminaron los trabajos de azotea ,se comenzaran los trabajos de bauleras con herreria. y proximos trabajos en pd y generador.

Próximos Trabajos

Mobiliario

El nivel 4 en 55% terminado muebles cocina completo con mesadas y griferias y placares , nivel 2 con un 85% y el nivel 3 con un 85%.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Diciembre 2023



Finales de Noviembre

En planta baja se termino el trabajo de herreria de portón 100% terminado.
Avance de trabajos de fachada principal en un 82%.
Fachadas laterales este mes se inicio terminacion de pintura en el lindero izquierdo

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Diciembre 2023



Comienzo de Diciembre

Nivel 1 en un 90% se montaron muebles de cocina y placares (fines de diciembre se termina el último mueble de cocina de monoambiente 3A)

Nivel 2/3 en un 85% aberturas colocadas y con montaje de muebles de cocina y placares

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Diciembre 2023



Mediados de Diciembre

Nivel 4 en un 85% (piso baños mobiliario y aberturas)

Nivel 5 en un 85% (instalaciones y revoque avanzado)

Nivel 6/7 en un 75% (instalaciones avanzado)

Nivel 8 azotea en 58% (terminando instalaciones , trabajos de aislaciones y de ductos)



CDG[®]
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

GÓMEZ
ABENTE
CONSTRUCCIONES
