



Informe mensual Avance de Obra

Marzo 2024



CDG[®]
Desarrollos




Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

Marzo 2024

Avances de Obra.

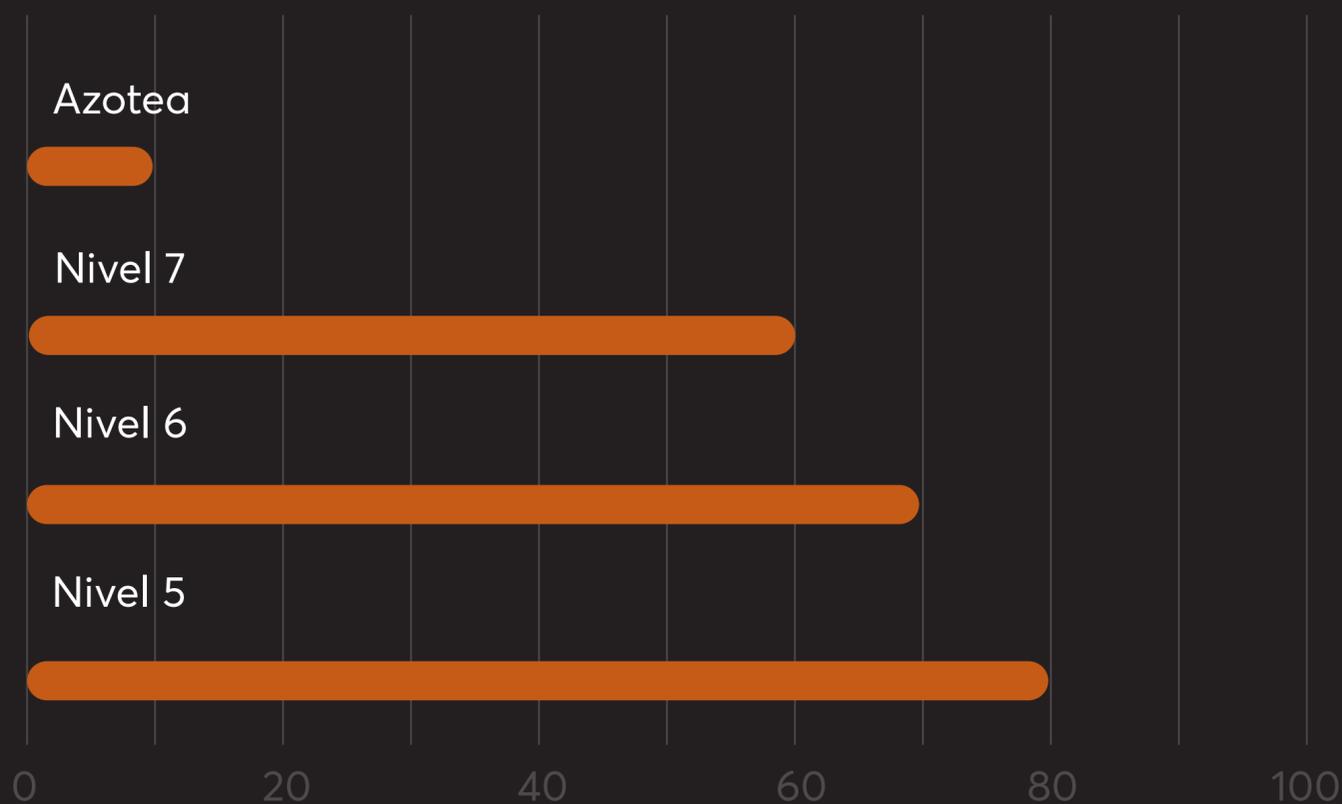

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Marzo 2024 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Marzo 2024

Trabajos Realizados

Aberturas

Ventanas se encuentran colocadas terminadas hasta el nivel 7 y nivel 8 en 10%.

Puertas internas hasta el nivel 6 90% y nivel 7 60%

Albañileria

Trabajos de piscina en proceso de revestido y en proceso de colocacion de pisos en azotea, instalacion de Puesto de distribucion electrica para prueba final de Instalaciones electricas y Agua corriente.

Próximos Trabajos

Mobiliario

El nivel 6 culminados muebles cocina completo con mesadas y griferias y placares , nivel 7 en proceso en un 60%

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Marzo 2024



Finales de Febrero

En SS terminando trabajos de herrerías para bauleras de estacionamientos.

Avance de trabajos de fachada principal en un 92%.

Trabajos en puesto de distribución de Ande para energía eléctrica al edificio en un 85% con sus respectivas herrerías.

Trabajos de vereda terminados.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Marzo 2024




Comienzo de Marzo

Nivel 1 en un 100% en espera de PD para pruebas finales .
Nivel 2/3 en un 100% en espera de PD para pruebas finales.

Avance de Obra We® Villa Morra.

Marzo 2024

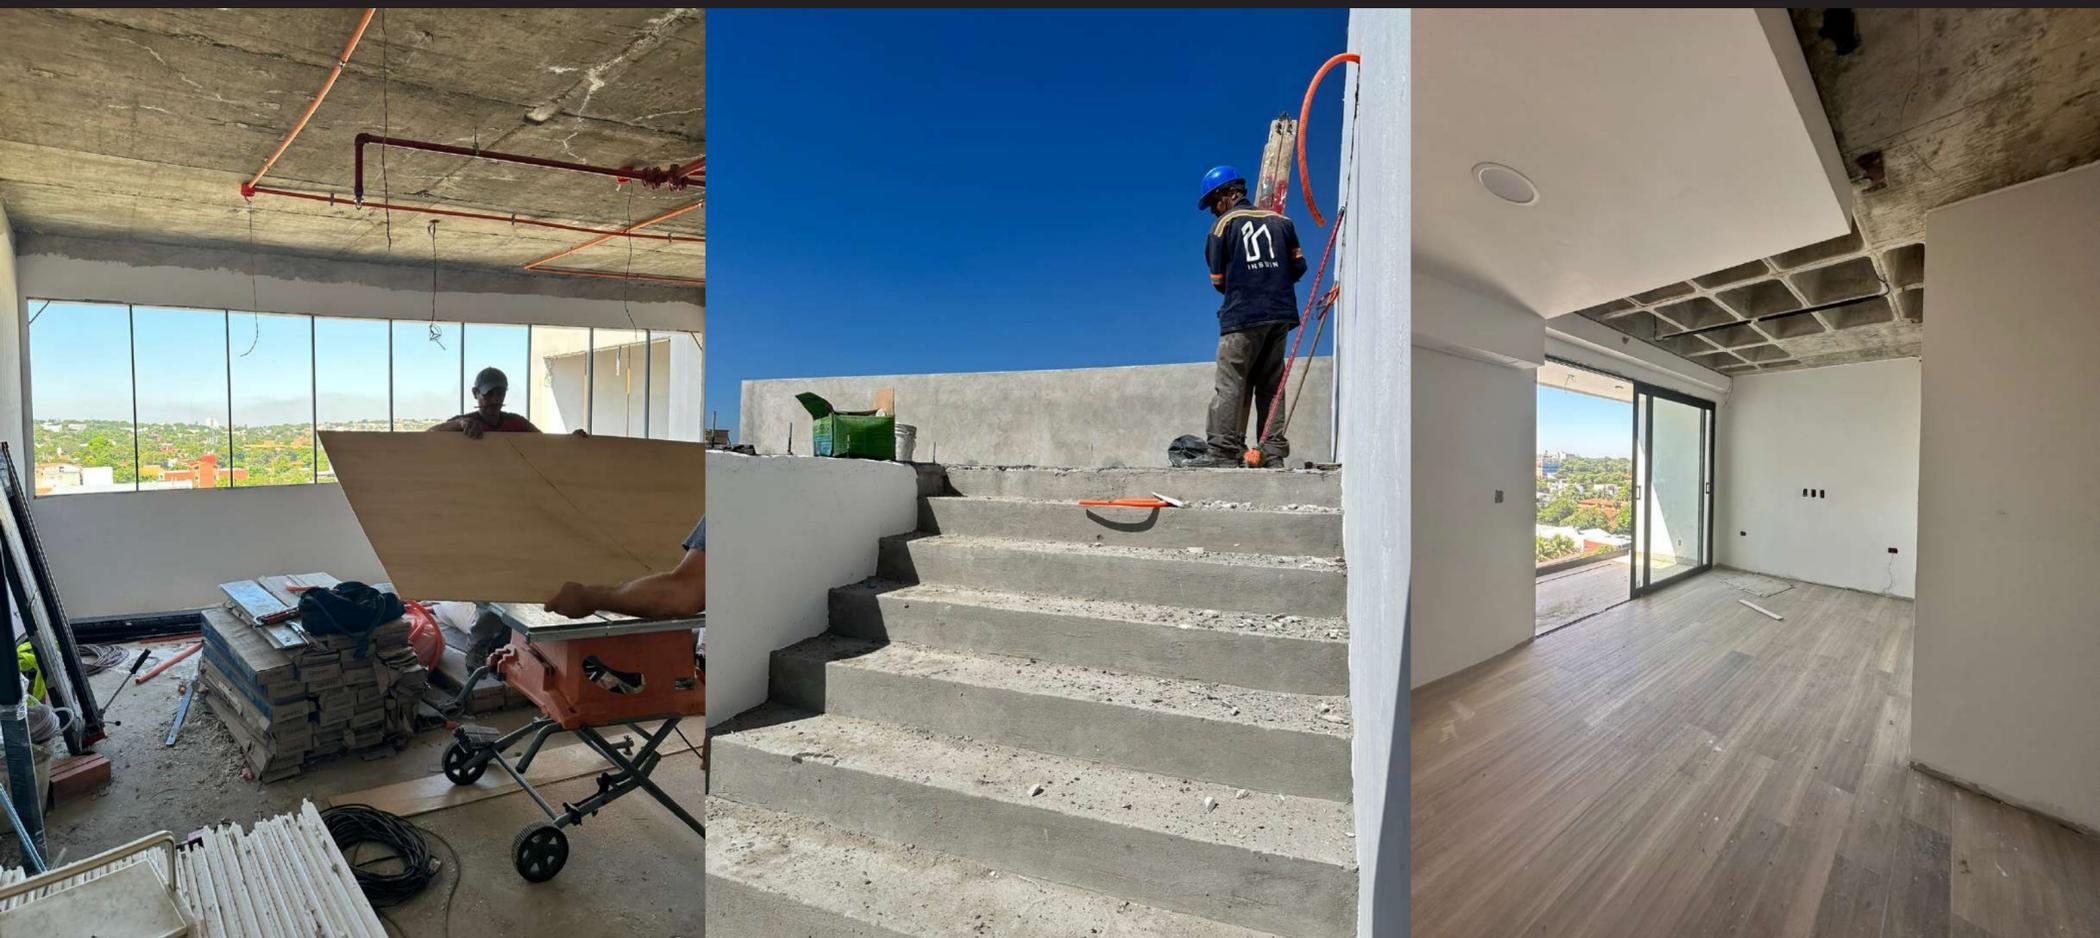

Mediados de Marzo

Nivel 4 en un 100% de terminaciones finales
Nivel 5 en un 80% de terminaciones finales
Nivel 6 en un 70% de terminaciones finales
Nivel 7 en un 60% de terminaciones finales
Nivel 8 azotea en un 10% de terminaciones finales



CDG®
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

