



# Informe mensual Avance de Obra

Marzo 2023



CDG<sup>®</sup>  
Desarrollos




# Avance de Obra

## We<sup>®</sup> Villa Morra.

Marzo 2023

### Avances de Obra.

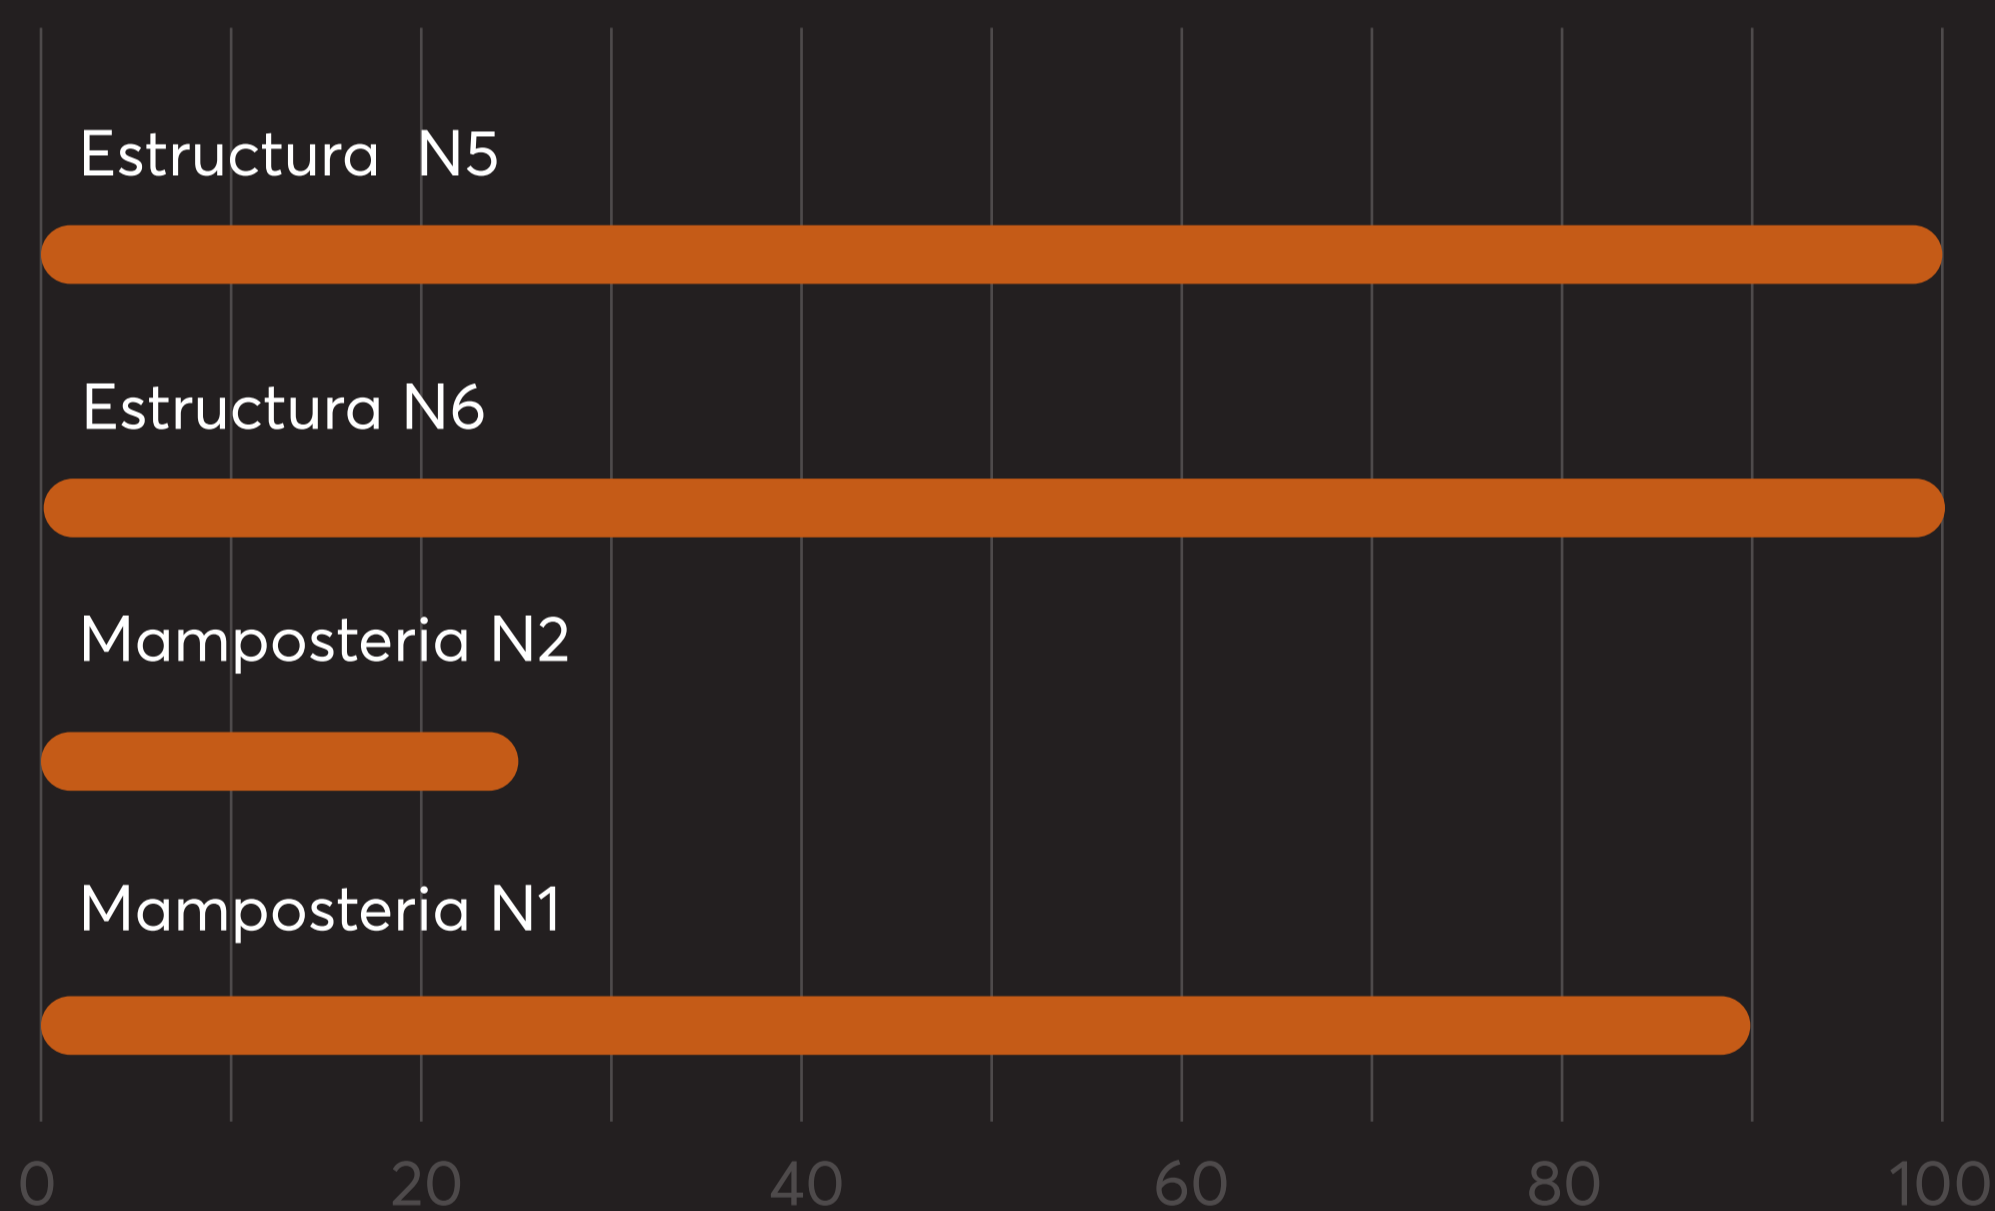

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Marzo 2023 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

# Avance de Obra

## We<sup>®</sup> Villa Morra.

-  
Marzo 2023

### Trabajos Realizados

---

#### Instalaciones

Una vez comenzado el trabajo de estructura de losa se empieza a trabajar en electroductos y paso para las instalaciones sanitarias y pluviales a la par.

---

#### Albañilería

Se comenzaron los trabajos de mampostería en muros en nivel 2.

---

### Próximos Trabajos

---

#### Estructura H° A°

Se procede a empezar el encofrado para los pilares de la losa n7.

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Villa Morra.

Marzo 2023



---

**Finales  
de Febrero**

Armado , encofrado y cargado de la Losa del nivel 6.

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Villa Morra.

-  
Marzo 2023



---

## Comienzo de Marzo

Instalaciones de bajada de sanitarias y pluviales , trabajos de agua corriente en baños de n1 , ducteado de electrica completo en n1.

# Avance de Obra We<sup>®</sup> Villa Morra.

Marzo 2023



## Mediados de Marzo

Se inician los trabajos de mampostería del n2 y se empieza trabajos de encofrados de pilares para la siguiente losa.



CDG<sup>®</sup>  
Desarrollos

Contacto —

**(+595) 985 670707**

Aliados

-



ESCRIBANÍA  
TROCHE

**GÓMEZ  
ABENTE**  
CONSTRUCCIONES
