



Informe mensual Avance de Obra

Mayo 2023



CDG[®]
Desarrollos




Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

Mayo 2023

Avances de Obra.

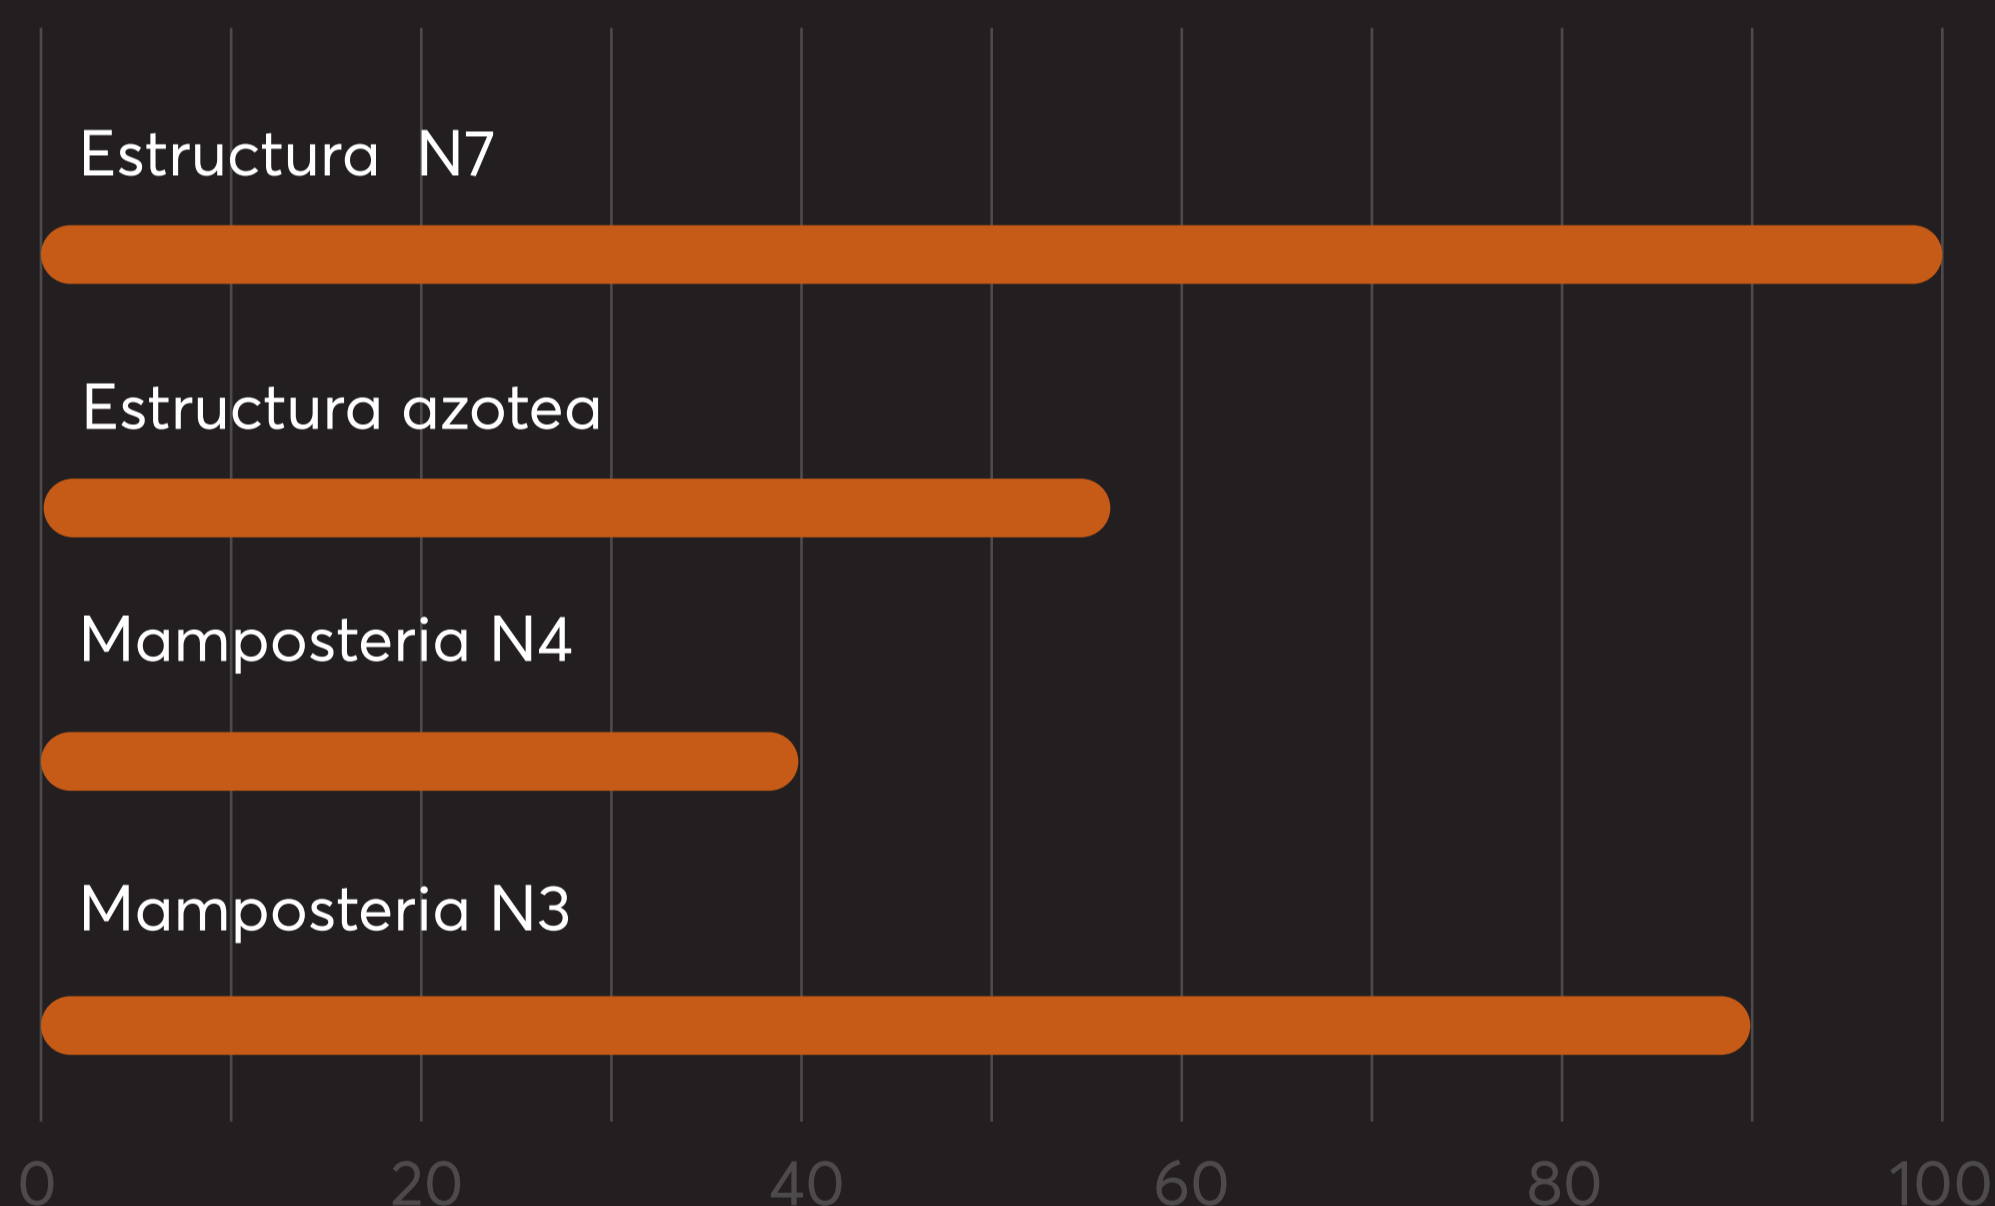

Tras el correspondiente relevamiento de avance de obra realizado en el mes de Mayo 2023 de la edificación en construcción sobre la calle Legión Civil Extranjera casi Pacheco de la ciudad de Asunción, a continuación se detallan las observaciones pertinentes.

Avance de Obra

We[®] Villa Morra.

-
Mayo 2023

Trabajos Realizados

Instalaciones

Una vez comenzado el trabajo de estructura de losa se empieza a trabajar en electroductos y paso para las instalaciones sanitarias y pluviales a la par.

Albañilería

Se comenzaron los trabajos de mampostería en muros en nivel 4 y 5.

Próximos Trabajos

Estructura H° A°

Se procede a empezar el encofrado de fondo de vigas y losa del nivel de techo de azotea.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Mayo 2023



Finales de Abril

Se están terminando las instalaciones sanitarias del nivel 1, y terminación de enduido cementicio en cocheras planta baja. Nivel de azotea terminado en proceso de techo de azotea.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

-
Mayo 2023




Comienzo de Mayo

N1 avance en instalaciones electricas,
instalaciones sanitarias y en revestidos tanto
de cocina como de baños.

Avance de Obra We[®] Villa Morra.

Mayo 2023

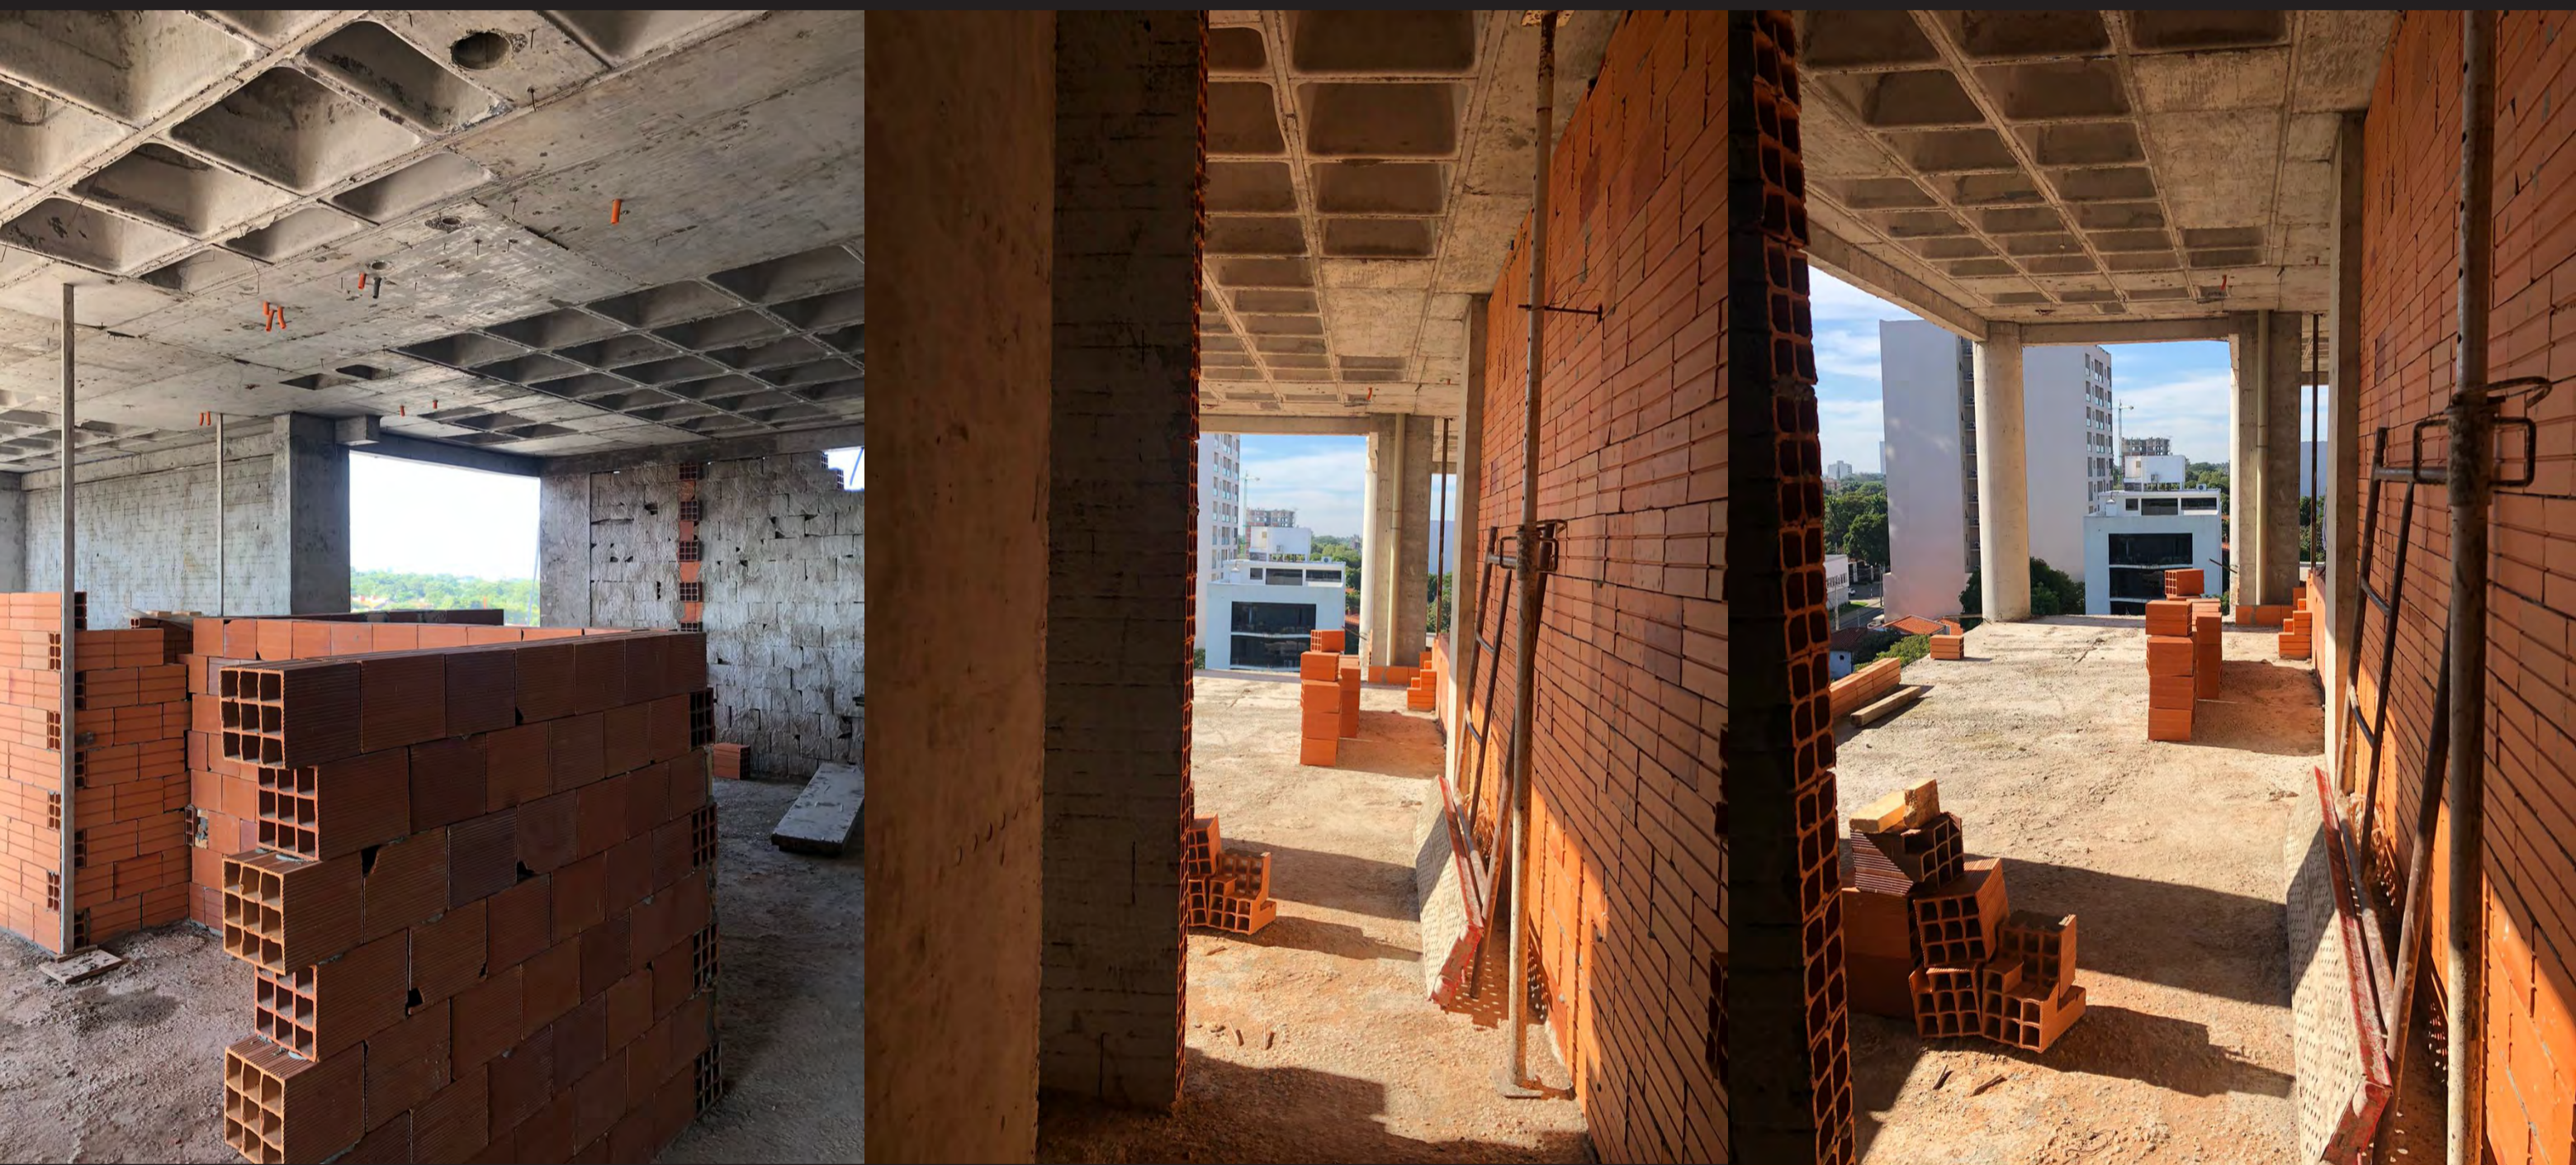

Mediados de Mayo

Nivel 2 y nivel 3 se encuentra en revoque , nivel 2 con mas avances de instalaciones sanitarias, nivel 4 y nivel 5 avance en altura de mamposteria en un 35%.



CDG®
Desarrollos

Contacto —

(+595) 985 670707

Aliados

-



ESCRIBANÍA
TROCHE

